صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
Municipal Development & Lending Fund

وثيقة الخطة التنموية المحلية

بلدة برطعه الشرقية

2026 - 2023

ABC CONSULTING
شركاء في بناء القدرات



أعدت هذه الخطة بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بواسطة شركة شركاء في بناء القدرات ABC Consulting، عام 2023



الخطة التنموية المحلية

بلدة برطعه الشرقية

2026-2023

المحتويات

كلمة رئيس بلدية برطعه الشرقية 5
رسالة فريق التخطيط الأساسي 6
شكر وعرفان 7
قرار المجلس البلدي 8
العقد المجتمعي 9
1. الملخص التنفيذي 12
2. مقدمة 17
أ. أهداف الخطة: 19
ب. منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية: 20
3. نبذة عن بلدة برطعه الشرقية 24
منطقة الدراسة 24
الخصائص الجغرافية 24
الخصائص الديمغرافية: 27
4. التحليل التشخيصي للمجالات التنموية الرئيسة 33
أولا: مجال البيئة والبنى التحتية 33
ثانيا: مجال تنمية الاقتصاد المحلي 39
ثالثا: مجال التنمية الاجتماعية 45
رابعا: مجال الإدارة والحكم الرشيد 51
5. الإطار التنموي المحلي 56
الرؤية التنموية 56
مصفوفة الأهداف والبرامج / المشاريع 56
البرامج ومكوناتها/المشاريع التنموية 59
6. البعد (التوصيف) المكاني للمشاريع 68
7. خطط التنفيذ، والمتابعة والتقييم 70
أ. خطة التنفيذ الرباعية 70
ب. مصفوفة خطة التنفيذ السنوية/ السنة الأولى 80
ت. مصفوفة خطة المتابعة والتقييم 82
8. الملاحق 87
أ. أوصاف مشاريع السنة الأولى 87
مرفق (1) تعريف عام عن البلدية 107
مرفق (2): التقييم المؤسسي والمجالات والتدخلات الفنية المقترحة 108
مرفق (3) :دليل التجمع السكاني لبلدة برطعه الشرقية 113
مرفق (4): تحليل جذور القضايا وأثرها على التنمية الشمولية للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والبيئة 125
اللجان التي شاركت بإعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها 143

كلمة رئيس بلدية برطعه الشرقية

بسم الله الرحمن الرحيم

برطعه الشرقية، هذه البلدة المزدهرة... الممزوجة بالعراقة والحداثة... البلدة المحاصرة بالجدار والصامدة في وجه كل التحديات والمعيقات... إن بلدة برطعه الشرقية لها خصوصيتها مما يجعلها متميزة في محتوياتها، وهذا يدفعنا أن نكون أمامها بناة حقيقيون على جميع المستويات وأن نستفيد مما أوتينا من علم وقوة للحفاظ عليها وتطويرها وجعلها بلدة عصرية مع المحافظة على عراقتها وأصالتها ليشار إليها بالبنان.

إن مهمة التخطيط هي من أصعب المهام، لأن فكر التخطيط الاستراتيجي له مدارسه المختلفة والمتعددة والتي في النهاية تؤدي إلى نتائج قريبة وتحاكي نفسها في الكثير من الإجراءات ولذلك عملنا في البلدية على تحديد أفضل وأرقى أساليب التخطيط والذي يضمن أن تكون المبادرة مسؤولية مشتركة مع مختلف الأطراف من مواطني البلدة ومؤسساتها ومختلف الجهات ذات العلاقة.

وفي النهاية خرجنا بخطة تنموية محلية معبره عن احتياجات المواطنين مبدوءة برؤية وأهداف ومترجمة إلى مشاريع لتنفيذها في السنوات القادمة حتى نتمكن من خدمة مواطنينا وتوفير العيش الكريم لهم وتعزيز صمودهم في أرضهم ليتمكنوا من الوقوف سداً منيعاً في وجه كل التحديات.

رئيس بلدية برطعه الشرقية

الاسم: غسان قبها

رسالة فريق التخطيط الأساسي

إن عملية التخطيط التنموي من العوامل الأساسية لإنجاح أي مؤسسة وخصوصا الهيئات المحلية، وفي هذا السياق تم اطلاق عملية التخطيط التنموي في بلدة برطعه الشرقية بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبإشراف فني من الاستشاري مكتب ABC وبمشاركة مجتمعية واسعة النطاق، بالمشاركة يمكننا الوصول إلى احتياجات المجتمع المحلي وتحقيق أهدافه وتطلعاته المستقبلية، وكانت الخطوة الأولى في عملية التخطيط التنموي هي الدعوة لعقد اللقاء المجتمعي الأول الذي تم فيه دعوة جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي في البلدة وتم خلاله توضيح وعرض منهجية وخطوات إعداد الخطة وخلاله تم تشكيل لجان العمل التخصصية التي شاركت في إعداد الخطة وكان على رأسها فريق التخطيط الأساسي ليكون هذا الفريق مسؤولاً على قيادة عملية التخطيط وإخراج الخطة وتوثيقها.

وقد عملنا كفريق واحد على مدار فترة إعداد الخطة لمدة أربعة شهور كاملة وأشرفنا على تنظيم ورشات العمل واجتماعات اللجان المجتمعية وقمنا بكل ما يلزم من التنسيق والتيسير المتواصل بمساعدة طاقم المكتب الاستشاري لإنجاح هذه الورشات والاجتماعات وترتيبها وتوثيق مخرجاتها واعتمادها حسب المنهجية المتبعة في إعداد الخطة، وفي نهاية المطاف تم الخروج بهذه الخطة والتي نتمنى أن تكون قد عكست احتياجات وآمال وتطلعات مجتمعنا المحلي في بلدة برطعه.

وفي النهاية نتوجه بالشكر والتقدير لجميع من ساعدنا وساندنا خلال فترة إعداد الخطة واللّٰه الموفق لما فيه الخير، ونتمنى من الجميع تقديم الدعم لتنفيذ وإنجاح هذه الخطة لما فيه المنفعة والخير واستمراراً لمسيرة التطوير والتنمية في بلدة برطعه الشرقية، ولنكن شركاء في التنفيذ كما كنا شركاء في التخطيط.

فريق التخطيط الأساسي

شكر وعرفان

تتقدم بلدية برطعه الشرقية بعظيم الشكر والتقدير والامتنان لجميع الجهات التي شاركت وساهمت بإعداد الخطة التنموية المحلية للأعوام من (2023-2026) من مشروع صندوق تطور وإقراض الهيئات المحلية لمساهمتهم بتوفير الدعم لنجاح إعداد هذه الخطة التنموية، وكذلك الشكر للشركة الاستشارية "شركاء في بناء القدرات ABC" وللمجتمع المحلي ولجميع اللجان المشاركة بعملية التخطيط ابتداء من لجنة التخطيط التنموي والممثلة بأعضاء المجلس البلدي والذي اشرف على عملية التخطيط بالإضافة إلى فريق التخطيط الأساسي والذي أدار العملية بكافة جوانبها كذلك لجنة ممثلي أصحاب العلاقة و اللجان المجتمعية المتخصصة وجميع الأفراد والمؤسسات والهيئات التي ساهمت بكل شكل من الأشكال في إنجاز هذا العمل وإخراجه إلى حيز الوجود.

قرار المجلس البلدي

قرار

قرر المجلس البلدي لبلدة برطعة الشرقية بالجلسة رقم 96/2023 والمنعقدة بتاريخ 6.4.2023 تبني الخطة التنموية المحلية للأعوام الأربعة القادمة وهي 2023 – 2026 وبناء على ذلك تم التوقيع.

#	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عادل قبج	رئيس البلدية	
2	عبد الله قبج	نائب الرئيس	
3	جواد قبج	عضو	
4	سامي قبج	عضو	
5	احمد قبج	عضو	
6	جودت قبج	عضو	جودت قبج
7	مها قبج	عضو	
8	عايد قبج	عضو	عايد
9	نور الدين قبج	عضو	نور الدين قبج
10	مراد قبج	عضو	
11	محمد ابراهيم قبج	عضو	محمد قبج

دولة فلسطين
بلدية برطعه
وزارة الحكم المحلي

العقد المجتمعي

العقد المجتمعي

نحن الموقعون ادناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وافراد في بلدة برطعة نتبنى هذه الخطة التنموية المحلية لبلدتنا بكافة أهدافها ومخرجاتها والتي شاركنا في جميع مراحل اعدادها، وانا مستعدون للاستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المقومات اللازمة لتنفيذ أي من مخرجاتها وبناء على ذلك نوقع.

الرقم	الاسم	التوقيع
1	غسان نايف قبها	
2	مروان محمود قبها	
3	جواد قبها	
4	محمد مصطفى قبها	
5	محمد عمارنة	
6	زينب جابر سعيد طه	
7	عبد المجيد هاشم	
8	عادة ابراهيم قبها	
9	ادريس عبد الله قبها	
10	وائل نبيل قبها	
11	عبد السلام قبها	
12	عبد الرحمن منيب قبها	
13	عمر جمال قبها	
14	امجد محمد قبها	
15	زيد محمود قبها	
16	خالد قبها	
17	أمل عبد اللطيف ابو قبها	
18	محمد جهاد قبها	
19	اسماعيل محمد مصطفى	
20	زياد داوود قبها	
21	وليد قبها	

عبد الكريم الدب

ابراهيم عطية

الزرعاب

مجد الدين حسين



الملخص التنفيذي

01

1. الملخص التنفيذي

تكللت جهود عملية التخطيط التنموي المحلي بقيادة بلدية برطعه الشرقية وبمشاركة اللجان التنموية بإعداد الخطة التنموية المحلية لبلدة برطعه الشرقية للأعوام 2023- 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وبدعم فني من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

وتهدف الخطة التنموية المحلية لبلدة برطعه الشرقية ومن خلال الإجابة على (أين نحن الآن: التنظيم والتحليل، والى أين نريد أن نتجه: الإطار التنموي، وكيف نصل؟: التنفيذ والمتابعة والتقييم)، إلى النهوض بواقع المجالات التنموية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مكانة البلدية القيادية والتنموية، من أجل تحسين مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمواطنين.

ولتحقيق هذا الهدف العام، ركزت عملية التخطيط التنموي المحلي، على تشخيص وتحليل أربعة مجالات تنموية رئيسة وهي، مجال البيئة والبنى التحتية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والتنمية الاجتماعية والتمكين، والإدارة والحكم الرشيد)، بالاستناد إلى دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية الصادر عن وزارة الحكم المحلي في العام 2017[1]. بالإضافة إلى الدروس والعبر المستخلصة من خبرات وتجارب البلدية في عملية التخطيط وإعداد الخطط التنموية المحلية السابقة.

وقد حرصت الخطة التنموية المحلية لبلدة برطعه الشرقية للأعوام 2023-2026 في رؤيتها وأهدافها وأولوياتها التنموية في ملامسة تطلعات واحتياجات المجتمع المحلي، آخذة بعين الاعتبار الموارد المتاحة، والإمكانيات والقدرات المتوفرة، والتحديات المتوقعة/المحتملة، كما أنها ارتكزت الخطة التنموية على مجموعة من المبادئ وهي: المشاركة، والشفافية والمساءلة، التكاملية، وشمولية التشخيص والبعد الاستراتيجي، والكفاءة والفعالية[2].

ولضمان النهج التشاركي، فقد تم إشراك مختلف مكونات المجتمع المحلي بشكل عام، والفئات المهمشة وخاصة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص في مختلف مراحل عملية التخطيط، وذلك عبر تمثيلهم في اللجان التنموية من جهة، ودمج احتياجاتهم وأولوياتهم في الخطة التنموية المحلية من جهة أخرى، وذلك من خلال ترجمتها إلى برامج ومشاريع في المجالات التنموية المختلفة.

[1] . تم إعداد دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلديات الفلسطينية في العام 2009، ومن ثم جرى مراجعته وتحديثه في العام 2013، وفي العام 2022 تم مراجعته وتحديثه مرة أخرى بناء على تجارب التخطيط السابقة.

[2] . وزارة الحكم المحلي، ورقة سياسات التخطيط التنموي الاستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية، 2013.

كما أولت الخطة التنموية المحلية لبلدة برطعه الشرقية، مجال التنمية الاقتصادية المحلية اهتماما خاصا، لما يشكله من محور أساسي في تطوير المجتمع، في ظل تراجع فرص العمل والتوظيف، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع مستوى دخل الفرد، وتظهير النجاحات المحققة أو فرص الاستثمار في المجتمع المحلي، وتعزيز بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآخذة بالنمو والمزيد من الاهتمام بها.

وقد توجت عملية التخطيط التنموي المحلي بتحديد القضايا التنموية ذات الأولوية عبر عملية تشاركية[3]، تبعها إعداد الإطار التنموي للبلدة.

وقد تمثلت أهم القضايا التنموية ذات الأولوية بما يلي:

أولا: مجال البيئة والبنية التحتية

- ضعف القدرة الكهربائية وعدم مواكبة التوسع اللازم في أطوال الشبكة.
- ضعف البنية التحتية للطرق وحاجتها إلى التوسعة والتأهيل لتصريف مياه الأمطار.
- ضعف الاهتمام بالبيئة والقدرة على التخلص من مخلفات السوق التجاري والنفايات.
- عدم شمولية شبكة الصرف الصحي لكافة أحياء البلدة وتلوث المياه الجوفية نتيجة التسرب من الحفر الامتصاصية إلى المياه الجوفية.
- ضعف البنية التحتية لشبكة المياه وعدم كفاية مصادر المياه.
- عدم نجاعة نظام إدارة خدمة جمع النفايات الصلبة وزيادة تكلفتها وضعف في جمع وترحيل النفايات.

ثانيا: مجال تنمية الاقتصاد المحلي

- محدودية توفر الأيدي العاملة الحرفية والمهنية.
- ضعف الاهتمام بالزراعة وتدني مستوى الخبرات الزراعية.
- قلة الاهتمام بالأماكن السياحة الداخلية والبيئية والطبيعية في البلدة.
- ضعف التنظيم للسوق التجاري وعشوائية المحال التجارية والصناعية.

ثالثا: مجال التنمية الاجتماعية

- ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

[3] . للاطلاع على منهجية التخطيط، أنظر دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية، والذي يوضح منهجية التخطيط ومراحلها، والأطراف المشاركة فيها، والمخرجات المتعلقة بكل مرحلة، وكما أن الدليل مزود بمجموعة من الأدوات الخاصة بكل خطوة من خطوات عملية التخطيط.

- ضعف البنية التحتية للتعليم وقلة المرافق المدرسية في مدارس البلدة.
- ضعف التجهيزات والإمكانيات والبنية التحتية للمراكز الصحية ومحدودية خدماتها.
- محدودية مشاركة النساء وضعف المرافق والأنشطة المجتمعية وبناء القدرات التي تستهدف النساء.
- ضعف النشاطات الاجتماعية والمؤسسات الداعمة للحفاظ على الثقافة والتراث.
- ضعف المستوى الرياضي والأنشطة الشبابية في البلدة.
- ضعف الاهتمام بقطاع الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي.

رابعا: الإدارة والحكم الرشيد

- محدودية المخطط الهيكلي وعشوائية تنظيم البناء في البلدة.
- محدودية المعدات والتجهيزات والكوادر للكوارث والطوارئ.
- ضعف القدرة على توفير كامل الخدمات للمواطنين بسبب قلة الإمكانيات وعدم توفر مقر مناسب للبلدية.

وقد تبع ذلك، مراجعة وتحديث الرؤية التنموية، وتطوير الأهداف التنموية وفقا للقضايا ذات الأولوية، حيث صادق المجلس البلدي في اجتماعه المنعقد في تاريخ 28-1-2023 على الرؤية التنموية بلدة والمتمثلة بـ **(برطعه الشرقية بلدة صامدة أمنة بيئيا مزدهرة تجارياً واجتماعياً)** وقد جاءت الأهداف التنموية على النحو الآتي:

- تطوير البنية التحتية للطرق.
- تأهيل الطرق الداخلية وتوسعتها.
- تطوير نظام تصريف مياه الأمطار في شوارع البلدة.
- تطوير المناطق الخضراء والمناطق الطبيعية والبيئية.
- توفير بيئة صحية امنة للمواطنين.
- تحسين نظام جمع النفايات وإعادة تدويرها.
- توسيع شبكة الصرف الصحي لتشمل كافة مناطق البلدة
- الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث نتيجة الحفر الامتصاصية
- تطوير الاهتمام بالأماكن السياحية والبيئية والطبيعية.
- تشجيع السياحة الداخلية في البلدة.
- الحفاظ على البيئة والمناطق الخضراء.
- تنظيم السوق التجاري والتقليل من عشوائية المحال التجارية.

- تطوير مناطق صناعات حرفية منفصلة عن السوق التجاري.
- تخفيف الازدحام المروري في السوق.
- تطوير وتحسين التجهيزات والامكانيات الصحية لخدمات المراكز الصحية.
- توفير الخدمات الطبية على مدار الساعة.
- تطوير البنية التحتية للتعليم والمرافق المدرسية في مدارس البلدة.
- توفير جو دراسي مناسب.
- تشجيع مشاركة الفئات المهمشة كالنساء وذوي الإعاقة في الأنشطة المجتمعية.
- تطوير المرافق والأنشطة الرياضية والشبابية وبرامج بناء القدرات.
- توسيع المخطط الهيكلي ليشمل مناطق توسع مستقبلي.
- تنظيم ومراقبة عشوائية البناء.
- تطوير إمكانيات البلدية وتوفير التجهيزات اللازمة لتوفير كامل الخدمات للمواطنين.

بناءً على الأهداف التنموية أعلاه، وارتباطا بنتائج عملية التشخيص والتحليل والتي لم تعالج فقط المؤثرات السلبية أو الإيجابية فقط، وبل تناولت أيضا، أهم الاحتياجات والأولويات التنموية، تم بلورة عدد من البرامج للسنة الأولى وتوصيفها، إلى جانب إعداد خطة متابعة وتقييم، تهدف إلى تقييم الخطة وما سيتم تحقيقه أو ما لم يتم تنفيذه.

2. مقدمة

يتزايد الاهتمام على المستويين الوطني والمحلي، بالتخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية كمنهج علمي وتشاركي في دراسة واقع التجمعات السكانية في فلسطين، ورسم الصورة المستقبلية لها، والذي بات يشكل تقليدا في قطاع الحكم المحلي.

وقد استفادت الهيئات المحلية الفلسطينية من تجاربها وخبراتها المتراكمة من عمليات التخطيط التنموي المحلي والتي انطلقت منذ العام 2009[4]، في إعداد وتطوير خطط تنموية محلية استجابة للتطورات والتغيرات الوطنية والمحلية من جهة، وإمكانياتها وقدراتها المختلفة من جهة أخرى، وذلك من أجل الارتقاء بواقع المجتمع المحلي من خلال التخطيط للمستقبل المبني على النمو والتوسع الطبيعي، والإمكانيات والقدرات، والاحتياجات والأولويات، آخذين بعين الاهتمام السياسات والخطط الوطنية والقطاعية المختلفة ذات العلاقة ، وخاصة أجندة السياسات الوطنية " المواطن أولا" والتي تؤكد في الأولوية الرابعة على الحكومة المستجيبة للمواطن، وبما فيها على مستوى الهيئات المحلية، من خلال الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين[5].

أن الدروس والعبر المستفادة من تجارب وخبرات عملية التخطيط التنموي المحلي والمستخلصة من عمليات المراجعة والتقييم للخطط التنموية السابقة من حيث النجاحات والتطورات، والتحديات والتهديدات في تحقيق الأهداف التنموية والبرامج والمشاريع، تم أخذها بعين الاعتبار في إعداد وتطوير الخطة التنموية المحلية للأعوام 2023 – 2026.

في إطار السياقات تلك، جاء إعداد الخطة التنموية المحلية لبلدة برطعه الشرقية للأعوام 2023-2026، والتي تم إنجاز مراحلها الثلاثة الأولى، وهي (أين نحن الآن: التنظيم والتحليل، إلى أين نريد أن نتجه: الإطار التنموي، كيف نصل؟: التنفيذ والمتابعة والتقييم).

نبعت الخطة التنموية المحلية لبلدة برطعه الشرقية في رؤيتها وأهدافها وأولوياتها التنموية من تشخيص وتحليل الواقع الملموس للمجالات التنموية من جهة، وفرص التطور والتقدم من جهة أخرى، وذلك في إطار التعبير عن تطلعات واحتياجات المجتمع المحلي، ضمن محددات أخذت خلال عملية التخطيط، وفي مقدمتها الموارد المتاحة، والإمكانيات والقدرات المتوفرة، والتحديات المتوقعة/المحتملة.

[4] . مرت عملية تطوير دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية بثلاث مراحل، حيث تم إصدار دليل التخطيط التنموي الاستراتيجي الأول في العام 2009، عن وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وبالشراكة مع جهات دولية داعمة، وتم إصدار الطبعة الثانية في العام 2011، والطبعة الثالثة المحدثة والمشار إليها ب دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية في العام 2017.

[5] . لمزيد من المعلومات أنظر، مجلس الوزراء الفلسطيني، أجندة السياسات الوطنية " المواطن أولا" للأعوام 2017-2022.

تجدر الإشارة هنا بأن الخطة التنموية المحلية لبلدة برطعه الشرقية أولت أهمية كبيرة للمشاركة الفعلية لقطاعات الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، حيث تعتبر قضاياهم من القضايا الأساسية في المجتمع المحلي، وذلك من أجل الوصول للمستوى المطلوب من التنمية المحلية والعدالة في الوصول للخدمات وتقديمها. إن تشخيص قضايا وأولويات هذه القطاعات الثلاثة جزء لا يتجزأ من أولويات المجتمع المحلي، لعدد من الأسباب: أولها أن هذه القطاعات الثلاث تشكل نسبة لا تستهان بها من عدد السكان الفلسطيني. فالمجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، ونسبة الشباب بين الأعمار 15-29 تبلغ 40% من نسبة السكان، أما نسبة النساء تبلغ 50% من نسبة السكان، ونسبة ذوي الإعاقة تبلغ 7% من نسبة السكان. ثانياً إن إشراك الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في التخطيط المحلي يساهم في إثراء عملية التخطيط بمجموعة أوسع من المهارات والخبرات ووجهات النظر، وتطعيمها بأفكار ومقترحات جديدة مما يجعل عملية التخطيط شمولية ومستدامة وتشاركية أكثر، ويجعلها معبرة عن كل شرائح المجتمع. ثالثاً أن شرائح الشباب والمرأة وذوي الإعاقة هم مواطنون لا يدخرون جهداً أو وقتا أو مالاً في خدمة مدينتهم وبنائها والارتقاء بها حضاريًا وفكرياً وثقافياً ومجتمعيًا أو أي صعيد أخر.

أ. أهداف الخطة:

تهدف الخطة التنموية المحلية لبلدة برطعه الشرقية إلى تحقيق الأهداف التالية: -

- تعزيز التكاملية والشمولية بين الخطط المحلية التنموية والإقليمية والوطنية لما لذلك من أهمية في إنجاح الخطة التنموية المحلية، وإحداث التنمية المستدامة.
- الاستجابة للاحتياجات والأولويات التنموية بشكل مخطط له، وبعيدا عن العشوائية في العمل، وذلك ضمن رؤية وأهداف وبرامج وخطط عمل تنفيذية واضحة وقابلة للتنفيذ.
- ربط عمليات التطوير الإداري والمالي والخدماتي بالخطة التنموية المحلية.
- توطين عملية التخطيط ومأسستها كأداة تنموية علمية في سياسات وقرارات وخطط البلدية.
- إرساء تقاليد العمل التشاركي في المجتمع المحلي ممثلا بأفراده ومؤسساته المختلفة من خلال توفير مساحات العمل المشتركة في التنمية المحلية.
- مراجعة وتحديث الرؤية التنموية لبلدة برطعه على ضوء التطورات والمتغيرات التي حدثت في السنوات الماضية، وعلى أساس إشراك المجتمع المحلي بفئاته المختلفة في تطوير الإطار التنموي الذي يرسم صورة البلدة للسنوات القادمة.
- بلورة أهم الأهداف التنموية والنابعة/ المنبثقة من جوهر القضايا التنموية، من خلال تحديد التدخلات المختلفة المرتبطة بها والمنسجمة معها، والتي تتصف بالملموسية، والقابلة للتحقيق، والواقعية، والمحددة زمنيا.
- تطوير خطة تنفيذية تحتوي على البرامج والمشاريع والأنشطة التنموية المختلفة، ومنسجمة مع الأهداف التنموية، والتي تتصف بالواقعية، والأولوية، وإمكانية تنفيذها، وتستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي وتطلعاته ومن الممكن تنفيذها خلال عمر هذه الخطة (4 سنوات)..
- تصميم خطة متابعة وتقييم مرتبطة بمدى تحقيق الأهداف التنموية، وبما يضمن تتبع ومراجعة وتقييم النجاحات والتطورات المختلفة، والإخفاقات والتحديات الممكن أن تبرز في سياق تنفيذ الخطة التنموية خلال الأربع سنوات القادمة.

ب. منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية:

اعتمدت عملية إعداد الخطة التنموية المحلية في مراحلها المختلفة، على دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية للعام 2017 والمقر من قبل وزارة الحكم المحلي وبالإضافة إلى ما راكمته البلدية من خبرات وتجارب في قيادة وإدارة عملية التخطيط التنموي في إعداد وتطوير خططها التنموية السابقة.

وتركز منهجية التخطيط التنموي المحلي على اعتماد منهج الشراكة المجتمعية والشفافية والمساءلة في مختلف الخطوات، وضمان إشراك مختلف مكونات المجتمع المحلي وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

أن دليل التخطيط التنموي المحلي، والذي يتبنى منهج المشاركة والشفافية في مختلف مراحل عملية التخطيط التنموي المحلي، قد عكس ذلك في مكونات وخطوات كل مرحلة من مراحل التخطيط عبر الأدوات والأساليب المتنوعة المستخدمة في مراحل التخطيط الخمسة وهي:


المرحلة الأولى: أين نحن الآن؟ وهي مرحلة التنظيم والتحليل.

المرحلة الثانية: إلى أين نريد أن نتجه؟ وهي مرحلة الإطار التنموي.

المرحلة الثالثة: كيف نصل؟ وهي مرحلة وضع خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم.

المرحلة الرابعة: ما يوصلنا؟ وهي مرحلة التنفيذ.

المرحلة الخامسة: هل وصلنا؟ وهي مرحلة المتابعة والتقييم.

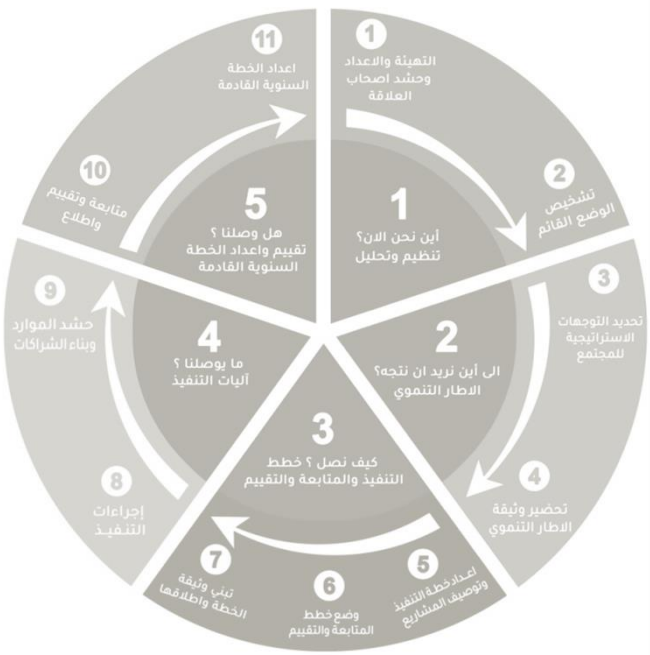

وقد تم تنفيذ الثلاثة مراحل الأولى من عملية إعداد وتطوير الخطة التنموية المحلية لبلدة برطعه الشرقية للأعوام (2023-2026)، بينما المرحلة الرابعة والخامسة ستقوم البلدية على تنفيذهما من خلال اللجان المعتمدة بهذا الخصوص، حيث تتضمن كل مرحلة منها عدد من الخطوات والأنشطة والمخرجات المفترض الحصول عليها.

المجالات التنموية:

ركزت عملية التخطيط التنموي المحلي على تشخيص وتحليل المجالات التنموية الأربعة وهي: البيئة والبنى التحتية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والتنمية الاجتماعية، والإدارة والحكم الرشيد). وقد تم تناول المجالات التنموية في إطار عملية تشخيصية وتحليلية شمولية ومتكاملة، تقوم على وصف الواقع القائم، ومن ثم تحديد أهم المؤثرات الإيجابية والسلبية المحيطة به، والتي على ضوئها تم بلورة وتحديد القضايا الرئيسة، ومن ثم تحديد أهم الاحتياجات والأولويات.

هيكلية إدارة عملية التخطيط التنموي على المستوى المحلي:

اعتمدت بلدية برطعه الشرقية هيكلية إدارة عملية التخطيط التنموي المحلي المقترحة في دليل التخطيط التنموي المحلي، وحيث أطلقت البلدية عملية التخطيط التنموي المحلي في لقاء البيت المفتوح المنعقد بتاريخ 28-1-2023 واستكملت تشكيل اللجان التنموية التي عملت كل منها في مجال تخصصها، وقد وفرت البلدية البيانات والمعلومات اللازمة لكل مجال تنموي، وعملت اللجان حسب أداورها ومسؤولياتها.

تحديات إعداد الخطة التنموية المحلية:

خلال عملية إعداد التقرير التشخيصي واجهت فريق التخطيط الأساسي ولجان العمل المتخصصة عدد من الإشكالات والتي يمكن تلخيصها بما يلي: -

- عدم توفر بعض البيانات لدى البلدية أو المؤسسات العامة حيث قامت اللجان المتخصصة بتنفيذ مسح ميداني مبسط لبعض القطاعات لتجاوز هذه الإشكالات.
- عدم توفر بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة عن كثير من المجالات التنموية في البلدة.
- ضيق الوقت المتعلق بعملية جمع المعلومات وتحليلها وكتابة التقرير النهائي ولاسيما وأنه يضم تشخيص لكافة القطاعات التنموية في البلدة.
- صعوبة تحديد الوقت الملائم لعقد اللقاءات المتعلقة بأعضاء اللجان المتخصصة في بعض الأحيان.

نبذة عن البلدة

- لمحة تاريخية
- الخصائص الجغرافية
- الخصائص الديموغرافية

03



3. نبذة عن بلدة برطعه الشرقية

منطقة الدراسة

تتناول هذه الدراسة **بلدة برطعه الشرقية** في محافظة جنين، وهي ذات خصائص جغرافية واقتصادية واجتماعية ترتبط بشكل مباشر بالتخطيط التنموي للبلدة نلخصها في الفقرات التالية:


الخصائص الجغرافية


الموقع والعلاقة الإقليمية:

تقع بلدة برطعه الشرقية غرب جدار الفصل العنصري إلى الشمال الغربي من مدينة جنين على الخط الأخضر الفاصل بحيث يحدها من الشرق قرية طوره الغربية، ومن الغرب بلدة برطعه الشرقية الغربية، ومن الشمال قرية عرعرة، ومن الجنوب قرية ظهر العبد، كما تقع على دائرة عرض 32,5,52 شمالًا، وعلى خط طول 35,5,15 شرق خط غرينتش، وعلى إحداثيات 209-210 عرض، و159-163 طول حسب شبكة الإحداثيات الفلسطينية.

هذا وقد ارتبط موقع بلدة برطعه الشرقية بما يسمى بالخط الأخضر – الحد الفاصل بين المناطق المحتلة في العام 1948 م والمناطق المحتلة في العام1967 م– لذا فقد برزت أهمية القرية باعتبارها حلقة وصل بين مناطق 1948 ومناطق 1967، فكان لهذا الموقع المتميز الأثر الأكبر على حياة السكان، ومما زاد في أهمية المنطقة مرور المواطنين من البلدان والقرى المجاورة من خلالها إلى الدخل الفلسطيني ودخول أهالي الداخل إليها بكل سهولة ؛ مما أتاح للسكان ممارسة بعض النشاطات الاقتصادية، كما أن المنطقة محاطة بمجموعة من الوديان التي يجري فيها الماء في موسم الشتاء مثل الواد الغميق وواد عيد وواد فضيل، إضافة لكونها محاطة بمجموعة من التلال التي تتراوح ارتفاعاتها بين 200-425 م عن مستوى سطح البحر، والتي من أهمها: تلة العاص إلى الشمال من القرية، ومحمية العمرة إلى الشرق من البلدة.

- **المساحة:** وبلغ مساحة أراضي البلدة حوالي 11104 دونم وهي في معظمها ملكيات خاصة.
- **التضاريس والمناخ:** ويعتبر مناخها من المناخات المعتدلة في فلسطين، حيث أن مناخها معتدل صيفا ودافئ شتاء، وتتراوح كمية الأمطار فيها ما بين 400 إلى 600 ملم سنويا.

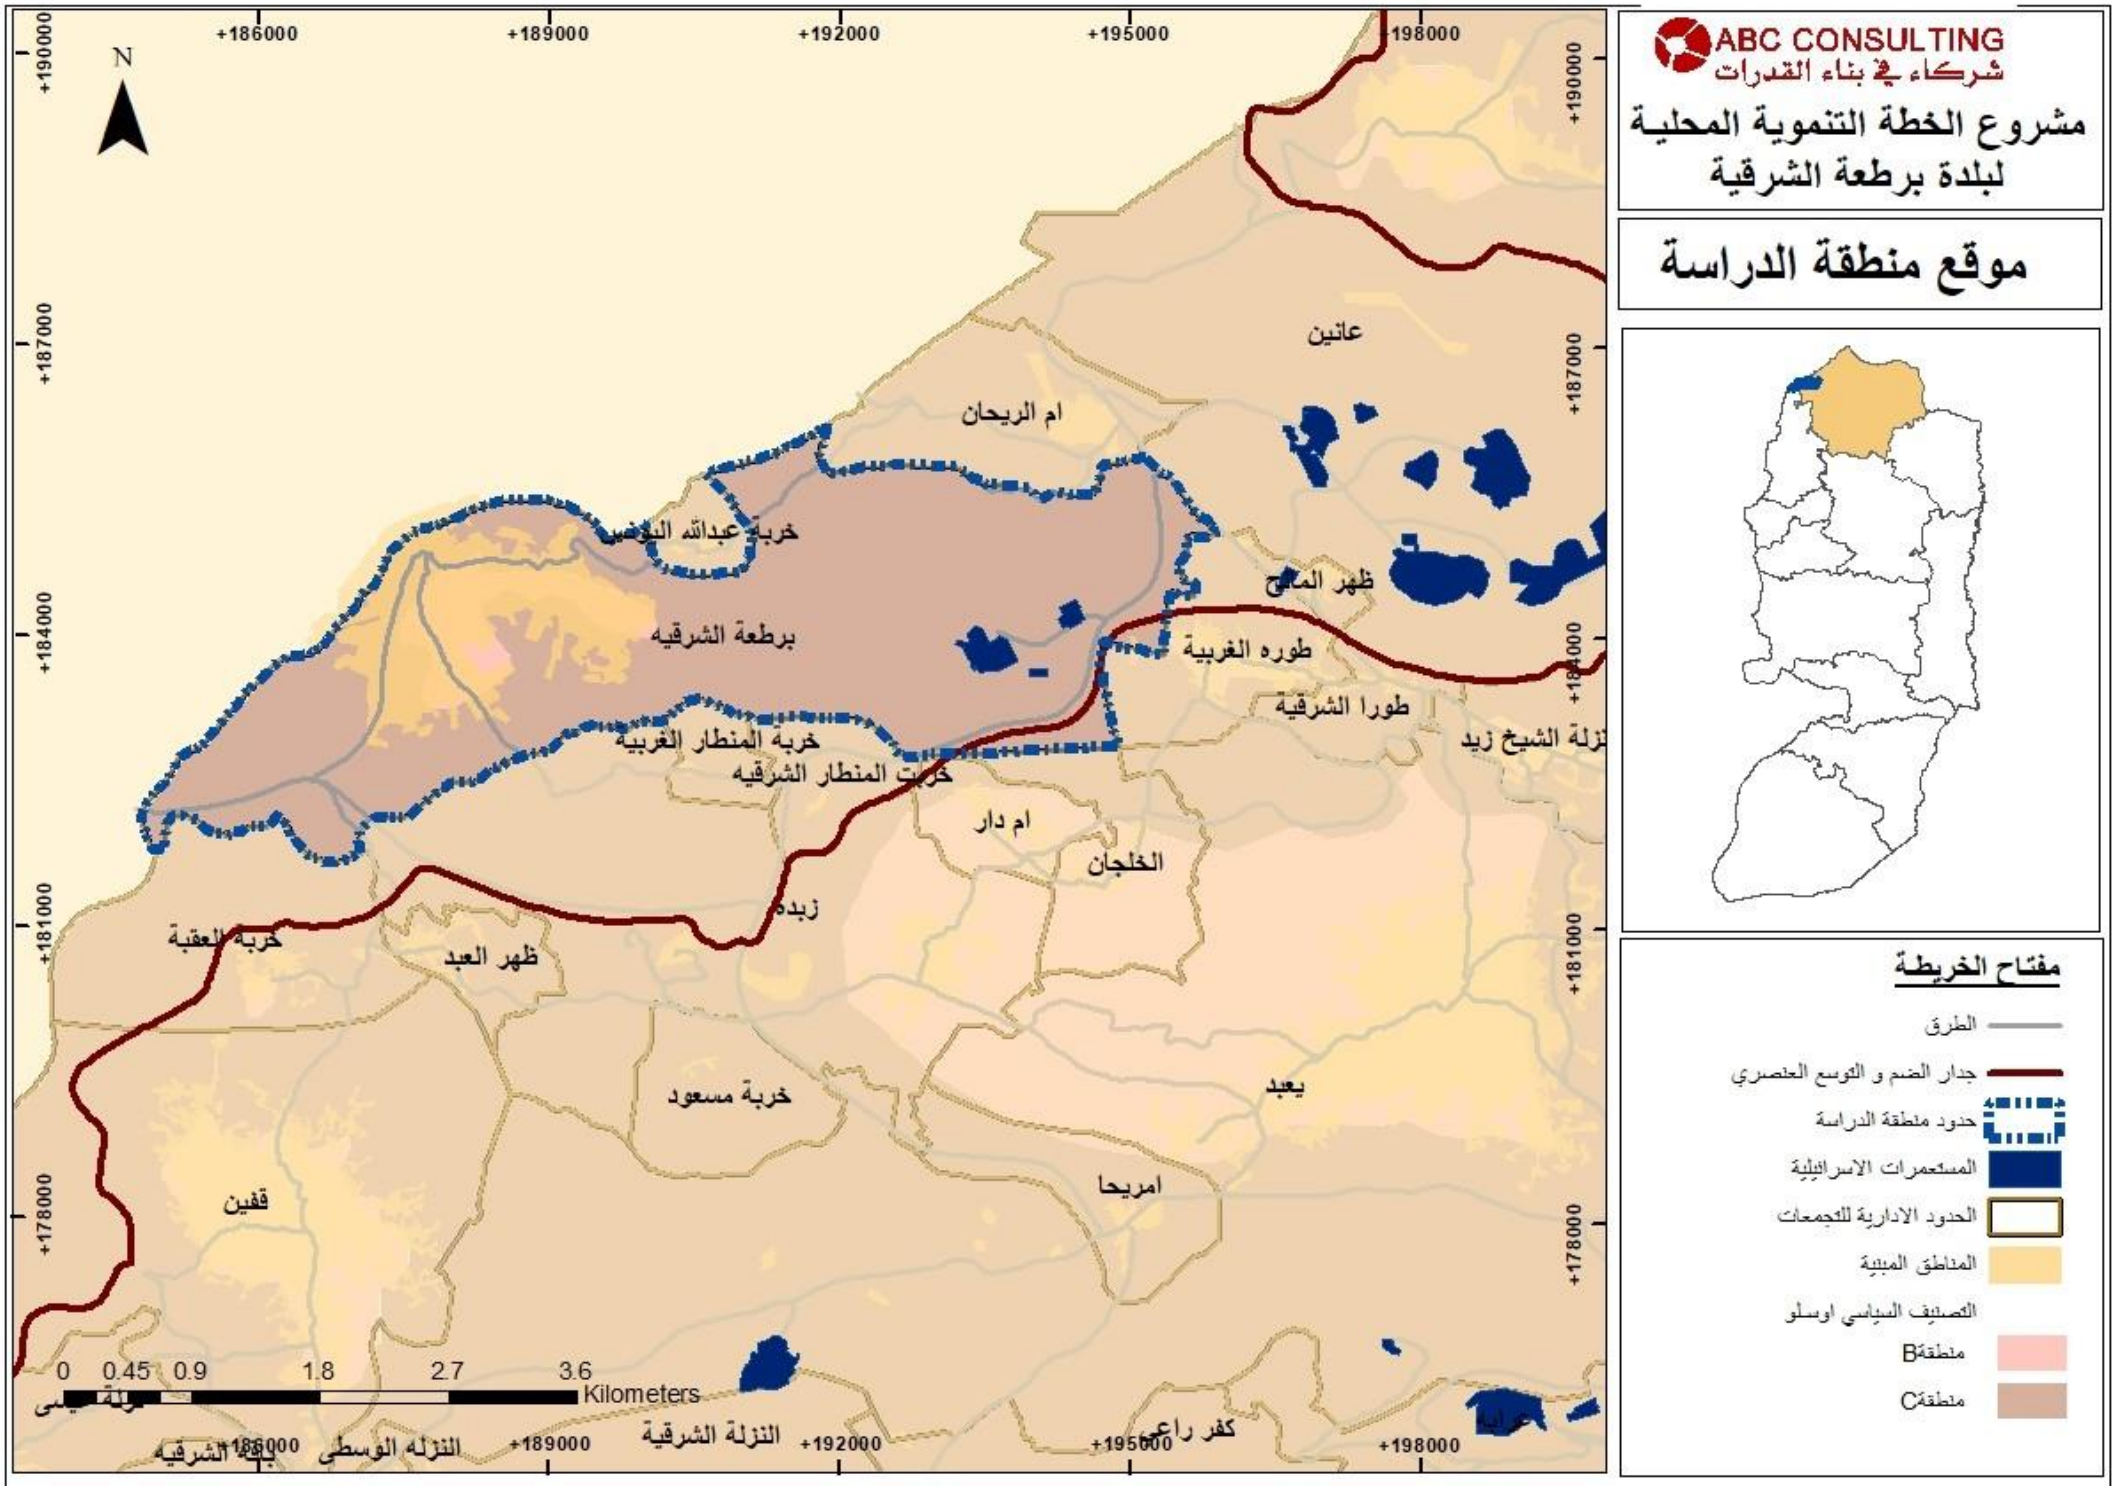
ABC CONSULTING
شركاء في بناء القدرات
مشروع الخطة التنموية المحلية
لبلدة برطعة الشرقية
موقع منطقة الدراسة
مفتاح الخريطة
الطرق
جدار الضم و التوسع العنصري
حدود منطقة الدراسة
المستعمرات الاسرائيلية
الحدود الادارية للتجمعات
المناطق المبنية
التصنيف السياسي اوسلو
منطقةB
منطقةC
N
عانين
ام الريحان
خربة عبدالله اليونس
برطعة الشرقيه
ظهر المالح
طوره الغربية
طورا الشرقية
نزلة الشيخ زيد
خربة المنطار الغربية
خربت المنطار الشرقيه
ام دار
الخلجان
زبدة
خربة العقبة
ظهر العبد
خربة مسعود
يعبد
امريحا
قفين
كفر راعي
النزلة الشرقية
النزله الوسطى
0 0.45 0.9 1.8 2.7 3.6
Kilometers
+186000
+189000
+192000
+195000
+198000
+190000
+187000
+184000
+181000
+178000

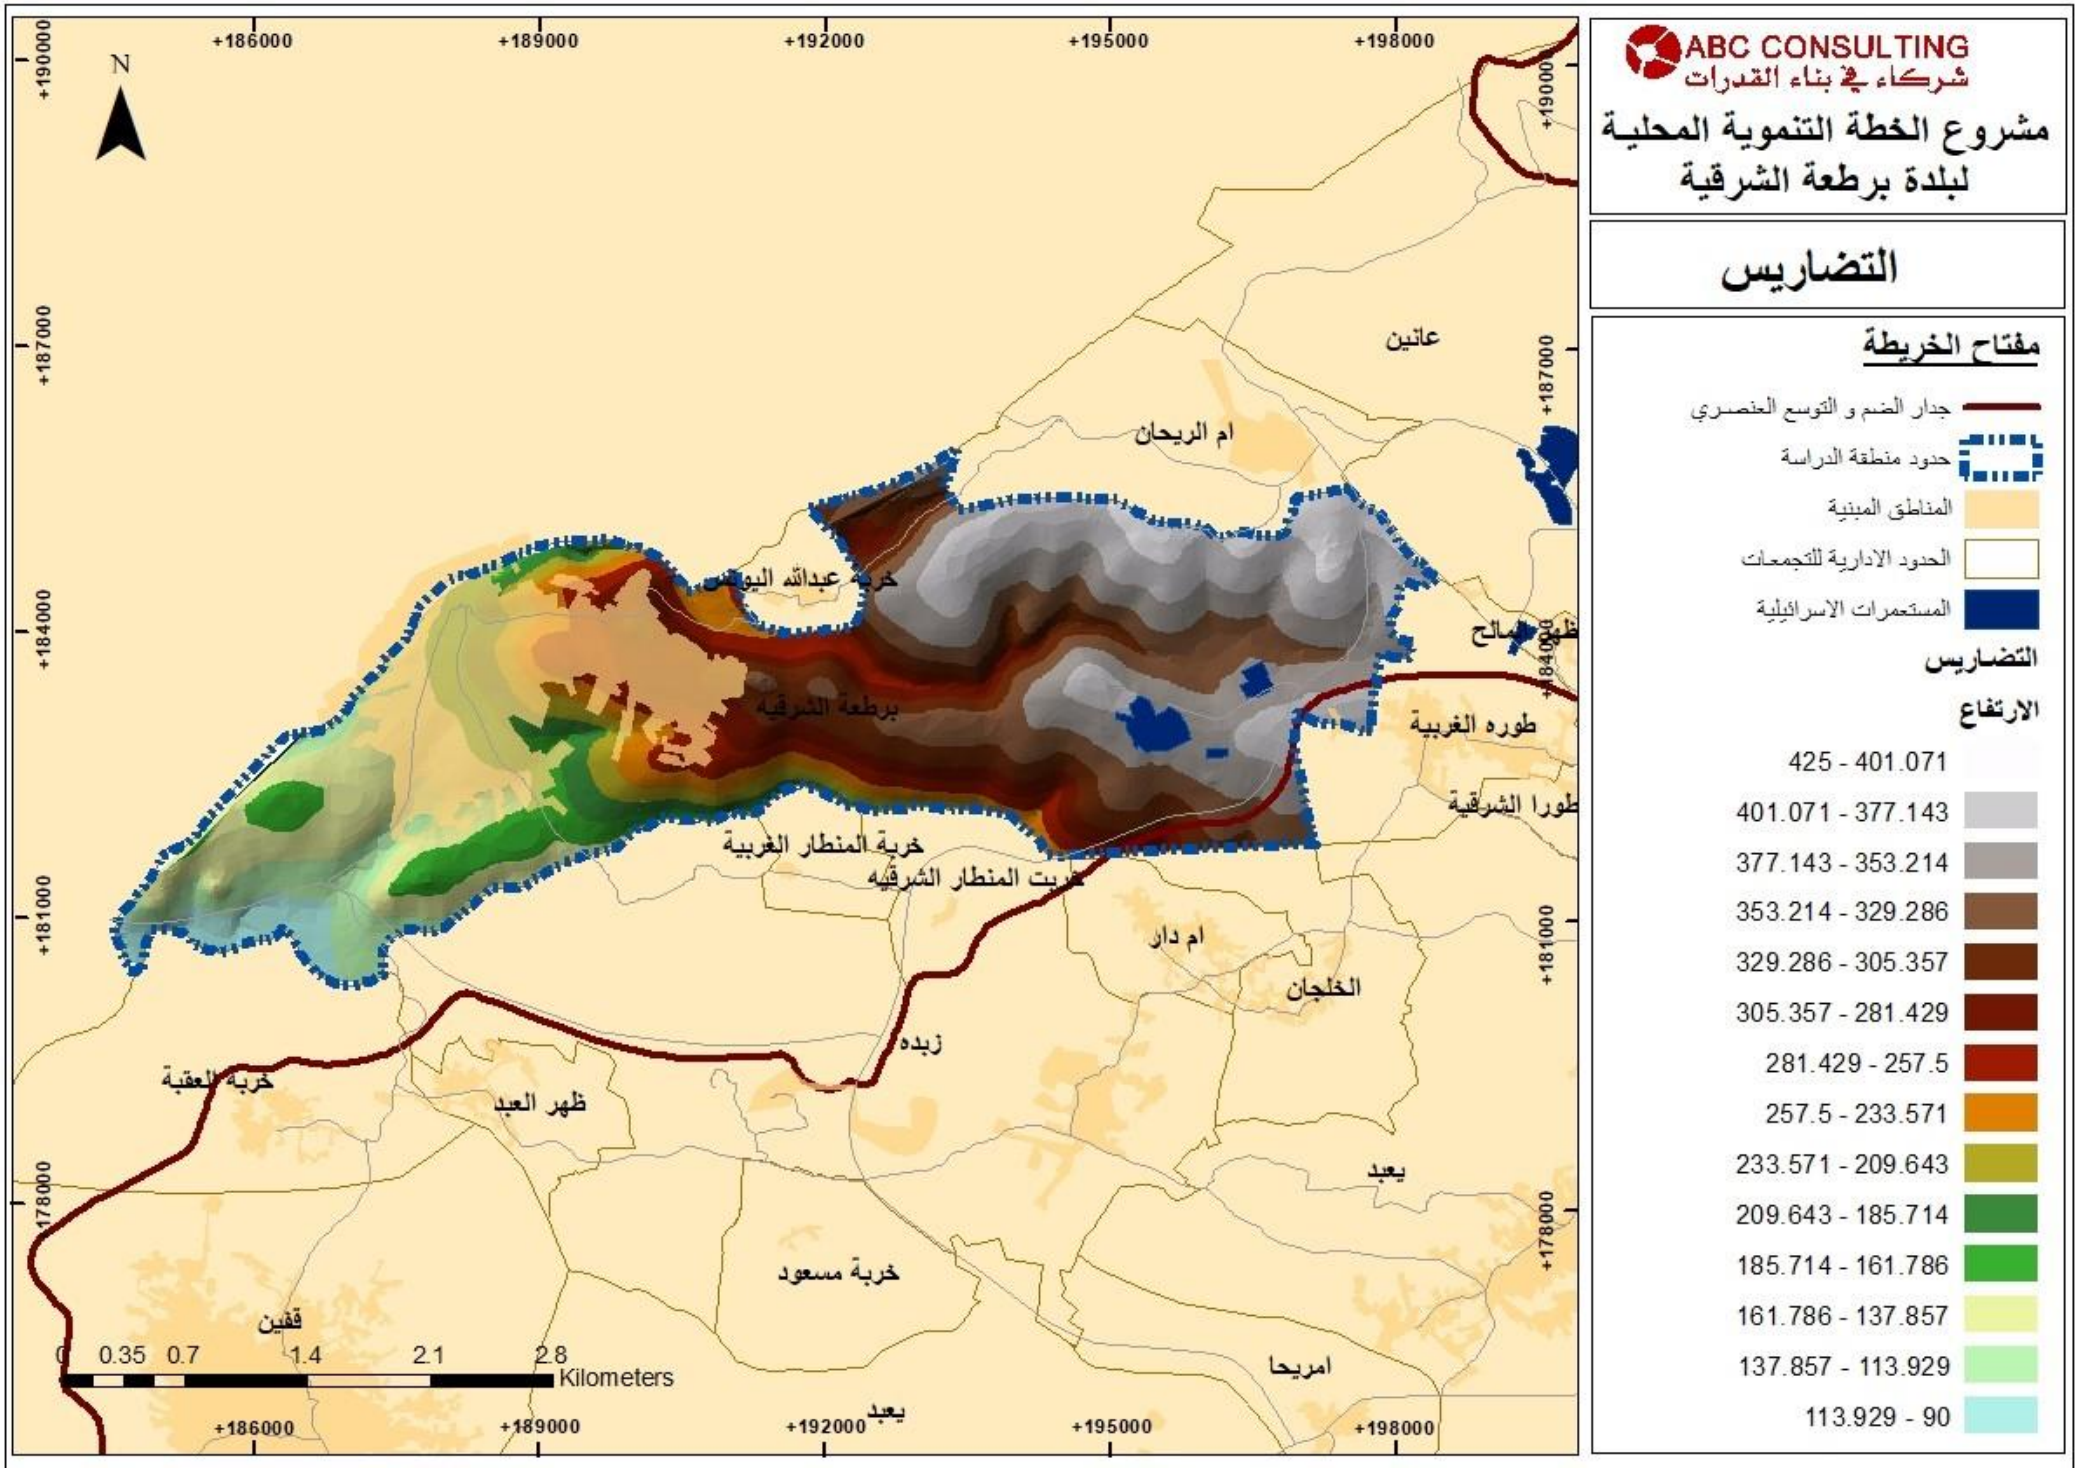
ABC CONSULTING
شركاء في بناء القدرات
مشروع الخطة التنموية المحلية
لبلدة برطعة الشرقية
التضاريس
مفتاح الخريطة
جدار الضم و التوسع العنصري
حدود منطقة الدراسة
المناطق المبنية
الحدود الادارية للتجمعات
المستعمرات الاسرائيلية
التضاريس
الارتفاع
425 - 401.071
401.071 - 377.143
377.143 - 353.214
353.214 - 329.286
329.286 - 305.357
305.357 - 281.429
281.429 - 257.5
257.5 - 233.571
233.571 - 209.643
209.643 - 185.714
185.714 - 161.786
161.786 - 137.857
137.857 - 113.929
113.929 - 90
N
+186000
+189000
+192000
+195000
+198000
+190000
+187000
+184000
+181000
+178000
عانين
ام الريحان
خربة عبدالله اليونس
برطعة الشرقية
طوره الغربية
طورا الشرقية
خربة المنطار الغربية
خربة المنطار الشرقيه
ام دار
الخلجان
زبده
خربة العقبة
ظهر العبد
يعبد
خربة مسعود
قفين
امريحا
0 0.35 0.7 1.4 2.1 2.8
Kilometers

الخصائص الديمغرافية:

تتمثل الموارد البشرية في بلدة برطعه الشرقية بالقوى العاملة والتي تشكل ما نسبته 56.6% من عدد السكان الإجمالي (والذي بلغ 5264 نسمة حسب المركز الفلسطيني للإحصاء لعام 2022) ذلك لأن من هم في سن العمل من السكان يشكلون حوالي 56.6% من إجمالي السكان، ويمكن تصنيف الفئة العاملة إلى عدة شرائح وهي: الموظفين، التجار، الحرفيين، المزارعين والعمال

جدول (1.1): أعداد السكان من (2007-2022)[6]

اسم التجمع	رمز التجمع	السنة		
		2007	2017	2022
برطعه الشرقية	10120	4,126	4750	5264



فيما يخص توزيع الفئات العمرية يتبين من الجدول أن مجتمع برطعه الشرقية فتي حيث بلغ نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 37.2% من إجمالي سكان البلدة في عام 2017.

يوضح الجدول (1.2) توزيع السكان حسب الفئات العمرية والجنس في بلدة برطعه الشرقية للعام 2017 والشكل (1.1) يبين الهرم السكاني حسب الجنس لسنة 2017.


[6] المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (تقديرات أعداد السكان، 2007- 2022)

جدول (1.2) : توزيع السكان حسب الفئات العمرية لبلدة برطعه الشرقية لعام 2017[7]


الفئة العمرية	تعداد سكان 2017			
	ذكور		إناث	
	عدد	نسبة	عدد	نسبة
0 - 4	294	0.12154	356	0.15614
5 - 9	315	0.13022	284	0.12456
10 -14	264	0.10914	237	0.10395
15 - 19	258	0.10666	227	0.09956
20 - 24	215	0.08888	215	0.0943
25 - 29	194	0.0802	151	0.06623
30 - 34	186	0.07689	145	0.0636
35 - 39	146	0.06036	137	0.06009
40 - 44	129	0.05333	114	0.05
45 - 49	97	0.0401	79	0.03465
50 - 54	65	0.02687	77	0.03377
55 - 59	58	0.02398	69	0.03026
60 - 64	56	0.02315	44	0.0193
65 - 69	64	0.02646	72	0.03158


[7] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تقديرات السكان العام 2017 في محافظة جنين، 2017

الشكل (1.1): الهرم السكاني لبلدة برطعه الشرقية لعام 2017

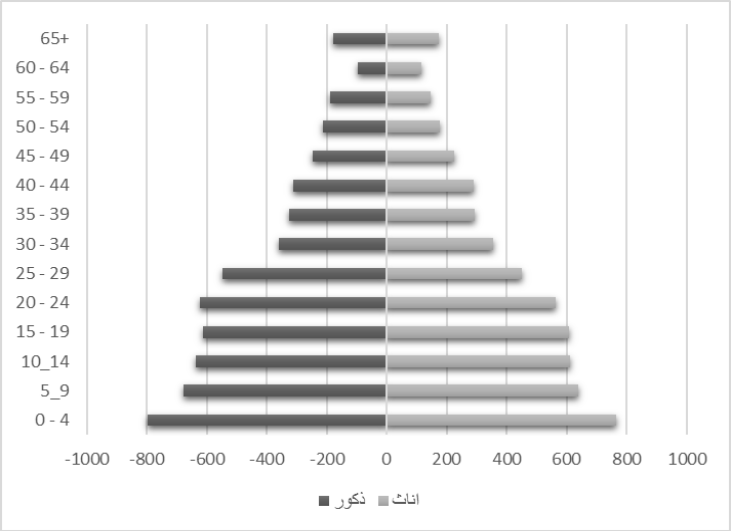

الشكل (1.2): التركيب العمري والنوعي لبلدة برطعه الشرقية لعام 2017

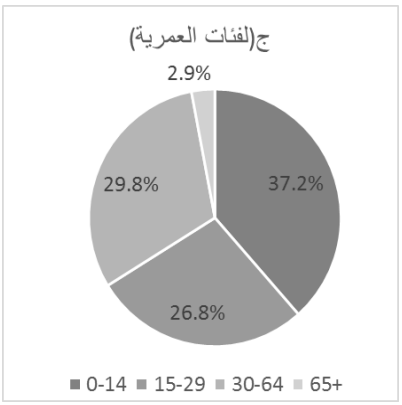

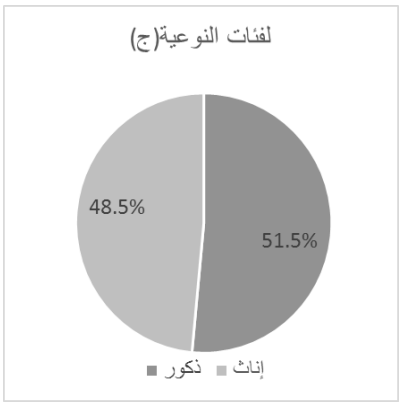

بالنسبة للتركيب النوعي في بلدة برطعه الشرقية نلاحظ تقارب عدد الذكور مع الإناث، حيث بلغ عدد الذكور 2419 نسمة بنسبة 51.5% بينما بلغ عدد الإناث 2280 نسمة بنسبة 48.5%.

أما بالنسبة للتوقع السكاني لعام 2026 فمن المتوقع أن يبلغ عدد السكان 5693 نسمة بمعدل نمو 2.1%.


جدول (1.3) عدد السكان المتوقع لبلدة برطعه الشرقية حتى عام 2026

السنة	2022	2023	2024	2025	2026
عدد السكان	5264	5370	5478	5585	5693

تبلغ الكثافة السكانية في منطقة التخطيط 2.7 نسمة /دونم والجدول التالي يبين ذلك.

جدول (1.4) عدد السكان والكثافة السكانية في بلدة برطعه الشرقية لعام 2022

عدد السكان	عدد الوحدات السكنية	مساحة المنطقة المبنية	الكثافة السكانية	
			نسمة/دونم	وحدة سكنية/دونم
5264	1407	1939	2.7	0.7

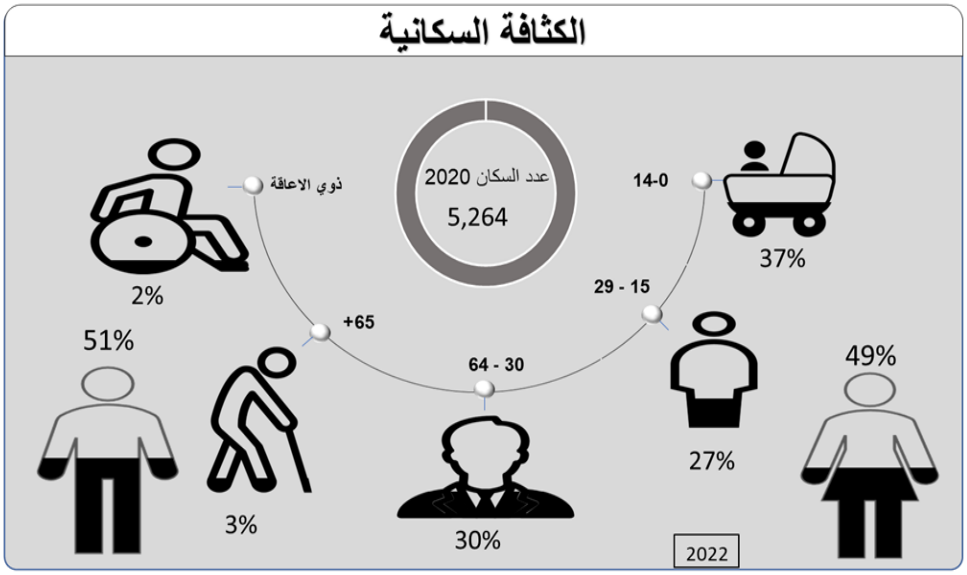

التحليل التشخيصي للمجالات التنموية الرئيسية

04

مجال البيئة والبنى التحتية:

- الطاقة والاتصالات
- الطرق والمواصلات
- الصحة العامة والبيئة
- المياه والصرف الصحي
- وتصريف مياه الامطار والنفايات

مجال تنمية الاقتصادي المحلي

- العمالة والتوظيف
- الزراعة
- الترفيه والسياحة
- التجارة والصناعة
- والخدمات المساندة.

مجال التنمية الاجتماعية

- الخدمات الاجتماعية
- التعليم
- الصحة
- الحماية الاجتماعية والتمكين
- الثقافة والتراث
- الرياضة
- والسكن

مجال الادارة والحكم الرشيد

- التخطيط والتنظيم
- الأمن وإدارة الكوارث
- ادارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة المحلية.

4. التحليل التشخيصي للمجالات التنموية الرئيسة

يتناول هذا المحور، ملخص التحليل التشخيصي للمجالات التنموية الرئيسة التي تم التوصل إليها في التقرير التشخيصي لبلدة برطعه الشرقية والمعد في شهر 31-12-2022.

أولا: مجال البيئة والبنى التحتية

يشمل مجال البيئة والبنى التحتية في بلدة برطعه الشرقية القطاعات التالية: الطاقة والاتصالات، والطرق والمواصلات، والصحة العامة والبيئة، والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، والنفايات الصلبة. تم تشخيص وتحليل الوضع الحالي لهذا القطاعات من خلال اجتماعات اللجان القطاعية المتخصصة، وبالاعتماد على المؤشرات الرقمية والوصفية المختلفة في كل منها، يمكن تقييم هذه القطاعات على النحو التالي:

1.1 الطاقة والاتصالات

تم وصل شبكة الكهرباء إلى البلدة في العام 1982 عن طريق شبكة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، ويبلغ طول الشبكة حوالي 25 كم وهي بحاجة إلى توسعة بشكل مستمر في ظل التوسع العمراني الكبير في البلدة، حيث تغطي الشبكة حوالي 99% من المنازل. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تقوية القدرة الكهربائية وخصوصا بعد التزايد الكبير في عدد المنشآت التجارية الصناعية بالبلدة.

تعاني البلدة من ارتفاع سعر الكهرباء وذلك بسبب سيطرة الاحتلال على القدرة الكهربائية المزودة للبلدة، وبالتالي ارتفاع سعر إنارة الشوارع ليلاً، وبذلك فإن البلدة بحاجة إلى مصدر طاقة بديل ومستدام كالطاقة الشمسية لتوفير احتياجات السكان والمنشآت التجارية والصناعية بالقدر المطلوب.

المؤثرات الإيجابية	• وجود جمعية مسؤولة عن الكهرباء بطاقم مميز وبمقدرات جيدة.
المؤثرات السلبية	• ارتفاع تكلفة خدمة الكهرباء. • عدم كفاية القدرة الكهربائية وعدم وملاءمتها لاحتياجات البلدة نظرا لتحكم الشركة القطرية الإسرائيلية للكهرباء بالقدرة المقدمة. • ارتفاع تكاليف إنارة كامل الشوارع في البلدة طوال الليل (تحتاج البلدية لـ 2 ميلي أمبير). • ارتفاع سعر شراء الكهرباء من الشركة القطرية. • ارتفاع نسبة الفاقد في الشبكة الكهربائية 2%.


1.2 الطرق والمواصلات

يبلغ مجموع أطوال شبكة الطرق في بلدة برطعه حوالي 35 كم منها 15 كم عبارة عن طرق زراعية كلية والباقي هي طرق داخلية تنقسم إلى معبدة وغير معبدة (ترابية) تغطي البلدة بنسبة 95% ومؤخرا تم تعبيد العديد من الطرق بعد أن تم إنهاء معظم مشاريع البنية التحتية والبلدية في طور إكمال الشوارع الأخرى.

مع تزايد النشاط التجاري في البلدة وزيادة حركة المرور وعدد السيارات، زاد الضغط على الطرق وأصبحت عروضها غير كافية، حيث تعاني شبكة الطرق من ضيق بعض الشوارع في ظل الحركة التجارية الكبيرة، كما تعاني من نقص أماكن وقوف السيارات والباصات العامة مما يزيد الضغط على شبكة الطرق بسبب وقوف السيارات على جانبي الطريق، كما أن عدم وجود نظام تصريف مياه في البلدة أثر بشكل سلبي على الشوارع وزاد من حالتها سوءا، وبذلك فإن البلدة بحاجة ماسة إلى نظام تصريف مياه الأمطار.

كما تعاني البلدة من ارتفاع عدد حوادث السير في السنة وذلك لأن الطرق بحاجة للتأهيل ورفع مستوى السلامة والأمان عن طريق تخطيط الشوارع وإضافة الشواخص المرورية وإشارات المرور، بالإضافة إلى حركة المرور الكبيرة في البلدة وتزايد النشاط التجاري بشكل كبير.

المؤثرات الإيجابية	• وجود بعض المعدات لإصلاح الطرق لدى البلدية. • وصول الطرق لأغلب سكان البلدة. • أغلب طرق البلدة بحالة جيدة.
المؤثرات السلبية	• التزايد العمراني السريع والكبير. • الأزمة المرورية الكبيرة في البلدة. • عدم كفاية خطوط الصرف الصحي. • سوء حالة بعض الطرق في البلدة ووجود طرق غير معبدة. • ضيق بعض الطرق. • عدم ملائمة وجمالية مدخل البلد كمدخل رئيسي. • عدم وجود مواقف تكاسي. • عدم وجود شبكات تصريف مياه الأمطار. • الطرق غير مخططة وبحاجة لشواخص وإشارات مرور.

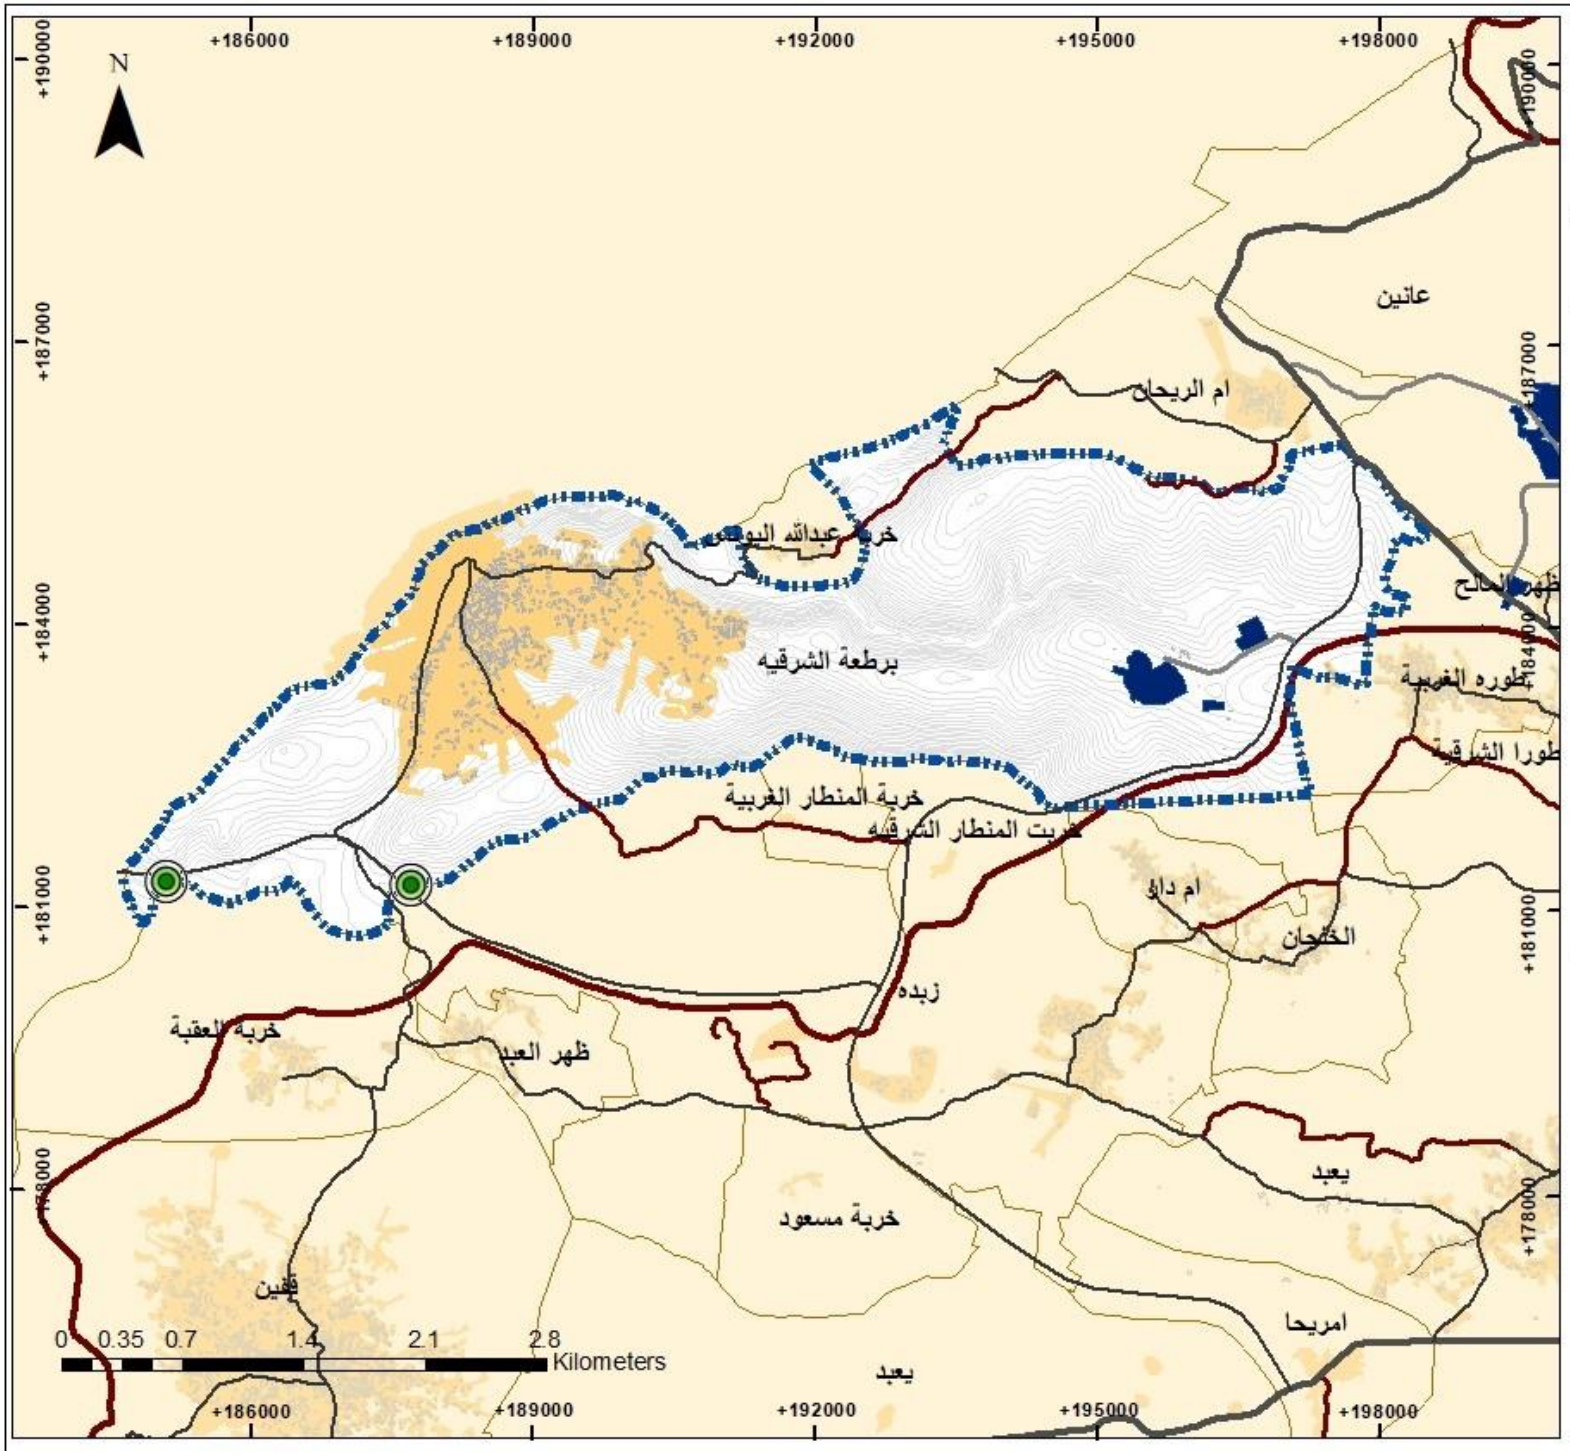

ABC CONSULTING
شركاء في بناء القدرات

مشروع الخطة التنموية المحلية لبلدة برطعة الشرقية

الطرق و المداخل

مفتاح الخريطة

- مداخل برطعة
- خطوط الكنتور
- جدار الضم و التوسع العنصري
- حدود منطقة الدراسة
- المستعمرات الاسرائيلية
- الحدود الادارية للتجمعات
- المناطق المبنية
- المباني

الطرق

- ترابي
- محلي
- طرق مستوطنات

1.3 الصحة العامة والبيئة

يعتبر الوضع الصحي والبيئي في بلدة برطعه جيد إلى حد ما ولا يوجد ما يؤثر بهذا الجانب سوى وجود السوق التجاري الكبير في البلدة وما يخلفه من نفايات منوعة وتزايد المنشآت الصناعية فيه مما ينتج الغازات الضارة والغبار الناتج عنها.

تقوم بلدية برطعه بزيادة المناطق الخضراء في البلدة لتحسين جودة البيئة، وتأهيل منطقة نبع العين للحفاظ عليها لتصبح مكان سياحي ترفيهي، بالإضافة إلى منطقة المنتزه في منطقة الأشجار الجبلية وذلك من منطلق الاهتمام بالبيئة والصحة العامة.

تعاني البلدة من عدة عوامل تؤثر على البيئة بشكل كبير أهمها مخلفات السوق التجاري بمحاله التجارية والصناعية، وعدم الرقابة على المنشآت الصناعية وتداخلها مع المنطقة التجارية وبالتالي ارتفاع نسبة التلوث البيئي في المنطقة، إضافة إلى وجود الحفر الامتصاصية والصماء بسبب عدم تغطية شبكة الصرف الصحي لكافة أنحاء البلدة، وعدم وجود مسلخ بلدي أدى إلى تأثر البلدة بشكل كبير من مخلفات الملاحم والدواجن.

المؤثرات الإيجابية	• قيام البلدية بزيادة المناطق الخضراء في البلدة. • اهتمام البلدية بتأهيل منطقة نبع العين.
المؤثرات السلبية	• زيادة مخلفات السوق التجاري ومنشآته المتنوعة. • عدم تغطية شبكة الصرف الصحي لكافة البلدة. • قلة وعي المواطنين بأهمية النظافة. • قلة الاهتمام بمنطقة العين البيئية. • قلة المتابعة على المنشآت الصناعية والتجارية. • ارتفاع نسبة التلوث البيئي.

1.4 المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار

المياه:

يتم تغذية البلدة بالمياه من مصدر مياه نبعة العين الواقعة في منطقة الواد الغميق شمالي البلدة ومن مصدر شبكة ماكروت الإسرائيلية، بحيث تبلغ أطوال الشبكة حوالي 22 كم وتعاني من نسبة فاقد كبير ويوجد نقص في إيصال المياه لكافة المنشآت في ظل التزايد العمراني الكبير وتزايد الطلب على الاحتياج من المياه.

الصرف الصحي:

يوجد في البلدة شبكة صرف صحي حديثة الإنشاء، حيث تم الانتهاء من تمديد الخطوط الرئيسية في العام 2013 التي غطت حوالي 60% من مساحة البلدة آنذاك وفي العام 2014 تم البدء بمشروع إنشاء الوصلات المنزلية لشبكة الصرف الصحي والتي لم تغطي كافة المناطق الموجود بها خطوط رئيسية حيث يتم تصريف المجاري بواسطة نقاط ربط على الخط الرئيسي بين برطعه الشرقية وبرطعه الغربية والمؤدي إلى داخل الخط الأخضر.

المؤثرات الإيجابية	• وجود خزانين للمياه في البلدة. • توفر المياه اغلب الأوقات. • وجود شبكة مجاري جزئية.
المؤثرات السلبية	**المياه:** • نقص كميات المياه المتوفرة للبلدة. • تدني مستوى جودة خدمات المياه (مثل: الصرف الصحي، مياه الشرب.. إلخ) المقدمة للمواطنين. • عدم توفر مصادر مياه أخرى، والاعتماد على شركة ماكروت الإسرائيلية كمصدر رئيسي للمياه. • كمية الفاقد الكبيرة في شبكة المياه (بنسبة 35%). **الصرف الصحي:** • عدم وجود شبكة خطوط رئيسية للصرف الصحي في الأحياء الجديدة. • تدفق مياه الأمطار في شوارع البلدة مما يعيق حركة المواطنين والسيارات.

1.5 النفايات الصلبة

يتم جمع النفايات من البلدة مرتين في الأسبوع بواسطة سيارتين لجمع النفايات، حيث تقوم بجمع النفايات من البلدة وتفريغها في محطة النقل جنوبي البلدة ويتم نقلها إلى مكب زهرة الفنجان بواسطة شاحنات، ويوجد كميات كبيرة من الكرتون والبلاستيك من مخلفات المحلات التجارية بحاجة إلى إعادة تدوير وفصل كما وأن محطة النقل بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير. بالإضافة إلى ذلك، يوجد فريق من عمال النظافة لتنظيف الشوارع بشكل يومي كما أن أغلب حاويات البلدة جديدة ويوجد 1000 حاوية تغطي كافة أنحاء البلدة بنسبة 98%.

تعاني البلدة من تراكم كميات كبيرة من النفايات في السوق التجاري بسبب الحركة الكبيرة للمواطنين وتراكم الكرتون والبلاستيك بكميات كبيرة والتي بحاجة إلى فصل وإعادة تدوير، بالإضافة إلى التكلفة العالية لجمع النفايات وترحيلها إلى مكب زهرة الفنجان في ظل شح الأيدي العاملة وارتفاع أجور العمال.

المؤثرات الإيجابية	• وجود سيارتين جديدتين لجمع النفايات. • يتم جمع النفايات مرتين أسبوعيا وبانتظام. • اغلب حاويات البلدة جديدة.
المؤثرات السلبية	• التكلفة العالية لخدمة جمع النفايات. • قلة توفر الأيدي العاملة. • ارتفاع تكاليف نقل النفايات إلى مكب زهرة الفنجان. • وجود كميات كبيرة من مخلفات السوق التجاري من الكرتون والبلاستك. • ارتفاع أجور عمال النظافة. • تكلفة التشغيل المرتفعة لمحطة نقل وترحيل النفايات.

ثانيا: مجال تنمية الاقتصاد المحلي

يشمل المجال الاقتصادي في بلدة برطعه كل من العمالة والتوظيف، وقطاع الزراعة، وقطاع الترفيه والسياحة، والتجارة والصناعة والخدمات المساندة. تم تشخيص وتحليل الوضع الحالي لهذه القطاعات من خلال اجتماعات اللجان القطاعية المتخصصة، وبالاعتماد على المؤشرات الرقمية والوصفية المختلفة في كل منهما، على النحو التالي:

2.1 العمالة والتوظيف

يمكن الإشارة إلى أن وجود السوق التجاري في البلدة وموقعها على الخط الأخضر قلل نسبيا من معدلات البطالة في البلدة إلا أنه يوجد عدد لا بأس به من العمال العاطلين عن العمل، وكذلك فانه يلاحظ قلة التوجه إلى المشاريع التي تشغل أيدي عاملة بشكل كبير في البلدة والاعتماد على المحلات التجارية دون إنشاء مشاريع اقتصادية مختلفة.

في ظل اعتماد السكان بشكل كبير على التجارة والعمل في الداخل الفلسطيني، أصبح هناك نقص كبير في الأيدي العاملة وبالتالي ارتفاع أجور العمال، وانخفاض نسبة التعليم الجامعي في التخصصات العلمية وقلة التوجه نحو التدريب المهني ونقص كبير في المشاريع الصغيرة والزراعة.

وبالتالي فإن البلدة بحاجة كبيرة لتوعية المواطنين حول أهمية التعليم الجامعي والتدريب المهني وإنشاء مركز تدريب مهني لتشجيع المواطنين للعمل المهني والتجارة الإلكترونية والاهتمام بالتعليم.

المؤثرات الإيجابية	• وجود سوق تجاري كبير يستوعب أيدي عاملة. • سهولة الوصول إلى الداخل الفلسطيني للعمل.
المؤثرات السلبية	• ارتفاع أسعار الأيدي العاملة. • ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. • قلة حملة الشهادات الجامعية في التخصصات العلمية. • محدودية المشاريع الصغيرة. • لا يوجد مقومات زراعية من أراضي زراعية ومياه.


2.2 الزراعة


المجال الزراعي من المجالات الأسوأ في البلدة إذ أنه لا يتم زراعة أية محاصيل زراعية سوى أشجار الزيتون وكذلك فان طبيعة الأراضي الجبلية الصخرية بالبلدة لا تسمح بتطوير هذا القطاع، أما قطاع الثروة الحيوانية فهو جيد نسبيا ويوجد بعض المزارع لتربية الدجاج البياض واللاحم ومزارع الأغنام والأبقار.

من المقومات المهمة في البلدة هو وجود الطرق الزراعية التي تصل إلى أغلب المناطق وتوفر الأراضي الزراعية القابلة للاستصلاح بالإضافة إلى توفر رأس المال وبالتالي فإن الزراعة متاحة ولكن يجب توعية المواطنين بأهمية الزراعة والاعتماد على الإنتاج المحلي للمنتجات.

هناك العديد من المعوقات التي تبعد السكان عن العمل في الزراعة أهمها صعوبة تضاريس البلدة وترتبها الغير زراعية وارتفاع أسعار المياه ومحدوديتها بالإضافة إلى قلة الخبرات الزراعية في البلدة وتدني مستوى الوعي بأهمية الزراعة بسبب عدم وجود الجمعيات والتعاونيات الزراعية.

المؤثرات الإيجابية	• وجود طرق زراعية تصل اغلب المناطق. • وجود أراضي زراعية قابلة للاستصلاح. • سهولة الوصول إلى الأراضي الزراعية.
المؤثرات السلبية	• تضاريس البلدة الوعرة وطبيعة تربتها الغير قابلة للزراعة. • ارتفاع أسعار المياه ومحدوديتها. • ضعف الوعي بأهمية الزراعة والخبرات الزراعية. • تدني مستوى الزراعة بالبلدة. • عدم توفر الخبرة الزراعية والوعي بأهمية الزراعة لدى المواطنين. • صعوبة التصرف بمخلفات الثروة الحيوانية خلف جدار الفصل العنصري. • وجود خنازير برية مما يؤثر سلبًا على المزروعات. • عدم وجود جمعيات وتعاونيات زراعية.

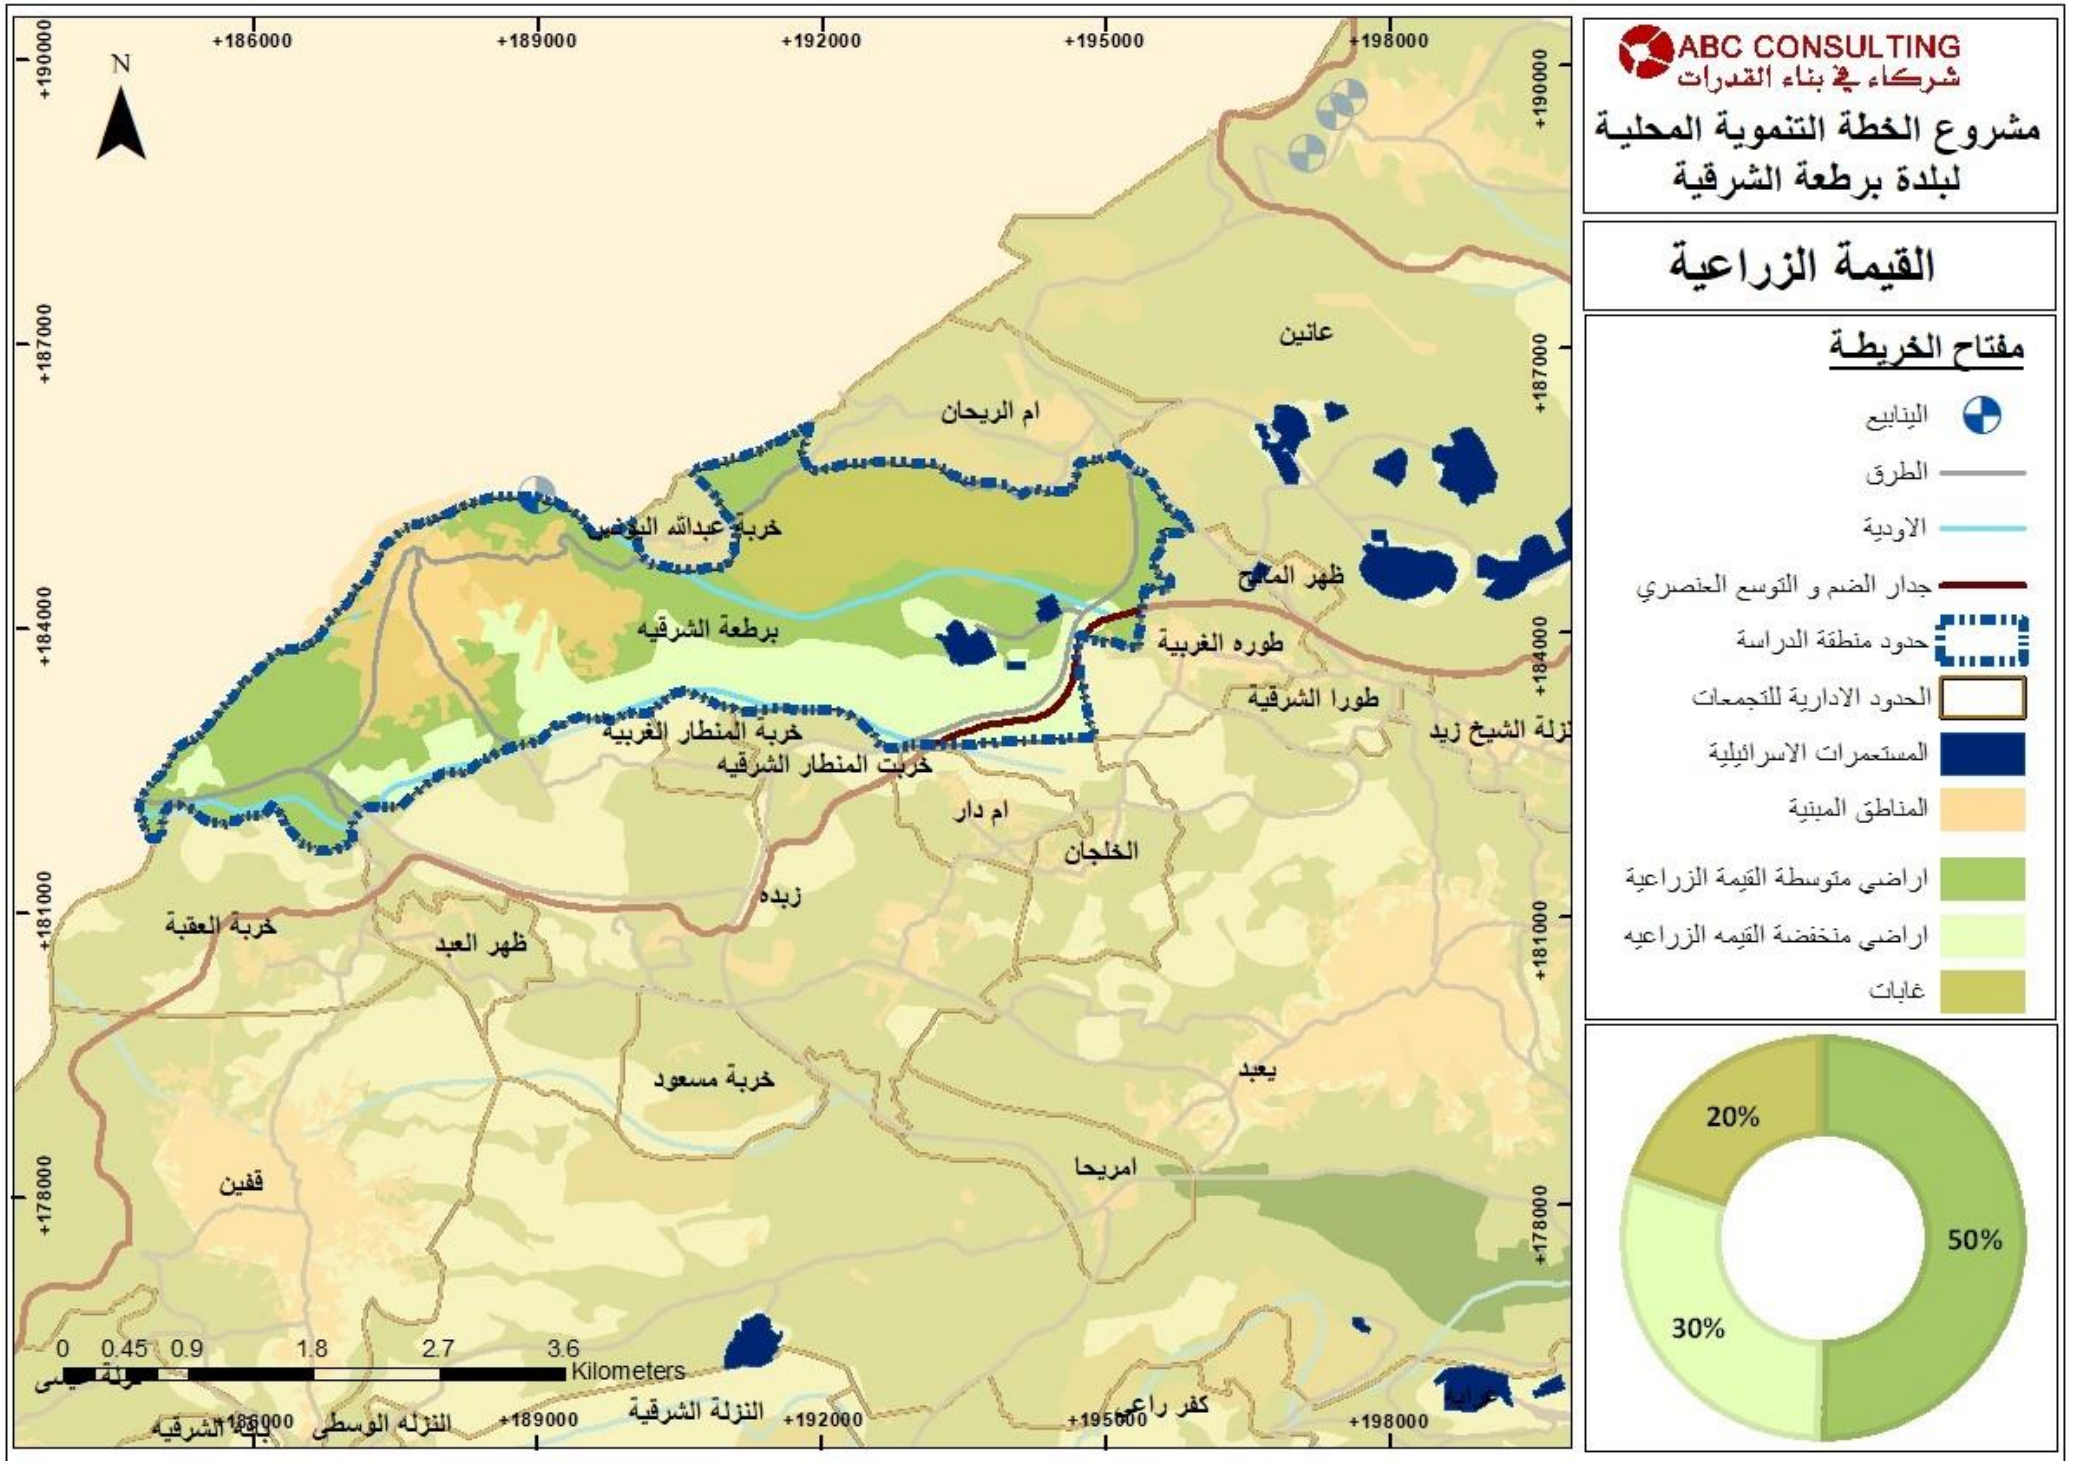
ABC CONSULTING
شركاء في بناء القدرات
مشروع الخطة التنموية المحلية
لبلدة برطعة الشرقية
القيمة الزراعية
مفتاح الخريطة
الينابيع
الطرق
الاودية
جدار الضم و التوسع العنصري
حدود منطقة الدراسة
الحدود الادارية للتجمعات
المستعمرات الاسرائيلية
المناطق المبنية
اراضي متوسطة القيمة الزراعية
اراضي منخفضة القيمه الزراعيه
غابات
20%
50%
30%
N
+186000
+189000
+192000
+195000
+198000
+190000
+187000
+184000
+181000
+178000
عانين
ام الريحان
خربة عبدالله البوعلي
برطعة الشرقيه
ظهر المعلق
طوره الغربية
طورا الشرقية
نزلة الشيخ زيد
خربة المنطار الغربية
خربت المنطار الشرقيه
ام دار
الخلجان
زبده
خربة العقبة
ظهر العبد
خربة مسعود
يعبد
امريحا
قفين
كفر راعي
النزلة الشرقية
النزله الوسطى
0 0.45 0.9 1.8 2.7 3.6
Kilometers

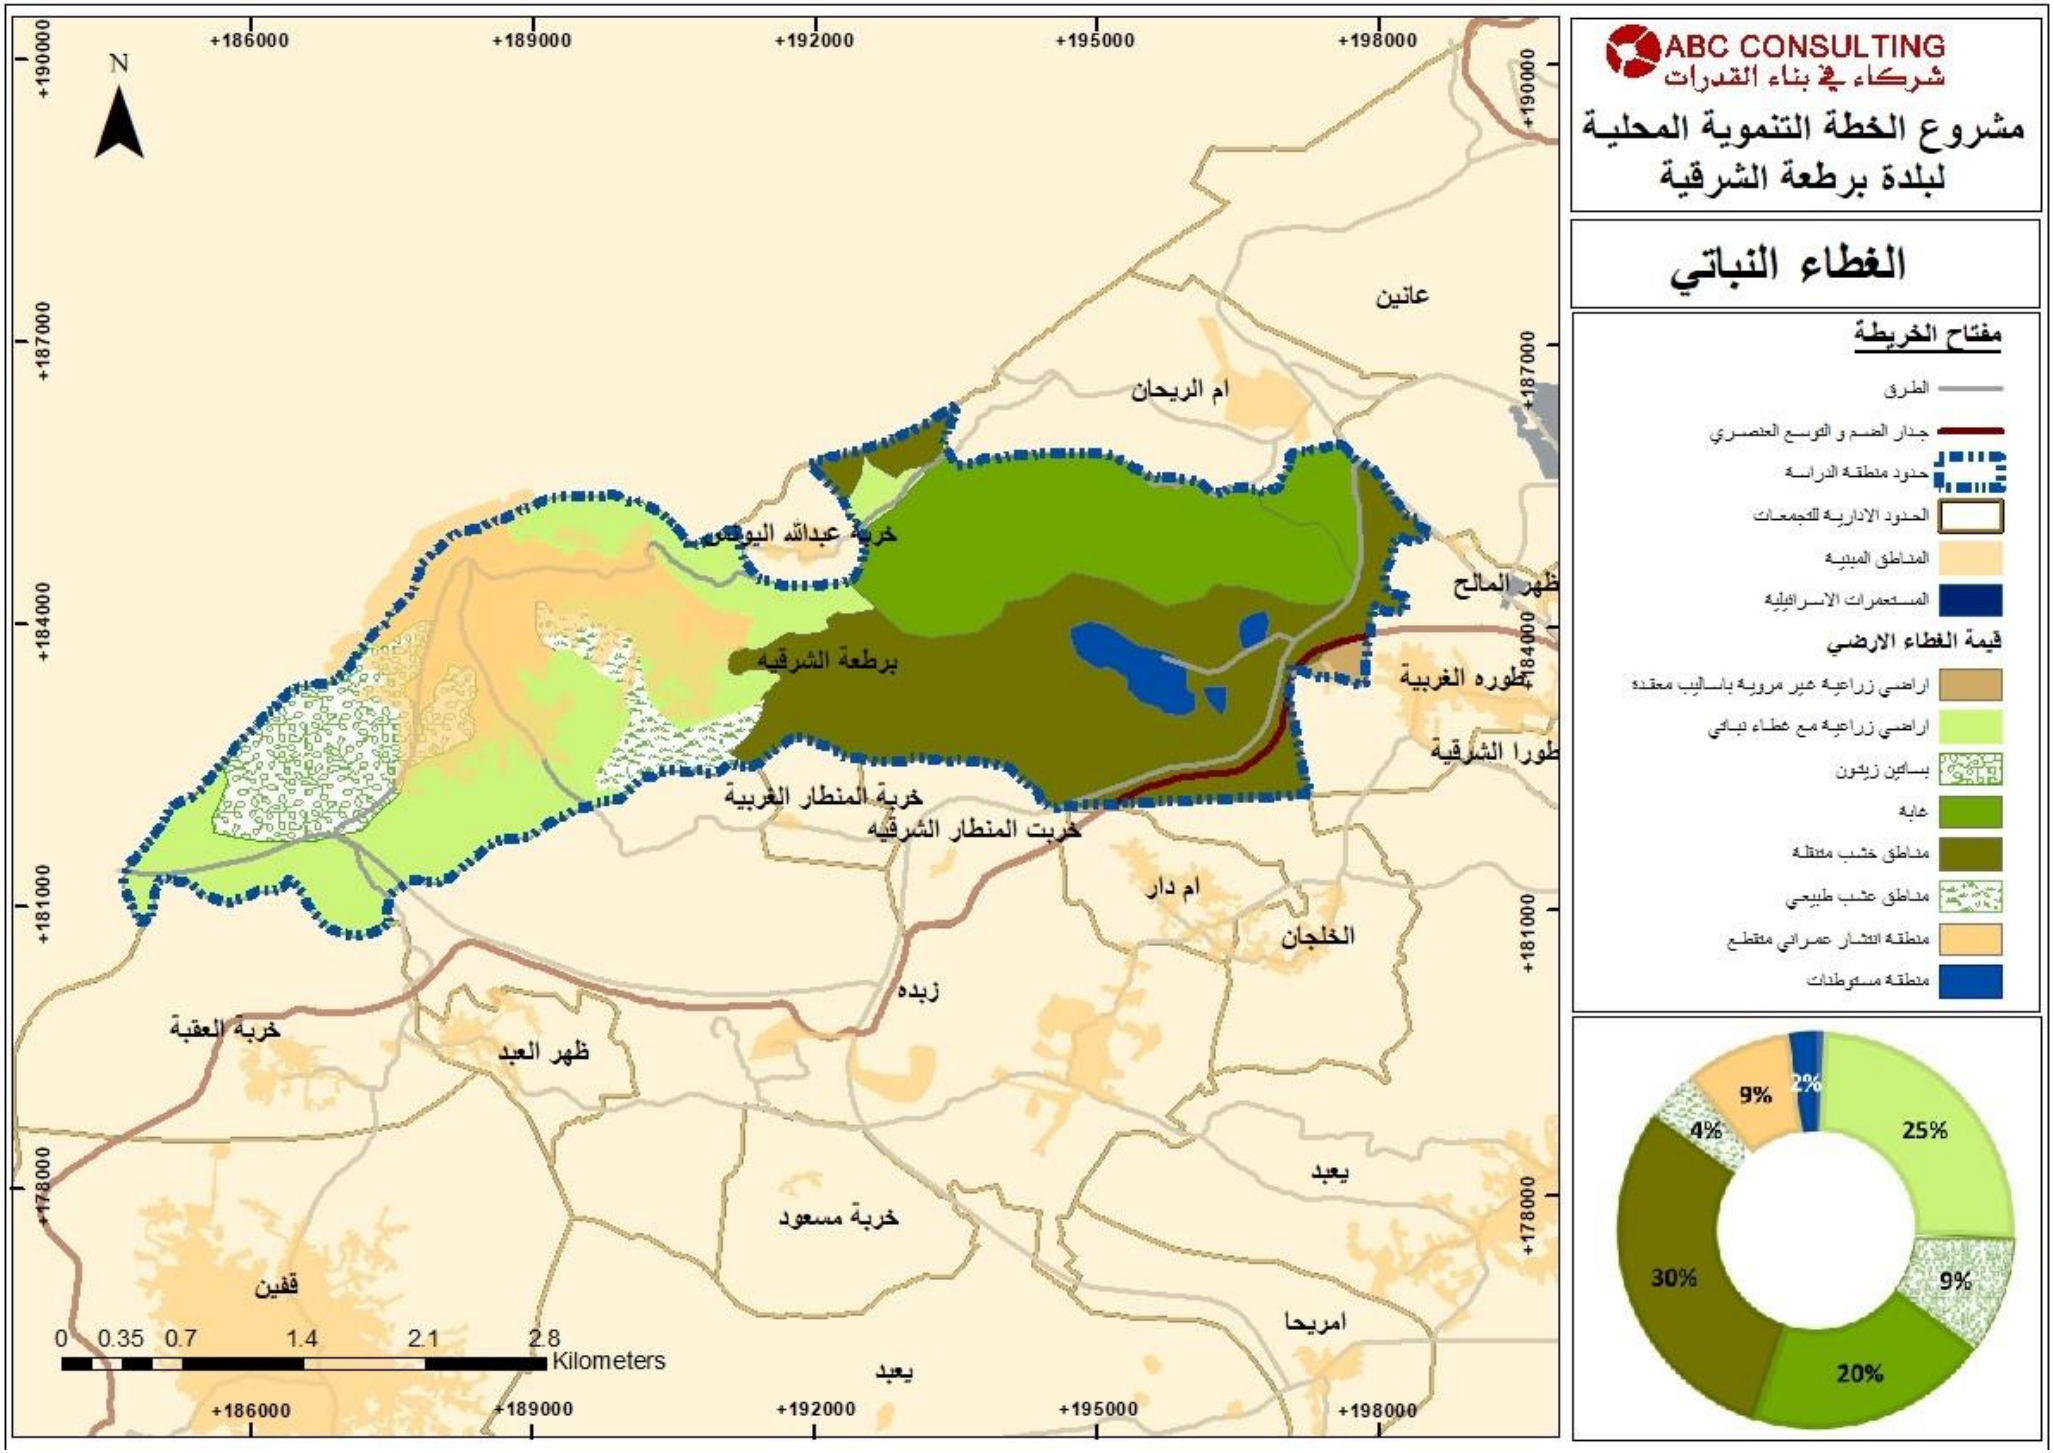
ABC CONSULTING
شركاء في بناء القدرات
مشروع الخطة التنموية المحلية
لبلدة برطعة الشرقية
الغطاء النباتي
مفتاح الخريطة
الطرق
جدار الضم و التوسع العنصري
حدود منطقة الدراسة
الحدود الادارية للتجمعات
المناطق المبنية
المستعمرات الاسرائيلية
قيمة الغطاء الارضي
اراضي زراعية غير مروية بأساليب معقدة
اراضي زراعية مع غطاء نباتي
بساتين زيتون
غابة
مناطق خشب متقلة
مناطق خشب طبيعي
منطقة انتشار عمراني متقطع
منطقة مستوطنات
25%
9%
30%
20%
4%
9%
2%
N
+186000
+189000
+192000
+195000
+198000
+190000
+187000
+184000
+181000
+178000
عانين
ام الريحان
خربة عبدالله اليونس
برطعة الشرقية
ظهر المالح
طوره الغربية
طورا الشرقية
خربة المنطار الغربية
خربت المنطار الشرقيه
ام دار
الخلجان
زبده
خربة العقبة
ظهر العبد
يعبد
خربة مسعود
قفين
امريحا
يعبد
0 0.35 0.7 1.4 2.1 2.8
Kilometers

2.3 الترفيه والسياحة

برطعه الشرقية تفتقر إلى الأماكن الترفيهية والمواطنين يخرجون إلى المناطق المجاورة للترفيه، وفي عام 2010 تم الشروع بتحويل منطقه جبلية إلى منتزه وما زال هذا المنتزه في طور التحديث والتطوير، حيث أصبح هذا المنتزه متنفس للمواطنين يقضون فيه أوقات جميله مع عائلاتهم وأطفالهم، إذ يتوفر فيه الألعاب الصغيرة ومقهى وجلسات هادئة إلا انه ينقصه الكثير من الأساسيات وألعاب الملاهي.

لا يوجد في برطعه الشرقية أماكن سياحية تاريخية أو دينية أو أثرية أو مقاهي ترفيهية أو حدائق عامة كما لا يوجد مقاهي ترفيهية، ولكن يوجد في برطعه الشرقية نادي رياضي ترفيهي خاص بالشباب.

المؤثرات الإيجابية	• وجود منتزه كبير. • سهولة وصول المتنزهين من الداخل للبلدة. • توافر سوق تجاري. • توفر الأماكن البيئية الطبيعية. • الحركة التجارية النشطة. • وجود نادي رياضي.
المؤثرات السلبية	• وجود جدار الفصل العنصري الذي يفصل البلدة عن أراضي السلطة الفلسطينية. • عدم وجود الفنادق. • قلة الاستثمار والاهتمام في مجال السياحة والترفيه. • عدم تأهيل الأماكن البيئية في البلدة. • عدم ملائمة الأماكن الطبيعية لاستقبال السياح. • ضعف نشاطات النادي الرياضي.

2.4 التجارة والصناعة والخدمات المساندة

بالنظر للواقع الصناعي في البلدة، يلاحظ قلة عدد المنشآت الصناعية بالمقارنة مع حجم القطاع التجاري إذ انه لا يوجد أي مصانع تشغيلية مستمرة وتعمل على أكثر من مجال. أما بالنسبة للتجارة فإنه يوجد العديد من المحلات التجارية والمستوردين في البلدة ويشهد هذا المجال نموًا ملحوظًا وازدهارًا.

يعتمد الآن حوالي 40% من السكان في دخلهم على التجارة أما في العمل المباشر أو الخدمات المساندة أو الإيجارات، ويعمل في التجارة حوالي 400 عامل.

المؤثرات الإيجابية	• وجود السوق التجاري الكبير وتنوع محلاته. • سهولة وصول المتسوقين من الداخل الفلسطيني للبلدة. • توفر خدمات متعددة من البلدية للسوق التجاري. • نشاط الحركة التجارية. • توفر كافة احتياجات المتسوقين من المواد الشرائية.
المؤثرات السلبية	• عدم وجود كراجات لسيارات المتسوقين في البلدة. • ارتفاع أسعار المنتوجات في السوق في البلدة، وخاصة أسعار الخضروات والفواكه. • تداخل المحلات الصناعية مع التجارية مع الكراجات. • ضيق الشوارع والاعتداء على الأرصفة. • الازدحام المروري الشديد في وسط السوق. • ارتفاع أسعار الأراضي واستئجار العقارات. • ضعف التجارة الإلكترونية.

ثالثا: مجال التنمية الاجتماعية

يشـمل المجـال الاجتمـاعي في برطعـه الشـرقية قطـاع الخـدمات الاجتماعيـة، وقطاعـات التعلـيم، والصحة والحماية الاجتماعية والتمكين، وقطاعات الثقافة والتراث، والشباب والرياضة، والسكن. تم تشخيص وتحليل الوضع الحالي لهذه القطاعات من خلال اجتماعات اللجان القطاعية المتخصصة، وبالاعتماد على المؤشرات الرقمية والوصفية المختلفة في كل منها، يمكن تقييم هذه القطاعات على النحو التالي:

3.1 الخدمات الاجتماعية

تعاني بلدة برطعه من غلاء الأسعار بشكل كبير، وبالتالي قلة القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل، وعدم الاهتمام بكبار السن والأيتام وعدم وجود مراكز خاصة لهم، بالإضافة إلى ضعف التواصل بين المحتاجين والجهات الاجتماعية التي تدعم تلك الفئات. حيث تحتاج البلدة إلى إنشاء مراكز لكفالة الأيتام والمحتاجين وتقديم الخدمات المتنوعة لكبار السن والمتقاعدين بالإضافة إلى دور الرعاية الصحية للمحتاجين.

المؤثرات الإيجابية	• تحسن الوضع المعيشي للأسر في داخل البلدة. • توفر فرص العمل وزيادة دخل الأفراد.
المؤثرات السلبية	• غلاء الأسعار بشكل كبير. • عدم الاهتمام بكبار السن والمتقاعدين. • ضعف القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل. • عدم وجود مراكز للأيتام وكبار السن. • ضعف التواصل بين الجهات الاجتماعية والمحتاجين، حيث أن 60% من المحتاجين لا يصلهم الدعم اللازم.

3.2 التعليم

تحتوي بلدة برطعه على خمس مدارس، منها مدرستان للإناث ومدرستان للذكور وأخرى مختلطة موزعة في البلدة ومنطقة الخربة، وهي جميعها بحالة جيدة جدًا سوى مدرسة البنات الثانوية، حيث تم التركيز في السنوات السابقة على قطاع التعليم وبناء وتأهيل المدارس كما ويوجد نقص بالصفوف في مدرسة البنات الأساسية والثانوية وتم افتتاح روضة نموذجية في البلدة تحت رعاية جمعية برطعه التعاونية.

المؤثرات الإيجابية	• دعم البلدية والجمعية والمجتمع المحلي للمدارس.
المؤثرات السلبية	• نقص عدد الغرف الصفية في بعض المدارس. • عدم ملائمة الوحدات الصحية في ببعض المدارس. • قلة مرافق بعض المدارس، مثل: الساحات والمرافق الصحية. • اكتظاظ الطالبات في مدرسة البنات الثانوية وقلة المرافق وسوء الوحدة الصحية. • عدم ممارسة الأنشطة المدرسية بالشكل الصحيح. • تراجع التحصيل التعليمي وزيادة نسبة التسرب. • عدم توفر الحدائق المدرسية والمرافق في بعض المدارس. • عدم توفر التعليم المهني. • زيادة تسرب الطلاب من المدارس.

3.3 الصحة

تم افتتاح مركز طبي خاص في البلدة تديره بلدية برطعه وذلك بسب النقص الكبير في إعداد الأطباء المقيمين في البلدة وضعف الخدمات المقدمة من قبل الوحدة الصحية الحكومية إلا أن هذا المركز يفتقر لوجود الكثير من اللوازم والأطباء من اجل تقديم الإسعافات الطارئة على مدار 24 ساعة.

وتقوم بلدية برطعه حاليا ببناء وتشطيب بناء جديد موسع للوحدة الصحية الحكومية بحيث يشمل على تخصصات أكثر ويقدم خدمات أفضل للمواطنين كما وتم افتتاح العديد من العيادات والمراكز الطبية الخاصة في البلدة مؤخرًا.

المؤثرات الإيجابية	• إنشاء مركز طبي من قبل البلدية ورعايته ودعمه. • بناء مبنى جديد للعيادة.
المؤثرات السلبية	• عدم توفر أطباء متخصصين. • عدم وجود مركز طوارئ يقدم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية على مدار الساعة. • نقص التخصصات الطبية والأطباء بالمراكز الطبية والعيادات بالبلدة. • عدم وجود غرفة ولادة بالبلدة. • عدم وجود سيارة إسعاف.

3.4 الحماية الاجتماعية والتمكين

تعاني البلدة من تأثر الكثير من القطاعات وخاصة بعد إقامة الجدار العازل من قبل الاحتلال والذي كان له أثر سلبي على واقع قطاع الشباب، إذ انه لا يوجد أي مكان من اجل تفريغ طاقات فئات الشباب وتنمية مواهبهم المتعددة.

في ظل محاصرة البلدة في الجدار فان هذا المجال من أكثر المجالات تأثرا إذ انه لا يوجد أي مكان من اجل تفريغ طاقات الشباب وتنمية مواهبهم المتعددة وكذلك بالنسبة للمرأة فان حالها ليس بأفضل من الشباب بعدم وجود أي مركز نسوي يجمع النساء لتوعيتهم والقيام بالأنشطة المختلفة، وتحتاج إلى تمكين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بسبب الغياب الملحوظ لمشاركة المرأة بالمجتمع وعدم تواجد مراكز نسوية وجمعيات تعتني بشؤون المرأة مما أضعف وجودها ودورها الفاعل وقلل من وعيها.

المؤثرات الإيجابية	• يوجد حركة تجارية جيدة. • مكانة المرأة العالية في البلدة والحفاظ عليها.

المؤثرات السلبية	• قلة الوعي بأهمية دور المرأة المجتمعي. • عدم وجود مراكز نسوية. • نقص كبير في المراكز المجتمعية الشبابية لتفريغ طاقات الشباب والمواطنين من كلا الجنسين.

3.5 الثقافة والتراث

يوجد في البلدة مركز ثقافي تراثي غير فعال وبحاجة إلى تفعيل وتطوير وتوعية للمواطنين بتاريخ وتراث البلدة، بالإضافة إلى قلة وجود المؤسسات الداعمة للثقافة والتراث بسبب الوضع الاقتصادي واهتمام المواطنين بالأعمال التجارية، كما أن البلدة بحاجة إلى ترميم وتأهيل المواقع التراثية والثقافية.

المؤثرات الإيجابية	• وجود مركز ثقافي تراثي.
المؤثرات السلبية	• عدم الاهتمام الكبير بالثقافة والتراث. • قلة وجود المؤسسات الداعمة لهذا المجال بظل محاصرة البلدة بسبب الوضع الاقتصادي.

3.6 الشباب والرياضة


تشكل الشباب والأطفال في البلدة نسبة كبيرة جدا ما نسبته 64% من السكان في البلدة، وبهذا فإن تلك الفئات بحاجة إلى مراكز شبابية ورياضية داعمة لهم، يشهد هذا المجال في البلدة ضعف عام إذ انه لا يوجد سوى نادي شبابي واحد وهو نادي برطعه الرياضي ويفتقر إلى الكثير من المقومات والإمكانيات لتشغيل المجمع الرياضي وتنشيط الرياضة في البلدة.

المؤثرات الإيجابية	• وجود المرافق الرياضية. • توفر الدعم المجتمعي لتلك الأنشطة.
المؤثرات السلبية	• عدم وجود مدربين أكفاء. • عدم وجود ملعب مغطى لاستخدامه في الشتاء. • قلة فعالية دور النادي الرياضي وأنشطته.

3.7 السكن

تعاني بلدة برطعه من ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء بالإضافة إلى عدم توفر أراضي للبناء بسبب الكثافة السكانية وقلة مساحة المخطط الهيكلي المتاحة وإحاطة البلدة بأراضي (C) التي تمنع المواطنين من البناء عليها والتوسع، كما أن عدم وجود مشاريع إسكان شكل مشكلة أمام الشباب بسبب عدم قدرتهم على البناء أو إيجاد بيوت للسكن.

المؤثرات الإيجابية	• اغلب المباني بوضع جيد جدًا.
المؤثرات السلبية	• ارتفاع تكاليف البناء. • ارتفاع أسعار الأرض. • عدم قدرة كل الشباب على البناء. • عدم توفر الأراضي للبناء. • عدم وجود مشاريع الإسكان. • عدم الالتزام بالتراخيص والمواصفات.

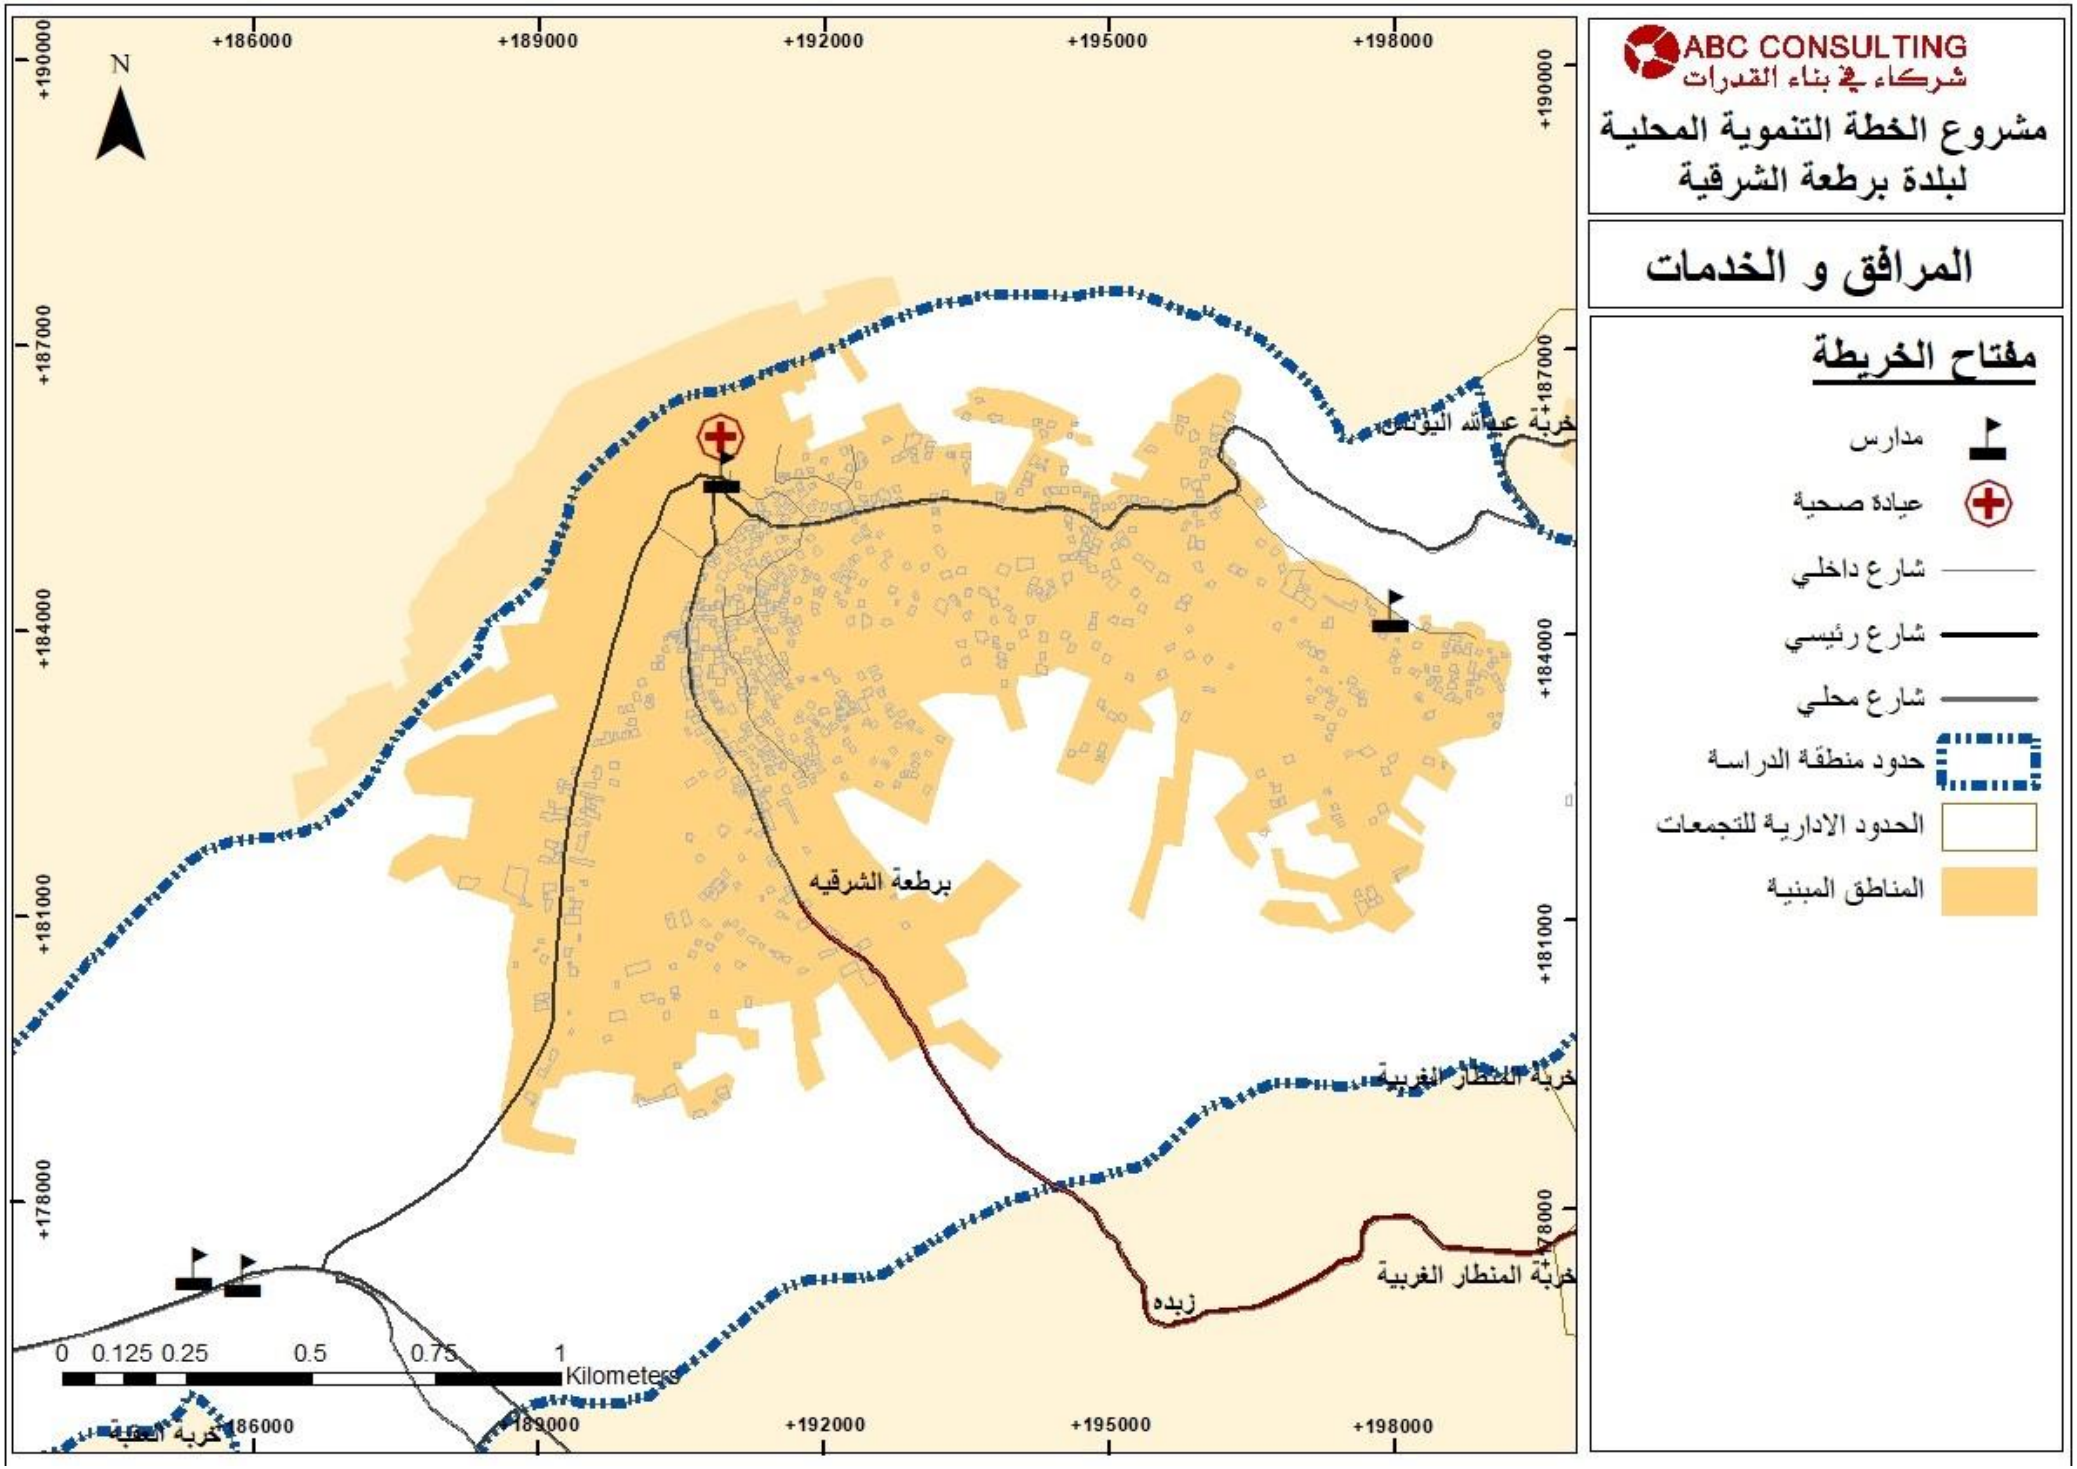
ABC CONSULTING
شركاء في بناء القدرات
مشروع الخطة التنموية المحلية
لبلدة برطعة الشرقية
المرافق و الخدمات
مفتاح الخريطة
مدارس
عيادة صحية
شارع داخلي
شارع رئيسي
شارع محلي
حدود منطقة الدراسة
الحدود الادارية للتجمعات
المناطق المبنية
N
+186000
+189000
+192000
+195000
+198000
+190000
+187000
+184000
+181000
+178000
برطعة الشرقيه
خربة عبدالله اليوناس
خربة المنطار الغربية
زبده
خربة العقبة
0 0.125 0.25 0.5 0.75 1
Kilometers

رابعا: مجال الإدارة والحكم الرشيد


يشمل مجال الإدارة والحكم الرشيد في بلدة برطعه الشرقية قطاعات التخطيط والتنظيم، والأمن وإدارة الكوارث، وإدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة المحلية. تم تشخيص وتحليل الوضع الحالي لهذه القطاعات من خلال اجتماعات اللجان القطاعية المتخصصة، وبالاعتماد على المؤشرات الرقمية والوصفية المختلفة في كل منها، يمكن تقييم هذه القطاعات على النحو التالي:

4.1: مجال التخطيط والتنظيم

تبلغ مساحة المخطط الهيكلي في برطعه 432 دونم مصادق منذ عام 1994 ويعتبر مكانيا ضيق جدا ولا يتناسب مع تعداد السكان وتلبية احتياجاتهم المختلفة، هذا وبالإضافة إلى أن البلدة ومنذ العام 2002 ازدهرت الحركة التجارية فيها نتيجة الظرف السياسي التي مرت به فباتت مقصدًا للتجارة والعاملين والمتسوقين من أراضي فلسطين 48، وبما أن السوق التجاري وليد اللحظة ولم يسبق أن تمت الدراسات اللازمة أو تم عملية التخطيط للحيز المكاني للسوق مما أدى إلى ظهور العشوائية وظهور الأبنية ذات اسقف الصفيح، ولم يتم إعداد دراسة للطرق ولا مدى اتساعها لذا قامة البلدية بطلب من الجهات المختصة لتوسعة هيكلية البلدة.

أما بالنسبة لما هو متاح للأهالي من اجل البناء والتوسعة فهو فقط في الجهة الشرقية والجنوبية من البلدة والتي تقع بكاملها ضمن منطقة C التي تخضع للتنظيم الإسرائيلي، وتبلغ مساحة البلدة الكلية 11000 دونم وهذا يعني أن أكثر من 90% من أراضي البلدة تقع خارج المخطط الهيكلي المصدق وتعمل البلدية على تقديم المخطط الهيكلي الجديد الذي من خلاله تسعى البلدية على تنظيم الطرق وتخصيص المساحات.

المؤثرات الإيجابية	• المحافظة على الطرقات والارتدادات في الأحياء الجديدة. • تجهيز وتوفير المناطق الخضراء في البلدة.
المؤثرات السلبية	• عدم توسعة المخطط الهيكلي. • عدم تفعيل ترخيص الأبنية. • الاعتداء على الشوارع في البلد. • البناء العمراني العشوائي. • عدم القدرة على البناء في مناطق (C).

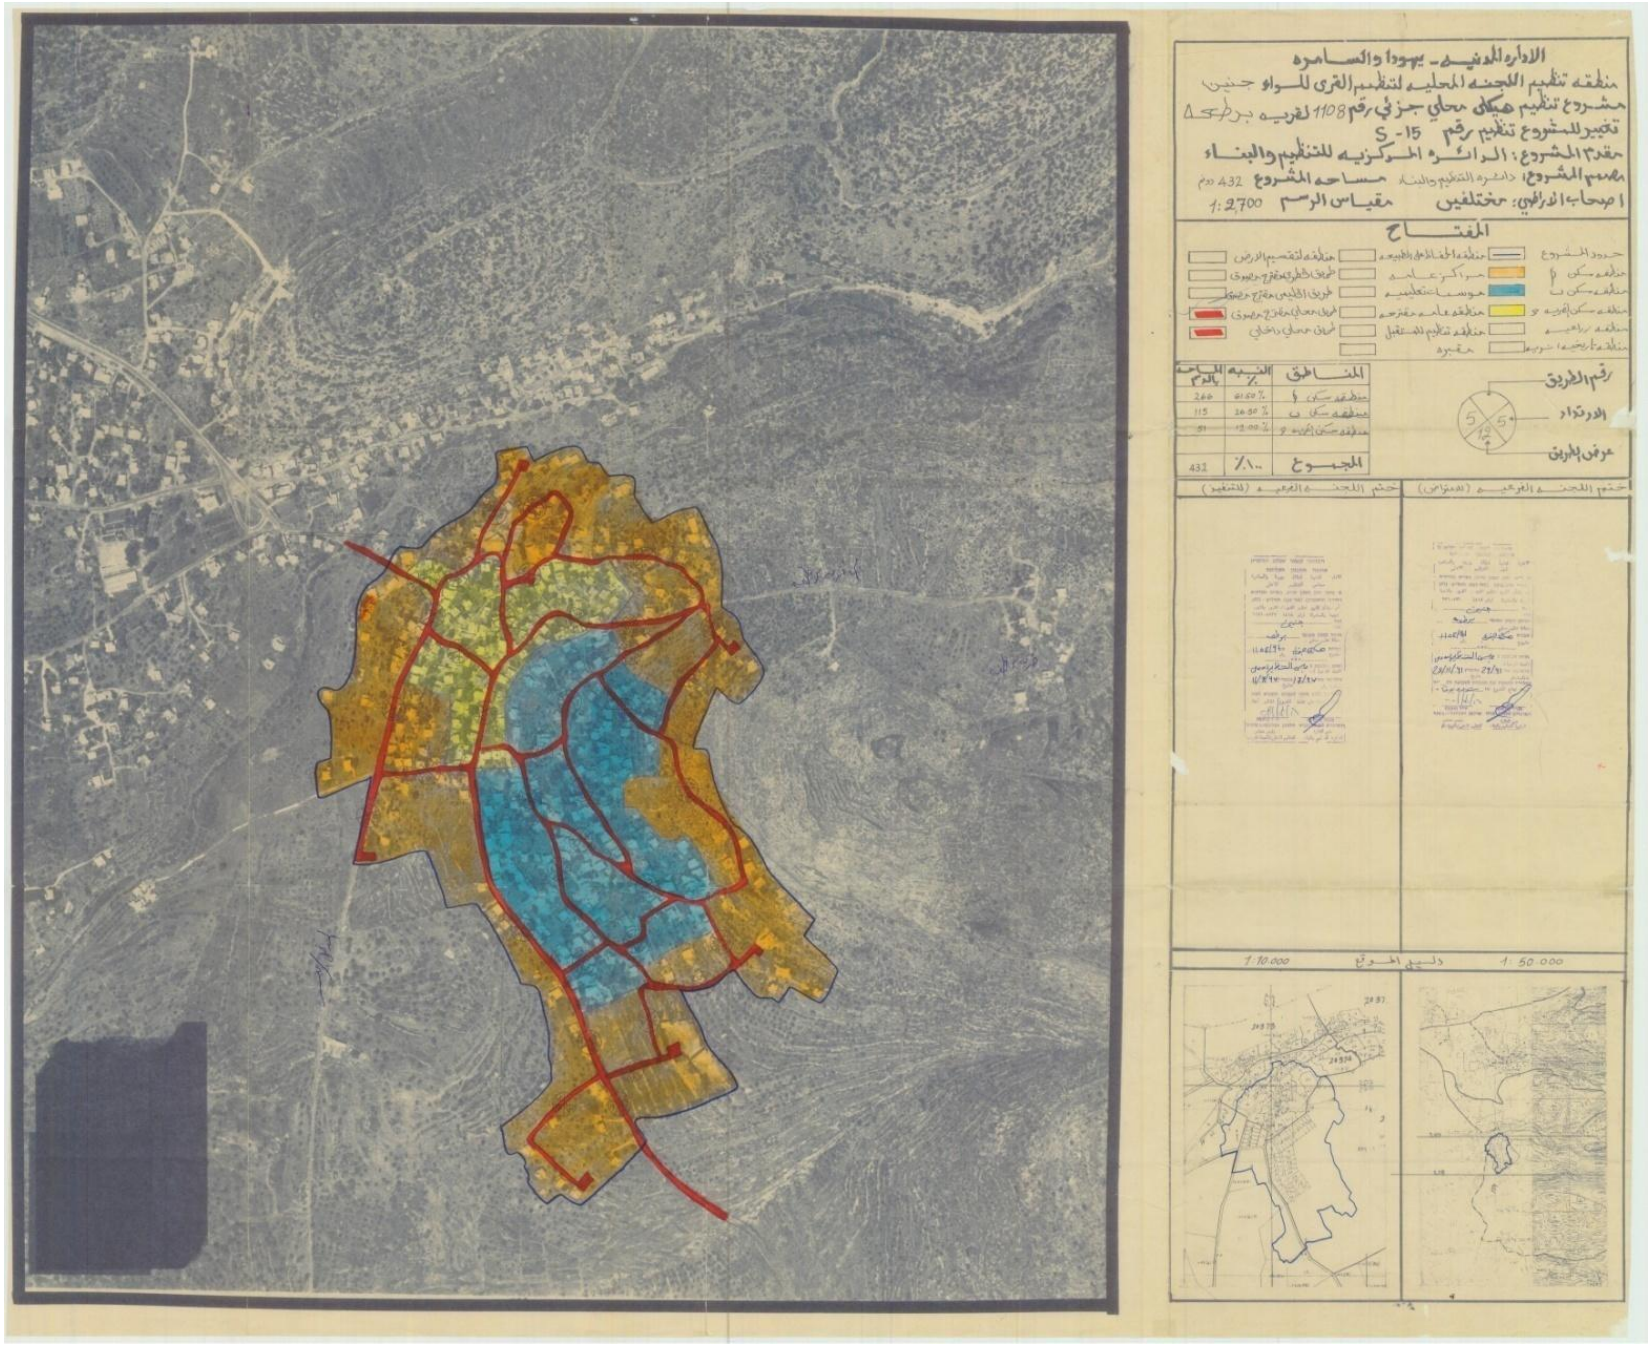
الادارة المدنية - يهودا والسامرة
منطقه تنظيم اللجنه المحليه لتنظيم القرى للواء جنين
مشروع تنظيم هيكلي محلي جزئي رقم 1108 لقريه برطعه
تغيير للمشروع تنظيم رقم S-15
مقدم المشروع: الدائره المركزيه للتنظيم والبناء
مصمم المشروع: دائره التنظيم والبناء
مساحه المشروع 432 دونم
اصحاب الاراضي: مختلفين
مقياس الرسم 1:2,700
المفتاح
المناطق
النسبه %
المساحه بالدونم
المجموع
رقم الطريق
الاتجاه
عرض الطريق
حتم اللجنه المحليه (الاعتراض)
حتم اللجنه المحليه (للتنفيذ)
دليل الخوتم
1:10,000
1:50,000

4.2 مجال الأمن وإدارة الكوارث

يوجد مركز للدفاع المدني في بناء استئجار مكون من خمسة أفراد متفرغين وهناك أربع آليات في المركز وهي سيارتين إطفائية وسيارة تزويد وسيارة إنقاذ، ويدعم المركز فريق من المتطوعين عند الحاجة، وهذا المركز يقدم خدمات لجميع التجمعات السكانية التي تقع داخل الجدار.

المؤثرات الإيجابية	• السلم الأهلي في البلدة. • وجود مركز للدفاع المدني. • وجود المتطوعين من أهالي البلدة لمساعدة فريق الدفاع المدني. • السيطرة على اغلب الحوادث.
المؤثرات السلبية	• قلة الإمكانيات والموارد المادية في مركز الدفاع المدني. • عدم وجود سيارة إسعاف وطوارئ.

4.3 إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة المحلية

تأسست بلدية برطعه الشرقية كمجلس قروي في العام 1996 ثم تطورت لتصبح بلدية في العام 2016 حيث يضم المجلس البلدي 11 عضواً وتعتبر من الفئة (C) حسب تصنيف وزارة الحكم المحلي.

النشاط المؤسسي في بلدة برطعه الشرقية جيد جدا ويحتاج بعض التدريب والعمل من اجل رفع مستواه وزرع المفاهيم الإدارية الحديثة في العمل المؤسسي حتى نبني لبنة أساسية قوية للعمل المؤسساتي يكتب له الاستمرار والتطوير ومواكبة الحديث في كافة الأصعدة.

يبلغ عدد السكان المخدومين في برطعه الشرقية حوالي 5264 مواطن يتم خدمتهم من خلال 20 موظفا وتقوم البلدية بتوفير خدمة النفايات الصلبة ورخص الحرف والصناعات، وخدمة الصرف الصحي، والجباية للخدمات وتنظيم السوق التجاري وخدمات البنية التحتية.

المؤثرات الإيجابية	• سهولة الوصول إلى مقر البلدية. • سهولة تلقي الخدمات. • تعدد الخدمات التي تقدمها البلدية. • دعم مؤسسات المجتمع المحلي. • متابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين.
المؤثرات السلبية	• التطور الكبير والتوسع في البلدة. • معيقات الاحتلال المتعددة. • قلة الموارد المالية. • عدم ملائمة المبنى الموجود. • عدم وجود مركز خدمات جمهور. • عدم القدرة على تقديم الخدمات بشكل كامل. • ضعف الصلاحيات على ارض الواقع. • الحاجة إلى الكثير من المشاريع التطويرية.

الإطار التنموي المحلي

- الرؤية التنموية
- مصفوفة الأهداف والبرامج/المشاريع
- البرامج ومكوناتها/المشاريع التنموية

05

5. الإطار التنموي المحلي

الرؤية التنموية

برطعه بلدة صامدة أمنة بيئياً مزدهرة تجارياً واجتماعياً

مصفوفة الأهداف والبرامج / المشاريع

المجالات التنموية	القضايا التنموية ذات الأولوية	الأهداف التنموية	المشاريع
مجال البيئة والبنى التحتية	ضعف البنية التحتية للطرق والمواصلات وتصريف مياه الأمطار	تطوير البنية التحتية للطرق	• إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية بطول 8 كم • تطبيق خطة مرورية بالسوق التجاري • بناء أرصفة وجدران إستنادية 2 كم
		تأهيل الطرق الداخلية وتوسعتها	• شق وتأهيل طرق زراعية بطول 7 كم • إضافة لوحات إرشادية وتزيين الشوارع
		تطوير نظام تصريف مياه الأمطار في شوارع البلدة.	• إنشاء شبكات تصريف مياه أمطار بطول 2 كم
	ارتفاع نسبة التلوث وصعوبة التخلص من مخلفات السوق التجاري والنفايات	تطوير المناطق الخضراء والمناطق الطبيعية والبيئية	• تأهيل وتطوير منطقة نبع العين • تأهيل وتطوير الحدائق والمناطق الخضراء • إعادة تأهيل وتطوير محطة ترحيل النفايات
		توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين	• فصل النفايات وإعادة التدوير
		تحسين نظام جمع النفايات وإعادة تدويرها	• توريد حاويات نفايات
	عدم شمولية شبكة الصرف الصحي لكافة أحياء البلدة وتلوث المياه الجوفية نتيجة الحفر الامتصاصية	توسيع شبكة الصرف الصحي لتشمل كافة مناطق البلدة	• تمديد خطوط صرف صحي ووصلات منزلية بأطوال 7 كم • تأهيل شبكة الصرف الصحي بطول 2 كم
		الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث نتيجة الحفر الامتصاصية	• توريد سيارة نضح وتسليك مجاري
مجال تنمية الاقتصادي المحلي	قلة الاهتمام بالأماكن السياحة البيئية والطبيعية في البلدة	تطوير الاهتمام بالأماكن السياحية والبيئية والطبيعية	• تأهيل وتطوير منطقة العين • تأهيل مسار بيئي سياحي • إنشاء حدائق عامة
		تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في البلدة	• تشجيع السياحة الداخلية والتعريف بالأماكن البيئية والترفيهية الموجودة بالبلدة.

المجالات التنموية	القضايا التنموية ذات الأولوية	الأهداف التنموية	المشاريع
		من خلال تشجيع السياحة الداخلية والبيئية للبلدة	• حملات إعلامية وتوعوية
	ضعف التنظيم للسوق التجاري وعشوائية المحال التجارية والصناعية	تنظيم السوق التجاري والتقليل من عشوائية المحال التجارية	• تطوير العناصر والخصائص البصرية والجمالية والبيئية للسوق التجاري. • تطوير نظام وخطة مرور لتنظيم السوق • تعيين مراقبين ومنظمين للسوق التجاري
		تطوير مناطق صناعات حرفية منفصلة عن السوق التجاري	• إنشاء منطقة صناعية وحرفية جديدة
مجال التنمية الاجتماعية	ضعف التجهيزات والإمكانيات والبنية التحتية للمراكز الصحية ومحدودية خدماتها.	تطوير وتحسين التجهيزات والإمكانيات الصحية لخدمات المراكز الصحية وتوفير الخدمات الطبية على مدار الساعة	• بناء مقر جديد للعيادة الصحية الحكومية • بناء طابق ثاني لمركز صحي بلدية برطعه • بناء جدران إستنادية للمركز الطبي • تجهيز المركز الطبي بغرفة طوارئ وأجهزة طبية ومركز أشعة
	ضعف البنية التحتية للتعليم وقلة المرافق المدرسية في مدارس البلدة	تطوير البنية التحتية للتعليم والمرافق المدرسية في مدارس البلدة وتوفير جو دراسي مناسب	• بناء مدرسة بنات ثانوية جديدة • تأهيل الوحدات الصحية في مدرسة البنات الثانوية ومدرسة الفاروق • تأهيل الساحات المدرسية والملاعب في مدرسة الفاروق والبنات الثانوية • تأهيل الحديقة المدرسية في مدرسة الذكور الأساسية والبنات الأساسية والفاروق • إضافة ثلاثة غرف صفية لكل من مدرسة الفاروق ومدرسة الذكور الأساسية • تأهيل وترميم بناية مدرسة الذكور الثانوية
	محدودية مشاركة النساء والشباب وضعف المرافق والأنشطة المجتمعية والرياضية وبرامج بناء القدرات	تطوير المرافق والأنشطة الرياضية والشبابية وبرامج بناء القدرات للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.	• توفير مقر لتنفيذ برامج تمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. • إضافة طابق ثاني للقاعة العامة كمقر مغلق للأنشطة الرياضية • تأهيل المجمع الشبابي الرياضي وتوسعته • تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. • تنفيذ برامج التدريب المهني للشباب

المجالات التنموية	القضايا التنموية ذات الأولوية	الأهداف التنموية	المشاريع
مجال الإدارة والحكم الرشيد	محدوديـــة المخطـــط الهيكلي وعشوائية تنظيم البناء في البلدة	توسيع المخطط الهيكلي ليشمل مناطق توسع مستقبلي	• توسعة المخطط الهيكلي ومصادقته
		تنظيم ومراقبة عشوائية البناء	• توفير سيارة حركة ومراقبة للجنة التنظيم • توفير الأجهزة المكتبية والأثاث للجنة التنظيم وأدوات القياس الحديثة
	ضعف القدرة على توفير كامـــــل الخـــــدمات للمـواطنين بسـبب قلـة الإمكانيـات وعـدم تـوفر مقر مناسب للبلدية.	تطوير إمكانيات البلدية وتوفير التجهيزات اللازمة لتوفير كامل الخدمات للمواطنين	• بناء مقر جديد مؤهل لبلدية برطعه • إنشاء مركز خدمات جمهور • توريد المعدات اللازمة لأعمال الأشغال والصيانة مثل مدحلة وجرافة وملحقات الجرافة الانزلاقية وتراكتور • توفير سيارة حركة للبلدية
	محدودية برامج المساءلة المجتمعية	تعزيـز مشـاركة المـواطنين في العمل البلدي	• وحدة المساءلة المجتمعية • تمكين المبادرات الشبابية في المساءلة المجتمعية في مجال البيئة والمياه والصرف الصحي • تشكيل لجنة الرقابة من لجان الأحياء وربطهم في وحدة المساءلة المجتمعية

البرامج ومكوناتها/المشاريع التنموية

البرنامج (1): برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية رقم البرنامج:INF

مقدمة:

يأتي برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية استجابة لاحتياجات البلدة الأساسية وأولوياتها فيما يتعلق بقطاع البنى التحتية بشكل رئيسي؛ والذي يساهم تطويره في تحسين الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدة لمواطنيها، الأمر الذي يوفر لهم حياة كريمة أفضل ويخلق لبلدتهم بنية تحتية قوية تدعم وتساهم في نهوض البلدة وتطورها. وتشمل الخدمات الأساسية التي يحسنها البرنامج خدمات شبكة الطرق والمواصلات، وشبكة الكهرباء والاتصالات، وخدمات الصحة العامة والحفاظ على البيئة، إضافة إلى أنظمة وشبكات المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة.

النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
أطوال الطرق الداخلية المؤهلة والمعبدة	15	22
أطوال الطرق الزراعية المفتوحة والمؤهلة	6	10
نسبة الشوارع التي تحتوي على شبكات تصريف مياه أمطار	0	5%
نسبة المناطق الخضراء المؤهلة	2%	4%
عدد محطات ترحيل النفايات المؤهلة	1	1
أطوال خطوط الصرف الصحي	18	23
نسبة المباني السكنية والشوارع التي تحتوي على شبكات صرف صحي مؤهلة	60%	90%
عدد محطات فرز النفايات	0	1
عدد حاويات النفايات	1000	1200
عدد سيارات النضح	0	1

مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

الفئات المستهدفة: سكان بلدة برطعة

مكونات البرنامج

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، فني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية بطول 7 كم	900,000	وزارة الحكم المحلي صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية	مالي,فني
بناء أرصفة وجدران استنادية 1 كم	100,000	وزارة الحكم المحلي	مالي,فني
شق وتأهيل طرق زراعية بطول 7كم	200,000	وزارة الزراعة	اداري,مالي,فني
إنشاء شبكات تصريف مياه أمطار بطول 2كم	350,000		
تأهيل وتطوير الحدائق والمناطق الخضراء	50,000	البلجيك	مالي
إعادة تأهيل وتطوير محطة ترحيل النفايات	20,000		
فصل النفايات وإعادة التدوير	50,000		
تمديد خطوط صرف صحي ووصلات منزلية بأطوال 5 كم	500,000	سلطة المياه الفلسطينية	مالي,فني
تأهيل شبكة الصرف الصحي بطول 2 كم	50,000		
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
إضافة لوحات إرشادية وتزيين الشوارع	20,000	القطاع الخاص	مالي
تطبيق خطة مرورية بالسوق التجاري	5,000	القطاع الخاص	اداري
توريد حاويات نفايات	15,000		
توريد سيارة نضح وتسليك مجاري	120,000	البلجيك	مالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
-			
التكلفة الاجمالية	**$2,380,000**		
المتوفر منها	**$700,000**		

البرنامج (2): تمكين الفئات المهمشة	رقم البرنامج: SO – 01

مقدمة:

تأتي مشاريع برنامج تمكين الفئات المهمشة لدعم وتحسين دور وحياة الفئات المهمشة كالمرأة وذوي الإعاقة والأطفال وهي الفئات الأكثر عرضة للتهميش من المجتمع، ويعمل البرنامج على تحسين وتمكين دور الفئات المختلفة للمجتمع عن طريق مشاريع تعمل على دعمهم وتوفير بنية تحتية تلبي احتياجاتهم.

النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد المدارس الثانوية	5	6
عدد المقرات/القاعات العامة	1	2
مساحة القاعة العامة	470 م2	940 م2
مساحة المجمع الشبابي الرياضي	4500 م2	4500 م2
عدد برامج التدريب المهني	0	1
عدد برامج التمكين الاقتصادي للنساء وذوي الإعاقة	1	2
عدد المبادرات الشبابية في مجال البيئة والمياه والصرف الصحي	0	1

مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

الفئات المستهدفة: سكان بلدة برطعة

مكونات البرنامج

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، فني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
بناء مدرسة بنات ثانوية جديدة	2,000,000	وزارة التربية والتعليم	فني,مالي
تأهيل الوحدات الصحية في مدرسة البنات الثانوية ومدرسة الفاروق	10,000		
تأهيل الساحات المدرسية والملاعب في مدرسة الفاروق والبنات الثانوية	20,000	المجتمع المحلي	مالي
تأهيل الحديقة المدرسية في مدرسة الذكور الاساسية والبنات الاساسية والفاروق	10,000		

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، فني)
إضافة ثلاثة غرف صفية لكل من مدرسة الفاروق ومدرسة الذكور الاساسية	150,000	وزارة التربية والتعليم	مالي
تأهيل وترميم بناية مدرسة الذكور الثانوية	20,000		
توفير مقر لتنفيذ برامج تمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.	300,000		
تأهيل المجمع الشبابي الرياضي	50,000	وزارة الشباب والرياضة	مالي,فني
إضافة طابق ثاني للقاعة العامة كمقر مغلق للأنشطة الرياضية	400,000	وزارة الحكم المحلي	مالي
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة	10,000		
تنفيذ برامج التدريب والتعليم المهني	20,000	وزارة العمل وزارة التربية والتعليم	فني,اداري
تمكين المبادرات الشبابية في المساءلة المجتمعية	5,000	المجتمع المحلي	اداري,فني
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
-			
التكلفة الإجمالية	**$2,995,000**		
المتوفر منها	**$2,400,000**		

البرنامج (3): برنامج تحسين جودة الخدمات الصحية رقم البرنامج: SO - 02

مقدمة:

يشمل برنامج تحسين جودة الخدمات الصحية على المشاريع التي تحسن وتطور كل ما يتعلق بقطاع الصحة من مستشفيات ومراكز صحية وكوادر طبية وأجهزة وخدمات صحية متنوعة؛ لتساهم بتطوير ورفع كفاءات أداء القطاع الصحي الذي يعد من أهم القطاعات الإنسانية التي تتعلق بحياة الأفراد وصحتهم.

النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد العيادات الصحية الحكومية	0.5	1
عدد المراكز الصحية المؤهلة	1	3
مساحة المركز الصحي	260 م2	520 م2
عدد مراكز الأشعة	0	1

مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

الفئات المستهدفة: سكان بلدة برطعة

مكونات البرنامج

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، فني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
بناء مقر جديد للعيادة الصحية الحكومية	200,000	المجتمع المحلي	مالي
بناء طابق ثاني لمركز صحي بلدية برطعة	100,000		
بناء جدران استنادية للمركز الطبي	30,000		
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تجهيز المركز الطبي بغرفة طوارئ وأجهزة طبية ومركز أشعة	50,000	الاغاثة الطبية	مالي,اداري
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
-			
التكلفة الاجمالية	**$380,000**		
المتوفر منها	**$200,000**		

البرنامج (4): تنمية الاقتصاد المحلي	رقم البرنامج: ECO

مقدمة:

يأتي برنامج تنمية الاقتصاد المحلي لتحسين وتطوير الاقتصاد المحلي للبلدة، ويقترح مشاريع تنمي اقتصادها بناءً على الثروات التي تتميز بها البلدة واحتياجاتها الأولية التي ظهرت بعد تحليل الوضع الحالي للبلدة في التقرير التشخيصي، كما يطور من البنية التحتية الاقتصادية للبلدة. وتكمن أهمية تحقيق هذه المشاريع بالدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد المحلي للبلدة والأثر الذي يعكسه على حياة الناس.

النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد المسارات البيئية المؤهلة	0	1
عدد الحدائق العامة	2	3
عدد الحملات التوعوية السياحية	0	2
عدد الأسواق التجارية المؤهلة	1	1

مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

الفئات المستهدفة: سكان بلدة برطعة

مكونات البرنامج

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، فني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
تأهيل وتطوير منطقة نبع العين	100,000	البلجيك	مالي
تأهيل مسار بيئي سياحي	30,000	جمعية السياحة البيئية	فني
إنشاء حدائق عامة	50,000		
تطوير العناصر البصرية والجمالية والبيئية للسوق التجاري	30,000	التجار	مالي,اداري
تخطيط منطقة صناعية وحرفية جديدة	5,000	الحكم المحلي	فني
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تعيين مراقبين ومنظمين للسوق التجاري	50,000		

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، فني)
تشجيع السياحة الداخلية والتعريف بالأماكن البيئية والترفيهية	10,000	جمعية السياحة البيئية	مالي,فني
حملات إعلامية وتوعوية	10,000		
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
تطوير نظام وخطة مرور لتنظيم السوق	10,000	التجار	اداري
التكلفة الاجمالية	**$295,000**		
المتوفر منها	**$100,000**		

البرنامج (5): برنامج التنظيم وبناء القدرات	رقم البرنامج: GOV

مقدمة:

من الأفكار المهمة في بناء القدرات والتنظيم هي بناء قدرة البلدية وأقسامها للنهوض بالمجتمع المحلي وتحسين القدرة على معالجة المشاكل المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث أن تفعيل دور البلدية يساهم في جذب المشاريع الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للبلدة .

النتائج المتوقعة:

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
مساحة المخطط الهيكلي	432	3000
عدد مراكز خدمات الجمهور	0	1
عدد سيارات الحركة والمراقبة	1	2
عدد المعدات المتوفرة لأعمال الأشغال والصيانة	1	2
عدد لجان الرقابة	1	2

مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

الفئات المستهدفة: بلدية برطعة


مكونات البرنامج

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، فني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
توسعة المخطط الهيكلي ومصادقته	70,000	وزارة الحكم المحلي	فني,مالي
انشاء مركز خدمات جمهور	30,000		
بناء مقر جديد مؤهل لبلدية برطعة	300,000		
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
توفير سيارة حركة للجنة التنظيم	40,000	الوكالة السويدية	مالي
توفير الاجهزة المكتبية للجنة التنظيم	10,000		
توريد المعدات اللازمة لأعمال الاشغال والصيانة	100,000	صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية	مالي
تشكيل لجنة الرقابة من لجان الاحياء	5000	المجتمع المحلي	اداري
التكلفة الإجمالية	555000		
المتوفر منها	80000		

البعد (التوصيف) المكاني للمشاريع

06

6. البعد (التوصيف) المكاني للمشاريع

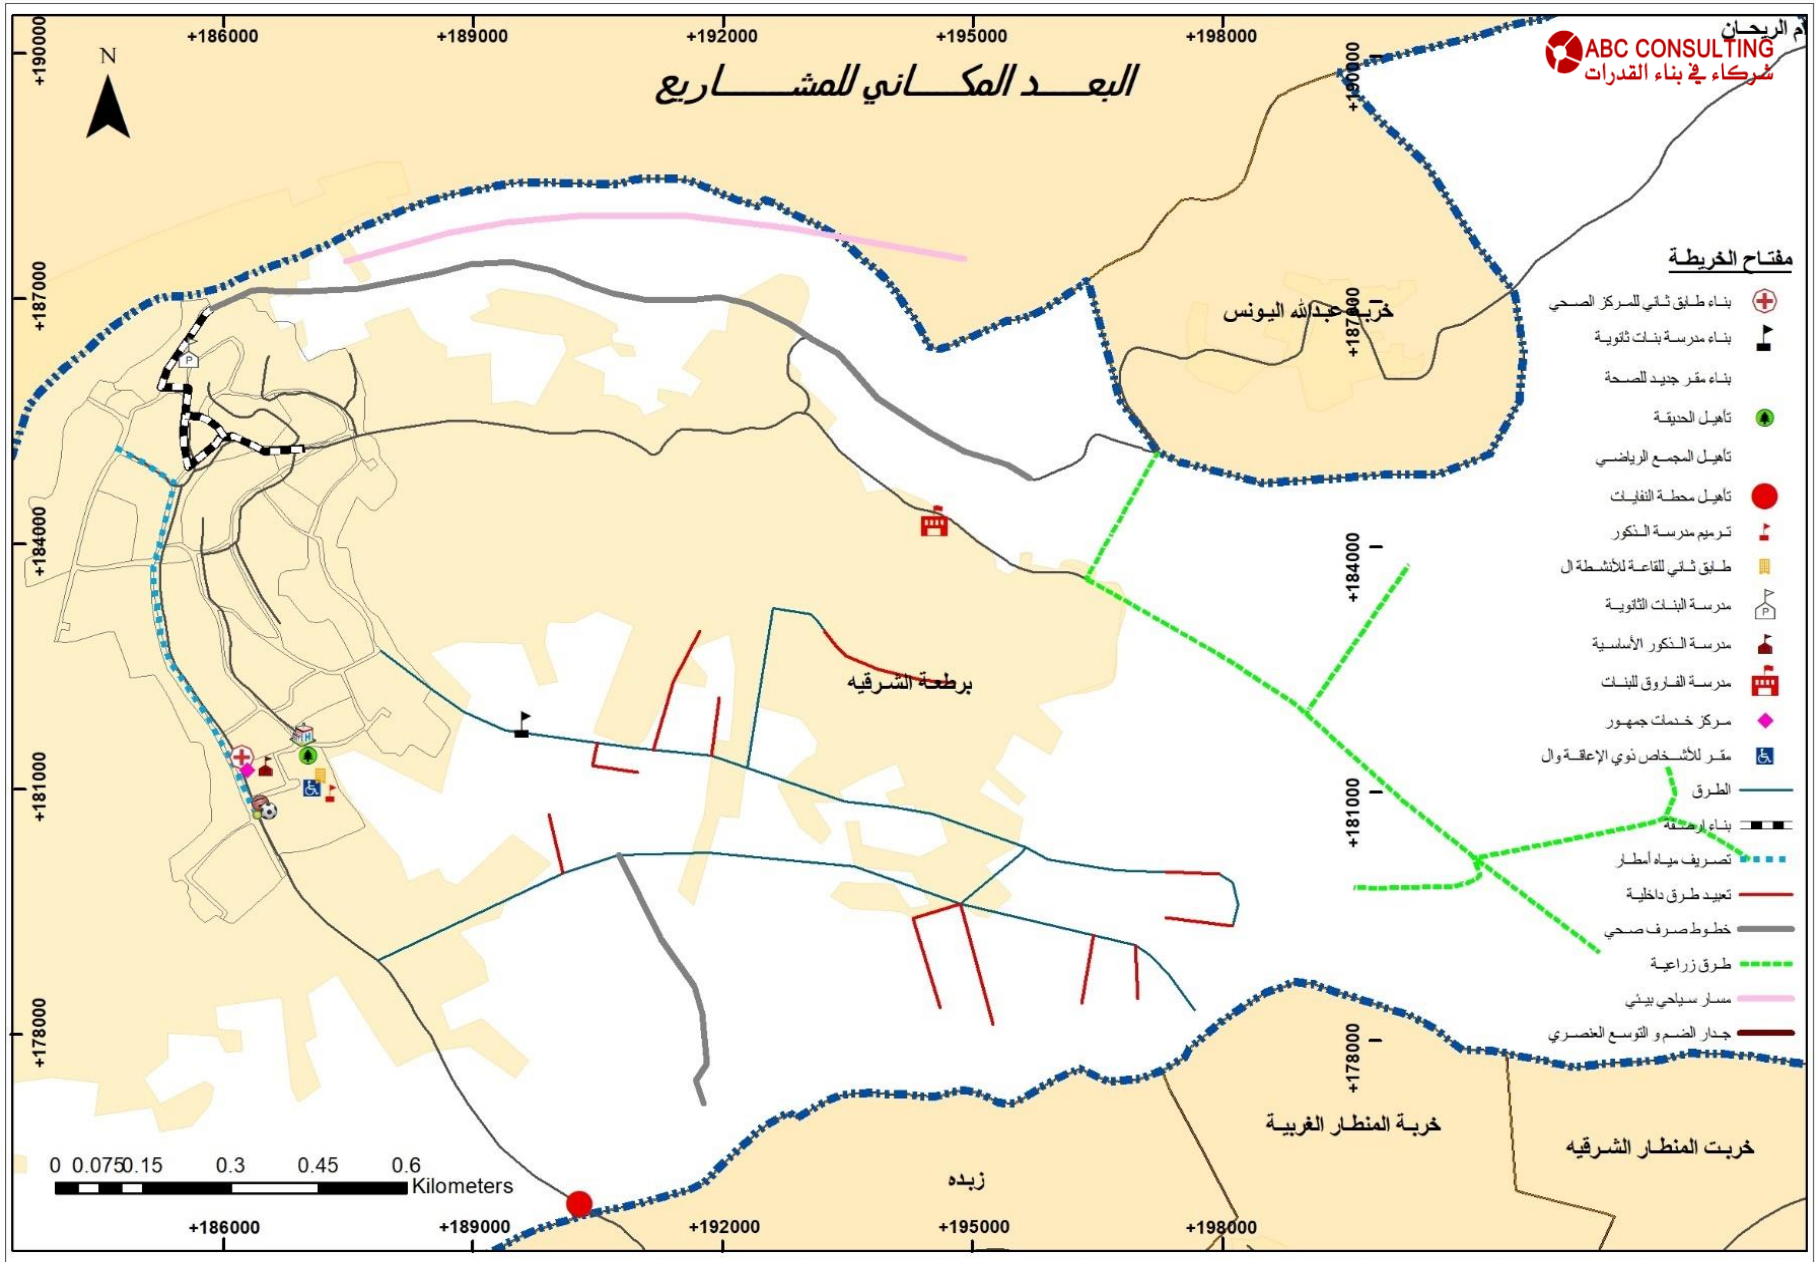

خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم

- خطة التنفيذ الرباعية
- مصفوفة خطة التنفيذ السنوية/ السنة الأولى
- مصفوفة خطة المتابعة والتقييم

07

7. خطط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

أ. خطة التنفيذ الرباعية

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج[8]	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية $1000 x	خطة التنفيذ الرباعية				تصنيف مكون البرنامج /المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ				الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/ المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الصرف السنوي ($1000 X)							الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية /الشريك			الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك	
						الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة x 1000	حدد الجهة	قيمة المساهمةx 1000	
البيئة والبنى التحتية	برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية	INF	إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية بطول 7 كم	INF/1	900	400	300	100	100	✓			قسم الهندسة	وزارة الحكم المحلي	تمويل	صيانة الطرق	300	وزارة الحكم المحلي	300	
			تطبيق خطة مرورية بالسوق التجاري	INF/2	5		3	2			✓		قسم الهندسة	القطاع الخاص	اداري	ايرادات السوق	5			
			بناء أرصفة وجدران إستنادية 1 كم	INF/3	100			50	50			✓	قسم الهندسة							

[8] توضع أرقام مكونات البرامج/المشاريع بكتابة الحرفين الأولين من المحور الرئيسي لمكون البرنامج/ المشروع باللغة الإنجليزية ومن ثم رقمه: AG\01

* يمكن للهيئة المحلية متابعة مكونات البرامج/ المشاريع المنفذة من قبل جهات غير الهيئة المحلية من خلال الاجتماعات الدورية إضافة إلى التواصل الإلكتروني

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج[8]	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية $1000 x	خطة التنفيذ الرباعية				تصنيف مكون البرنامج /المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ				الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/ المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الصرف السنوي ($1000 X)							الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية /الشريك			الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك	
						الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة x 1000	حدد الجهة	قيمة المساهمةx 1000
			شق وتأهيل طرق زراعية بطول 7 كم	INF/4	200	150	50				✓		قسم الهندسة	وزارة الزراعة	تمويل,فني	صيانة الطرق	50	وزارة الزراعة	150
			إنشاء شبكات تصريف مياه أمطار بطول 2 كم	INF/5	350			200	150			✓	قسم المشاريع						
			تأهيل وتطوير الحدائق والمناطق الخضراء	INF/6	50	20	20	10			✓		قسم المشاريع	البلجيك	تمويل	تطوير المناطق الخضراء	10	البلجيك جمعية السياحة البيئية	20 20
			إعادة تأهيل وتطوير محطة ترحيل النفايات	INF/7	20		10	10			✓		قسم المشاريع			محطة النفايات	20		
			فصل النفايات وإعادة التدوير	INF/8	50			30	20			✓	قسم المشاريع						

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج[8]	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية $1000 x	خطة التنفيذ الرباعية				تصنيف مكون البرنامج /المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ				الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/ المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الصرف السنوي ($1000 X)							الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية /الشريك			الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك	
						الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة x 1000	حدد الجهة	قيمة المساهمةx 1000
			تمديد خطوط صرف صحي ووصلات منزلية بأطوال 5 كم	INF/9	500	50	300	75	75		✓		قسم المشاريع	سلطة المياه الفلسطينية	تمويل	صيانة الصرف الصحي	100	سلطة المياه	300
			تأهيل شبكة الصرف الصحي بطول 2 كم	INF/10	50	20	10	10	10	✓			قسم المشاريع			صيانة شبكة المجاري	50		
			إضافة لوحات إرشادية وتزيين الشوارع	INF/11	20	10	5	5		✓			قسم المشاريع			صيانة الطرق	20		
			توريد حاويات نفايات	INF/12	15	5	5	5				✓	قسم الصحة						
			توريد سيارة نضح وتسليك مجاري	INF/13	120	120				✓			قسم الصحة	الهيئات المحلية صندوق تطوير وإقراض	فني			البلجيك	120
مجموع الجزئي					**2380**	**775**	**703**	**497**	**405**								**555**		**910**

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج[8]	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية $1000 x	خطة التنفيذ الرباعية				تصنيف مكون البرنامج /المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ				الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/ المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الصرف السنوي ($1000 X)							الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية /الشريك			الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك	
						الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة x 1000	حدد الجهة	قيمة المساهمةx 1000
التنمية الاجتماعية	تمكين الفئات المهمشة	SO - 01	بناء مدرسة بنات ثانوية جديدة	SO – 01/1	2000		1500	500			✓		قسم الهندسة	وزارة التربية والتعليم	فني			وزارة التربية والتعليم	2000
			تأهيل الوحدات الصحية في مدرسة البنات الثانوية ومدرسة الفاروق	SO – 01/2	10		5	5				✓	قسم الهندسة						
			تأهيل الساحات المدرسية والملاعب في مدرسة الفاروق والبنات الثانوية	SO – 01/3	20		10	10				✓	قسم الهندسة	المجتمع المحلي	مالي				
			تأهيل الحديقة المدرسية في مدرسة الذكور الأساسية والبنات الأساسية والفاروق	SO – 01/4	10		5	5				✓	قسم الهندسة						

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج[8]	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية $1000 x	خطة التنفيذ الرباعية				تصنيف مكون البرنامج /المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ				الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/ المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الصرف السنوي ($1000 X)							الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية /الشريك			الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك	
						الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة x 1000	حدد الجهة	قيمة المساهمةx 1000
			إضافة ثلاثة غرف صفية لكل من مدرسة الفاروق ومدرسة الذكور الأساسية	SO – 01/5	150			50	100			✓	قسم الهندسة	وزارة التربية والتعليم	مالي فني				
			تأهيل وترميم بناية مدرسة الذكور الثانوية	SO – 01/6	20				20			✓	قسم الهندسة						
			توفير مقر لتنفيذ برامج تمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.	SO – 01/7	300			150	150			✓							
			تأهيل المجمع الشبابي الرياضي	SO – 01/8	50			30	20			✓		الشباب والرياضة	مالي فني				

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج[8]	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية $1000 x	خطة التنفيذ الرباعية				الصرف السنوي ($1000 X)				تصنيف مكون البرنامج /المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ				الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/ المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة					مضمون	محتمل	متمنى	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية /الشريك			الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك	
																	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة x 1000	حدد الجهة	قيمة المساهمةx 1000	
			إضافة طابق ثاني للقاعة العامة كمقر مغلق للأنشطة الرياضية	SO – 01/9	400		200	200							✓			الحكـــم المحلي	تمويل			الحكم المحلي	400
			تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.	SO – 01/10	10		5	5								✓							
			تنفيذ برامج التدريب والتعليم المهني	SO – 01/11	20		10	10								✓							
			تمكين المبادرات الشبابية في المساءلة المجتمعية في مجال البيئة والمياه والصرف الصحي	SO – 01/12	5		3	2								✓							

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج[8]	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية $1000 x	خطة التنفيذ الرباعية الصرف السنوي ($1000 X)				تصنيف مكون البرنامج /المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ				الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/ المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	مضمون	محتمل	متمنى	الهيئة المحلية				الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك	
													حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة x 1000	حدد الجهة	قيمة المساهمةx 1000	
	برنامج تحسين جودة الخدمات الصحية	SO – 02	بناء مقر جديد للعيادة الصحية الحكومية	SO – 02/1	200	150	50			✓			قسم الهندسة	المجتمع المحلي	تمويل	صيانة الابنية	120	المجتمع المحلي	80	
			بناء طابق ثاني لمركز صحي بلدية برطعة	SO – 02/2	100			50	50			✓								
			بناء جدران إستنادية للمركز الطبي	SO – 02/3	30			20	10			✓								
			تجهيز المركز الطبي بغرفة طوارئ وأجهزة طبية ومركز أشعة	SO – 02/4	50			30	20			✓								
المجموع الجزئي					**3375**	**150**	**1787**	**1068**	**370**								**120**		**2480**	
الاقتصاد	الاقتصاد	ECO	تأهيل وتطوير منطقة نبع العين	ECO/1	100	50		50			✓		قسم الهندسة			تطوير الحدائق	20	البلجيك	80	

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج[8]	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية $1000 x	خطة التنفيذ الرباعية				تصنيف مكون البرنامج /المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ				الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/ المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الصرف السنوي ($1000 X)							الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية /الشريك			الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك	
						الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة x 1000	حدد الجهة	قيمة المساهمةx 1000
			تأهيل مسار بيئي سياحي	ECO/2	30		30				✓		قسم الهندسة				جمعيـــــة الســـــياحة البيئية	30
			إنشاء حدائق عامة	ECO/3	50			30	20			✓							
			تشجيع السياحة الداخلية والتعريف بالأماكن البيئية والترفيهية	ECO/4	10		5	5				✓							
			حملات إعلامية وتوعوية بالسياحة	ECO/5	10		5	5				✓							
			تطوير العناصر البصرية والجمالية والبيئية للسوق التجاري.	ECO/6	30			15	15			✓							
			تخطيط منطقة صناعية وحرفية جديدة	ECO/7	5		5					✓							

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج[8]	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية $1000 x	خطة التنفيذ الرباعية الصرف السنوي ($1000 X)				تصنيف مكون البرنامج /المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ				الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/ المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
													الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية /الشريك			الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك	
						الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة x 1000	حدد الجهة	قيمة المساهمةx 1000
			تعيين مراقبين ومنظمين للسوق التجاري	ECO/8	50	12	14	12	12	✓			قسم الصحة			رواتب	50		
			تطوير نظام وخطة مرور لتنظيم السوق	ECO/9	10			5	5			✓								
المجموع الجزئي					**295**	**62**	**59**	**122**	**52**								**70**		**110**	
الإدارة والحكم الرشيد	برنامج التنظيم وبناء القدرات	GOV	توسعة المخطط الهيكلي ومصادقته	GOV /1	70	50	20			✓				الحكم المحلي	تمويل فني			الحكم المحلي	70
			إنشاء مركز خدمات جمهور	GOV /2	30			15	15			✓								
			توفير سيارة حركة للجنة التنظيم	GOV /3	40		40					✓								
			توفير الأجهزة المكتبية للجنة التنظيم	GOV/4	10		5	5												
			بناء مقر جديد مؤهل لبلدية برطعة	GOV /5	300			200	100			✓								

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج[8]	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية $1000 x	خطة التنفيذ الرباعية الصرف السنوي ($1000 X)				تصنيف مكون البرنامج /المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ				الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/ المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	مضمون	محتمل	متمنى	الهيئة المحلية حدد القسم المعني	غير الهيئة المحلية /الشريك اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	الهيئة المحلية قيمة المساهمة x 1000	حدد الجهة	غير الهيئة المحلية/الشريك قيمة المساهمةx 1000
			توريد المعدات اللازمة لأعمال الأشغال والصيانة	GOV/6	100		30	70				✓								
			تشكيل لجنة الرقابة من لجان الأحياء	GOV /7	5			5				✓								
المجموع الجزئي					**555**	**50**	**95**	**295**	**115**											**70**
المجموع الكلي(المحتمل +المضمون)- $																				
المجموع الكلي(متمنى)- دولار أمريكي																				
المجموع الكلي للخطة التنموية (محتمل +مضمون +متمنى)- دولار أمريكي					**6605**															

ب. مصفوفة خطة التنفيذ السنوية/ السنة الأولى

اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية x $1000	خطة العام 2023				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			الجهة المرشحة للتمويل				تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى / مقترحات /بنود مرجعية/ وثائق عطاء)[9]
			الصرف الربع سنوي				الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية		
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	حدد القسم المعني	حدد الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	
اعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية بطول 7 كم	INF/1	400					قسم الهندسة	وزارة الحكم المحلي	تمويل	صيانة الطرق	300	وزارة الحكم المحلي	300	
شق وتأهيل طرق زراعية بطول 7 كم	INF/4	150					قسم الهندسة	وزارة الزراعة	تمويل,فني	صيانة الطرق	50	وزارة الزراعة	150	
تأهيل وتطوير الحدائق والمناطق الخضراء	INF/6	20					قسم المشاريع	البلجيك	تمويل	تطوير المناطق الخضراء	10	البلجيك جمعية السياحة البيئية	20 20	
تمديد خطوط صرف صحي ووصلات منزلية بطول 5 كم	INF/9	50					قسم المشاريع	سلطة المياه الفلسطينية	تمويل	صيانة الصرف الصحي	100	سلطة المياه	300	

[9] تعتمد التحضيرات اللازمة لتنفيذ مكونات البرامج/ المشاريع على طبيعة المكون/المشروع نفسه وعلى طبيعة الجهة المقترحة للتنفيذ؛ وبشكل عام تكون بعضها بحاجة إلى دراسة جدوى وخصوصا تلك ذات الطابع الربحي، والبعض الآخر يكون بحاجة إلى كتابة مقترح تفصيلي وخصوصا إذا كان الهدف التقديم لجهات مانحة للحصول على تمويل، في حين أن البعض ستكون بحاجة إلى تحضير بنود مرجعية) مثل مواضيع التطوير المؤسسي، برامج التوعية، برامج التدريب وبناء القدرات ... الخ)، كما أن بعضها تكون بحاجة إلى تحضير مخططات ووثائق عطاء مثل الإنشاءات والبنية التحتية. علما بأن بعضها قد تتطلب تحضيرات متعددة؛ كأن تحتاج إلى إعداد دراسة جدوى ومن ثم تحضير وثائق عطاء

اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية x $1000	خطة العام 2023				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف				الجهة المرشحة للتمويل				تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى / مقترحات /بنود مرجعية/ وثائق عطاء)[9]
			الصرف الربع سنوي				الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك			الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية		
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	حدد القسم المعني	حدد الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة		
اضافة لوحات ارشادية وتزيين الشوارع	INF/11	10					قسم المشاريع			صيانة الطرق	20				
توريد حاويات نفايات	INF/ 12	5					قسم الصحة								
توريد شاحنة نضح وتسليك مجاري	INF/13	120					قسم الصحة	صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية	فني			البلجيك	120		
تعيين مراقبين ومنظمين للسوق التجاري	ECO/8	12					قسم الصحة			رواتب	50				
بناء مقر جديد للعيادة الصحية الحكومية	SO – 02/1	150					قسم الهندسة	المجتمع المحلي	تمويل	صيانة الابنية	120	المجتمع المحلي	80		
توسعة المخطط الهيكلي	GOV /1	50						الحكم المحلي	تمويل فني			الحكم المحلي	70		

ت. مصفوفة خطة المتابعة والتقييم

البرنامج	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر
				الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة			
مجال البيئة والبنى التحتية										
تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية	إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية بطول 7 كم	اطوال الطرق المنجزة	15	17	20	21	22	بلدية برطعة	المخطط	قسم الهندسة
	بناء أرصفة وجدران استنادية 1 كم	اطوال الارصفة المنجزة	5	5	5	6	6	بلدية برطعة	المخطط	قسم الهندسة
	شق وتأهيل طرق زراعية بطول 7كم	اطوال الطرق المؤهلة والمشقوقة	6	10	12	13	13	بلدية برطعة	المخطط	قسم الهندسة
	إنشاء شبكات تصريف مياه أمطار بطول 2كم	طول شبكة التصريف	0	0	0	1	2	بلدية برطعة	المخطط	قسم الهندسة
	تأهيل وتطوير الحدائق والمناطق الخضراء	مساحة المناطق المؤهلة	35	40	45	46	47	بلدية برطعة	المخطط	قسم الهندسة
	إعادة تأهيل وتطوير محطة ترحيل النفايات	مساحة المنطقة المؤهلة	2	2	3	5	5	بلدية برطعة	المخطط	قسم الهندسة
	فصل النفايات وإعادة التدوير	عمليات الفصل المنفذة	0	0	1	2	2	بلدية برطعة	اوزان المواد المفصولة	قسم الصحة
	تمديد خطوط صرف صحي ووصلات منزلية بأطوال 5 كم	اطوال الخطوط المنفذة	18	20	22	23	23	بلدية برطعة	المخطط	قسم الهندسة
	تأهيل شبكة الصرف الصحي بطول 2 كم	اطوال الخطوط المؤهلة	5	6	7	7	7	بلدية برطعة	المخطط	قسم الهندسة
	إضافة لوحات إرشادية وتزيين الشوارع	عدد اللوحات المركبة	50	100	150	150	150	بلدية برطعة	المخطط	قسم الهندسة
	تطبيق خطة مرورية بالسوق التجاري	عدد الشكاوى الشهرية بسبب الازدحام	15	13	10	7	5	التجار والمتسوقين	سجل الشكاوى	قسم السكرتارية

البرنامج	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر
				الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة			
	توريد حاويات نفايات	عدد الحاويات	1000	1000	1100	1200	1200	البلدية	الفواتير	قسم الصحة
	توريد سيارة نضح وتسليك مجاري	وجود الشاحنة	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	البلدية	رخصة السيارة	قسم الصحة
مجال تنمية الاقتصاد المحلي										
تنمية الاقتصاد المحلي	تأهيل وتطوير منطقة نبع العين	مساحة المنطقة المؤهلة	0	3	5	7	8	البلدية	المخططات	قسم الهندسة
	تأهيل مسار بيئي سياحي	طول المسار المؤهل	1	2	3	3	4	البلدية	المخططات	قسم الهندسة
	إنشاء حدائق عامة	مساحة الحدائق (دنم)	35	37	39	40	40	البلدية	المخططات	قسم الهندسة
	تطوير العناصر البصرية والجمالية والبيئية للسوق التجاري	نسبة المساحة المطورة	%10	%30	%50	%60	%70	البلدية	المخططات	قسم الهندسة
	تخطيط منطقة صناعية وحرفية جديدة	تنفيذ التخطيط	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	البلدية	المخططات	قسم الهندسة
	تعيين مراقبين ومنظمين للسوق التجاري	عدد المراقبين	2	4	5	5	5	البلدية	سجل الرواتب	قسم الصحة
	تشجيع السياحة الداخلية والتعريف بالأماكن البيئية والترفيهية	عدد الحملات الاعلامية	0	1	2	3	3	البلدية	سجل المصاريف	قسم المحاسبة
	حملات إعلامية وتوعوية	عدد الحملات الاعلامية	0	1	2	3	4	البلدية	سجل المصاريف	قسم المحاسبة
	تطوير نظام وخطة مرور لتنظيم السوق	انشاء خطة المرور	لا	لا	نعم	نعم	نعم	البلدية	سجل المصاريف	قسم الهندسة
مجال التنمية الاجتماعية										
تمكين الفئات المهمشة	بناء مدرسة بنات ثانوية جديدة	بناء المدرسة	لا	لا	نعم	نعم	نعم	بلدية برطعة	المخططات	قسم الهندسة
	تأهيل الوحدات الصحية في	عدد الوحدات المؤهلة	3	3	4	5	5	المدارس	سجلات	قسم المحاسبة

البرنامج	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر
				الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة			
	مدرسة البنات الثانوية ومدرسة الفاروق								المصاريف	
	تأهيل الساحات المدرسية والملاعب في مدرسة الفاروق والبنات الثانوية	عدد الساحات المؤهلة	3	3	4	5	5	المدارس	سجلات المصاريف	قسم المحاسبة
	تأهيل الحديقة المدرسية في مدرسة الذكور الاساسية والبنات الاساسية والفاروق	عدد الحدائق المؤهلة	2	2	3	4	5	المدارس	سجلات المصاريف	قسم المحاسبة
	إضافة ثلاثة غرف صفية لكل من مدرسة الفاروق ومدرسة الذكور الاساسية	عدد الغرف المبنية	97	97	97	100	100	المدارس	كشوفات الغرف الصفية	قسم الهندسة
	تأهيل وترميم بناية مدرسة الذكور الثانوية	تأهيل المبنى	لا	لا	لا	نعم	نعم	البلدية	المخططات وسجل المصاريف	قسم الهندسة والمحاسبة
	توفير مقر لتنفيذ برامج تمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة	وجود المبنى	لا	لا	نعم	نعم	نعم	البلدية	المخططات	قسم الهندسة
	تأهيل المجمع الشبابي الرياضي وتوسعته	المساحة المؤهلة	3700	3700	4000	4500	4500	البلدية	المخططات	قسم الهندسة
	إضافة طابق ثاني للقاعة العامة كمقر مغلق للأنشطة الرياضية	بناء الطابق	لا	لا	نعم	نعم	نعم	البلدية	المخططات	قسم الهندسة
	تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة	عدد البرامج	0	0	1	2	2	بلدية برطعة	السجلات	بلدية برطعة
	تنفيذ برامج التدريب والتعليم	توفر البرنامج	لا	لا	نعم	نعم	نعم	بلدية برطعة	سجلات المدارس	بلدية برطعة

البرنامج	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر
				الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة			
	المهني									
	تمكين المبادرات الشبابية في المساءلة المجتمعية في مجال البيئة والمياه والصرف الصحي	عدد المبادرات	0	0	1	2	2	بلدية برطعة	محاضر الجلسات	بلدية برطعة
برنامج تحسين جودة الخدمات الصحية	بناء مقر جديد للعيادة الصحية الحكومية	بناء المقر	0	1	1	1	1	بلدية برطعة	سجل المصاريف	قسم الهندسة
	بناء طابق ثاني لمركز صحي بلدية برطعة	بناء الطابق الثاني	لا	لا	لا	لا	نعم	بلدية برطعة	المخططات	قسم الهندسة
	بناء جدران استنادية للمركز الطبي	اطوال الجدران المبنية	0	0	0	40	40	بلدية برطعة	المخططات	قسم الهندسة
	تجهيز المركز الطبي بغرفة طوارئ وأجهزة طبية ومركز أشعة	توفر غرفة الطوارئ	لا	لا	نعم	نعم	نعم	بلدية برطعة	سجل الشراء	قسم الصحة
مجال الإدارة والحكم الرشيد										
برنامج التنظيم وبناء القدرات	توسعة المخطط الهيكلي	نسخة المخطط	لا	لا	نعم	نعم	نعم	بلدية برطعة	المخطط	قسم الهندسة
	انشاء مركز خدمات جمهور	تأهيل المركز	لا	لا	نعم	نعم	نعم	بلدية برطعة	المخطط	قسم الهندسة
	بناء مقر جديد لبلدية برطعة	مساحة البناء	0	0	0	300	300	بلدية برطعة	المخطط	قسم الهندسة
	توفير سيارة للجنة التنظيم	وجود السيارة	لا	لا	لا	نعم	نعم	بلدية برطعة	رخصة السيارة	قسم المحاسبة
	توفير الاجهزة المكتبية للجنة التنظيم	شراء الاثاث	لا	لا	نعم	نعم	نعم	بلدية برطعة	سجل الاصول	قسم الهندسة
	توريد المعدات اللازمة لأعمال الاشغال والصيانة	شراء بايجر	لا	لا	لا	نعم	نعم	بلدية برطعة	سجل الاصول	قسم الهندسة
	تشكيل لجنة الرقابة من لجان الاحياء	توفر لجان الرقابة	لا	لا	لا	نعم	نعم	البلدية	محضر الجلسة	ادارة البلدية

الملاحق

- أوصاف مشاريع السنة الأولى
  - مرفق (1) تعريف عام عن البلدية
  - مرفق (2): التقييم المؤسسي والمجالات والتدخلات الفنية المقترحة
  - مرفق (3): دليل التجمع السكاني لبلدة برطعه الشرقية
  - مرفق (4): تحليل جذور القضايا وأثرها على التنمية الشمولية للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والبيئة

08

8. الملاحق

أ. أوصاف مشاريع السنة الأولى

1. اعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية بطول 7 كم

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: اعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية بطول 7 كم	**الرقم:** INF/1	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		**مكان التنفيذ**
يتمثل المشروع بأعمال تعبي وتأهيل طرق داخلية ببلدة برطعة بأطول تصل الى حوالي 7 كم حيث يوج الكثير من الاحياء في البلدة بحاجة ماسة الى اعمال تعبيد الطريق اليها ناهيك عن اعمال البنية التحتية من شبكات المجاري والمياه حيث يتطلب بعدها اعادة تزفيت الشوارع ويوجد في برطعة حوالي 15 كم معبدة.		بلدة برطعة **التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ** 2023 **مدة التنفيذ** 2026-2023

أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة(مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها
1. تعبيد طرق البلدة وصيانة المعبد فيها 2. ربط الطرق ببعضها. 3. التقليل من الآثار الميكانيكية السيئة المترتبة على السيارات. 4. سهولة تنقل المواطنين	المواطنين (مشاه، مالكي سيارات، مواطنين بشكل عام)	6000	تطوير شبكة المواصلات والطرق الداخلية ومداخل البلد

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...الخ)حسب مراحله	**التكلفة التقديرية($) حسب سنوات الخطة**				**المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/ المشروع**
	الأولى	**الثانية**	**الثالثة**	**الرابعة**	
عمل التصاميم والعطاءات	2	2	2	1	• شبكات المجاري • شبكات المياه
تعبيد الطرق	398	298	98	99	
المجموع (بالأرقام)	**900**				

متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*	**عملية الإدارة والتشغيل والصيانة***
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني	**كيف؟** • **تتم اعمال التشغيل والصيانة من خلال معدات البلدية ومتابعتها**
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	**من؟ طواقم وعمال البلدية**

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: اعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية بطول 7 كم	**الرقم:** INF/1	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية
		العائد المادي السنوي المتوقع($)
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة		☐ نعم ☒ لا
جهة التنفيذ المقترحة		
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		**جهات أخرى (حدد)**
قسم الهندسة		
جهة التمويل المقترحة		
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		**جهات أخرى (حدد)**
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: الطرق		وزارة الحكم المحلي
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع : ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية : ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهات المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب(حدد):_____
دراسات / مخططات : ☒متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☒ مطلوب جزئيا ☐ غيرمطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع[10]		
سلبية: اعاقة حركة السير اثناء التنفيذ	**إيجابية:** 1- ربط الطرق ببعضها 2- تقليل الغبار المنبعث من الطرق الترابية 3- تسهيل تنقل المواطنين	**تدابير التخفيف: ايجاد طرق بديلة ووضع خطة مرور**
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		**إجراءات التغلب عليها**
قلة التمويل		البحث عن ممول اخر
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*		
داخل المخطط الهيكلي		

[10] * قد لا تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/المشاريع مثل: بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وكذلك الدراسات والبحث والتطوير.

2. شق وتأهيل طرق زراعية بطول 7 كم

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: شق وتأهيل طرق زراعية بطول 7 كم	**الرقم: INF/4**	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		**مكان التنفيذ**
من اجل سهولة وصول المواطنين الى اراضيهم الزراعية وخدمتها سيعمل المشروع على اعادة تأهيل الطرق المفتوحة وشق طرق جديدة في مناطق لا يوجد بها طرق بحيث يتم شق الطريق على عرض 6 امتار وفردها بالبيسكورس بعرض 4 امتار		بلدة برطعة
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
		2023
		مدة التنفيذ
		2024-2023

أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة(مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها
1-سهولة وصول المزارعين لأراضيهم 2-المحافظة على الاراضي	المواطنين(مالكي الاراضي,المتنزهين)	5000	تطوير شبكة الطرق الزراعية

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/ المشروع
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...الخ)حسب مراحله	التكلفة التقديرية($) حسب سنوات الخطة				
	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	
تجهيز الخرائط	0	0			• لا يوجد
اعمال التأهيل والشق	150	50			
المجموع (بالأرقام)	**200**				

متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*	عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني	**كيف؟** **من خلال معدات البلدية سيتم التشغيل والصيانة**
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	**من؟ طواقم عمال البلدية وقسم الاشغال**
	العائد المادي السنوي المتوقع($)
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة	☐ نعم ☒ لا

جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	**جهات أخرى (حدد)**
قسم الهندسة	وزارة الزراعة
جهة التمويل المقترحة	

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: شق وتأهيل طرق زراعية بطول 7 كم	**الرقم: INF/4**	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	**جهات أخرى (حدد)**	
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:صيانة الطرق	وزارة الزراعة	
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع : ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا	
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية : ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات / مخططات : ☒متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	بناء قدرات الجهات المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب(حدد):_____ دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☒ مطلوب جزئيا ☐ غيرمطلوب	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع[11]		
سلبية: لا يوجد	**إيجابية: المحافظة على الاراضي وزراعتها وتنظيفها**	**تدابير التخفيف:**
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		**إجراءات التغلب عليها**
سياسات الاحتلال ومصادرة المعدات		اصدار التصاريح اللازمة
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*		
داخل المخطط الهيكلي		

[11] * قد لا تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/المشاريع مثل: بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وكذلك الدراسات والبحث والتطوير.

3. تأهيل وتطوير الحدائق والمناطق الخضراء

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: تأهيل وتطوير الحدائق والمناطق الخضراء	**الرقم: INF/6**	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		**مكان التنفيذ**
المشروع هو عبارة عن اعادة تأهيل وتطوير منطقة نبع العين التراثية الاثرية من اجل المحافظة عليها وتطويرها لتصبح مكان جذب سياحي حيث سيتم اعادة ترميم القناه وتوريد المقاعد والالعاب وتسوية المكان وترتيبه لتكون متنفسا للاهالي ولزيادة المناطق الخضراء في البلدة		نبع العين برطعة
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
		2023
		مدة التنفيذ
		2023-2325

أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة(مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها
1-المحافظة على نبع العين 2-خلق متنفس للأهالي 3-توفير مكان العاب للأطفال 4-الحفاظ على الطبيعة	جميع المواطنين في البلدة والتجمعات المجاورة والمتنزهين	10000	تشجيع السياحة الداخلية

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...الخ)حسب مراحله	**التكلفة التقديرية($) حسب سنوات الخطة**				**المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/ المشروع**
	الأولى	**الثانية**	**الثالثة**	**الرابعة**	
تجهيز المخططات والعطاءات	1	1	1		• لا يوجد
اعمال التأهل والتطوير والتوريد	19	19	9		
المجموع (بالأرقام)	**50**				

متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*	**عملية الإدارة والتشغيل والصيانة***
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني	**كيف؟** • **من خلال طواقم البلدية ستتم عملية التشغيل والصيانة الدورية**
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	**من؟ عمال البلدية**
	العائد المادي السنوي المتوقع($) **5000**
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة	☒ نعم ☐ لا

جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	**جهات أخرى (حدد)**

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: تأهيل وتطوير الحدائق والمناطق الخضراء	**الرقم: INF/6**	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية
قسم الهندسة والصحة		
جهة التمويل المقترحة		
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	**جهات أخرى (حدد)**	
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:صيانة الحدائق	البلجيك	
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع : ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية : ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهات المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب(حدد):_____
دراسات / مخططات : ☐متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غيرمطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع[12]		
سلبية: اعباء التشغيل والصيانة	**إيجابية: ايجاد متنفس للأهالي والتفريغ النفسي والمحافظة عالطبيعة**	**تدابير التخفيف: من خلال الايرادات**
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		**إجراءات التغلب عليها**
قلة التمويل		ايجاد ممول جديد
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*		
داخل المخطط الهيكلي		

[12] * قد لا تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/المشاريع مثل: بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وكذلك الدراسات والبحث والتطوير.

4. تمديد خطوط صرف صحي ووصلات منزلية بطول 5 كم

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: تمديد خطوط صرف صحي ووصلات منزلية بطول 5 كم	**الرقم: INF/9**	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع	**مكان التنفيذ**
تم البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في بلدة برطعة عام 2013 ولم يغطي سوى 60 % من البلدة ومنذ ذلك الحين والبلدية تقوم بتطوير المشروع والزيادة عليه من خلال المانحين وفي ظل التزايد العمراني السريع بالبلدة فنحن الان بحاجة الى تنفيذ حوالي 5 كم من الخطوط الرئيسية لسد احتياج المواطنين وايصالهم بشبكة الصرف الصحي	بلدة برطعة
	التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
	2023
	مدة التنفيذ
	2026-2023

أهداف مكون البرنامج/المشروع	**الفئة/ات المستهدفة(مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)**	**عدد المستفيدين المتوقع**	**الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها**
ربط جميع المنازل بشبكة الصرف الصحي	جميع فئات المجتمع	3000	تحسين الخدمات الاساسية

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					**المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/ المشروع**
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...الخ)حسب مراحله	**التكلفة التقديرية($) حسب سنوات الخطة**				
	الأولى	**الثانية**	**الثالثة**	**الرابعة**	
تجهيز المخططات والعطاءات	2	3	1	1	• لا يوجد
تمديد الخطوط	48	297	74	74	
المجموع (بالأرقام)	**500**				

متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*	**عملية الإدارة والتشغيل والصيانة***
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني	**كيف؟** **من خلال معدات وطواقم البلدية**
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	**من؟ عمال وموظفي البلدية**
	العائد المادي السنوي المتوقع($)
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة	☐ نعم ☒ لا

جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	**جهات أخرى (حدد)**
قسم الهندسة	
جهة التمويل المقترحة	

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: تمديد خطوط صرف صحي ووصلات منزلية بطول 5 كم	**الرقم: INF/9**	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	**جهات أخرى (حدد)**	
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:الصرف الصحي	سلطة المياه الفلسطينية	
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع : ☐ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☒ غير متوفرة	هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا	
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية : ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	بناء قدرات الجهات المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب(حدد):_____	
دراسات / مخططات : ☐متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غيرمطلوب	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع[13]		
سلبية: تعطيل حركة السير اثناء التنفيذ وتخريب الشارع	**إيجابية: المحافظة على المياه الجوفية وتوفير تكاليف النضح**	**تدابير التخفيف: ايجاد طرق بديلة واعادة تزفيت الشوارع**
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		**إجراءات التغلب عليها**
عدم كفاية التمويل		تمديد الخطوط الملحة من موازنة البلدية
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*		
داخل المخطط الهيكلي		

[13] * قد لا تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/المشاريع مثل: بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وكذلك الدراسات والبحث والتطوير.

5. اضافة لوحات ارشادية وتزيين الشوارع

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: اضافة لوحات ارشادية وتزيين الشوارع	**الرقم: INF/11**	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع	**مكان التنفيذ**
يعتبر هذا المشروع التكميلي مهما وحيويا حيث انه يطفى لمسة جمال على المنظر العام للبلدة ناهيك عن اثره الكبير في تسهيل السلامة المرورية ومساعدة الناس في الوصول الى المكان المطلوب بسهولة ويسر وامان حيث سيتم العمل في هذا المشروع على تركيب يافطات بأسماء الشوارع ودهان الارصفة والشواخص المرورية	بلدة برطعة
	التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
	2023
	مدة التنفيذ
	2025-2023

أهداف مكون البرنامج/المشروع	**الفئة/ات المستهدفة(مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)**	**عدد المستفيدين المتوقع**	**الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها**
تحسين المظهر العام للبلدة وتسهيل حركة المواطنين	جميع فئات المجتمع	7000	تحسين المظهر الجمالي وتطوير الخدمات

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...الخ)حسب مراحله	**التكلفة التقديرية($) حسب سنوات الخطة**				**المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/ المشروع**
	الأولى	**الثانية**	**الثالثة**	**الرابعة**	
دهان الارصفة والشواخص المرورية	2	4	5		• تأهيل وتعبيد الطرق
يافطات اسماء الشوارع	8	1	0		
المجموع (بالأرقام)	**20**				

متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*	**عملية الإدارة والتشغيل والصيانة***
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني	**كيف؟ من خلال قسم التشغيل والصيانة ومعدات البلدية**
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	**من؟ عمال وطواقم البلدية**
	العائد المادي السنوي المتوقع($)
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة	☐ نعم ☒ لا

جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	**جهات أخرى (حدد)**
قسم الهندسة والاشغال	

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: اضافة لوحات ارشادية وتزيين الشوارع	**الرقم: INF/11**	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية
جهة التمويل المقترحة		
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	**جهات أخرى (حدد)**	
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:صيانة الطرق		
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع : ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية : ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهات المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب(حدد):_____
دراسات / مخططات : ☒متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☒ مطلوب جزئيا ☐ غيرمطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع[14]		
سلبية: لا يوجد	**إيجابية:** **تسهيل حركة المواطنين بسهولة وامان**	**تدابير التخفيف:**
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		**إجراءات التغلب عليها**
العمل في الشوارع المكتظة		العمل بالليل
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*		
داخل المخطط الهيكلي		

[14] * قد لا تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/المشاريع مثل: بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وكذلك الدراسات والبحث والتطوير.

6. توريد حاويات نفايات

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: توريد حاويات نفايات	**الرقم: INF/12**	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		**مكان التنفيذ**
تحتاج البلدة إلى زيادة عدد الحاويات فيها حيث أن 1000 حاوية لا تكفي لتلبية احتياجات السكان إضافة إلى أن زيادة عدد الحاويات سيعمل على التقليل من آثار التلوث البيئي وتقليل نسبة النفايات الموجودة على الطرق والشوارع ويعطي منظر بيئي نظيف وجميل للبلدة.		بلدة برطعة
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
		2023
		مدة التنفيذ
		2025-2023

أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة(مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها
توفير حاويات كفاية لحاجة المواطنين	سكان البلدة	2500	تحسين جودة الخدمات المقدمة

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/ المشروع
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...الخ)حسب مراحله	التكلفة التقديرية($) حسب سنوات الخطة				
	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	
توريد حاويات	5	5	5		• توفير سيارة جمع نفايات
المجموع (بالأرقام)	**15**				

متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*	عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني	**كيف؟ من خلال عمال قسم الصحة ومعدات القسم من شاحنات وغيرها**
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	**من؟ عمال النفايات**
	العائد المادي السنوي المتوقع($)
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة	☐ نعم ☒ لا

جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	**جهات أخرى (حدد)**
قسم الصحة	

جهة التمويل المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	**جهات أخرى (حدد)**

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: توريد حاويات نفايات	**الرقم: INF/12**	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:جمع النفايات		
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع : ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية : ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهات المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب(حدد):_____
دراسات / مخططات : ☐متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غيرمطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع[15]		
سلبية: التضيق على الشوارع	**إيجابية: توفير الخدمات بالشكل الصحيح للمواطنين**	**تدابير التخفيف: تجميعها في الاماكن الواسعة بالشارع**
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		**إجراءات التغلب عليها**
عدم توفر التمويل		مساهمات من المواطنين
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*		
داخل المخطط الهيكلي		

[15] * قد لا تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/المشاريع مثل: بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وكذلك الدراسات والبحث والتطوير.

7. توريد شاحنة نضح وتسليك مجاري

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: توريد شاحنة نضح وتسليك مجاري	**الرقم: INF/13**	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		**مكان التنفيذ**
وجود شبكة الصرف الصحي في بلدة برطعة بما تحتويه من خطوط رئيسية ومناهل رئيسية تحتاج اثناء تشغيلها الى سيارة النضح والتسليك التي تفتح الخطوط والمناهل التي تتعرض لتسكير ووجود هذه السيارة يساعد بفتح الخطوط بشكل اسرع ويوفر الرسوم التي ندفعها للموردين الخارجيين بالاضافة الى الحفاظ على الطبيعة وتقليل المياه المتسربة بالشوارع.		برطعة
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
		2023
		مدة التنفيذ
		2023

أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة(مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها
1-فتح وتسليك الخطوط 2-توفير المصاريف الخارجية 3-الحفاظ على البيئة	جميع سكان البلدة	8000	تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/ المشروع
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...الخ)حسب مراحله	التكلفة التقديرية($) حسب سنوات الخطة				
	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	
توريد سيارة النضح	120				شبكة صرف صحي
المجموع (بالأرقام)	**120**				

متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*	عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني	**كيف؟ من خلال توظيف طاقم لتشغيل الشاحنة وعمل الصيانة الدورية لها**
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	**من؟ سائق وفني من طواقم البلدية**
	العائد المادي السنوي المتوقع($)
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة	☐ نعم ☒ لا

جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	**جهات أخرى (حدد)**
قسم الصحة والبيئة	

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: توريد شاحنة نضح وتسليك مجاري	**الرقم: INF/13**	**البرنامج:** برنامج تحسين سبل العيش وتطوير البنية التحتية
جهة التمويل المقترحة		
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		**جهات أخرى (حدد)**
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:الصرف الصحي		البلجيك
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع : ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية : ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهات المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب(حدد):_____
دراسات / مخططات : ☒متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☒ غيرمطلوب

الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع[16]		
سلبية: تسكير الشوارع اثناء فتح المناهل	**إيجابية: تخفيف العبء المادي والوقت والحفاظ على الطبيعة**	**تدابير التخفيف: ايجاد مسار بديل وتنظيم حركة السير**

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		**إجراءات التغلب عليها**
عدم كفاية التمويل		اكمال التمويل من البلدية

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*
داخل المخطط الهيكلي

[16] * قد لا تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/المشاريع مثل: بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وكذلك الدراسات والبحث والتطوير.

8. بناء مقر جديد للعيادة الصحية الحكومية

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: بناء مقر جديد للعيادة الصحية الحكومية	**الرقم: SO – 02/1**	**البرنامج:** تحسين جودة الخدمات الصحية

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع	**مكان التنفيذ**
يوجد في البلدة مقر للعيادة الصحية الحكومية بحالة سيئة للغاية وهو ضيق ولا يقدم الخدمات الصحية الكاملة وانطلاقا من هذا السبب فالبلدة بحاجة الى مقر جديد مؤهل لاستقبال المراجعين يحتوي على العديد من التخصصات المتنوعة بشكل فاعل وامن	برطعة
	التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
	2023
	مدة التنفيذ
	2024-2023

أهداف مكون البرنامج/المشروع	**الفئة/ات المستهدفة(مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)**	**عدد المستفيدين المتوقع**	**الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها**
توفير الخدمات الصحية المنوعة المناسبة	جميع سكان البلدة والقرى المجاورة	8000	رفع جودة الخدمات الصحية

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					**المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/ المشروع**
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...الخ)حسب مراحله	**التكلفة التقديرية($) حسب سنوات الخطة**				
	الأولى	**الثانية**	**الثالثة**	**الرابعة**	
بناء مقر العيادة الصحية الحكومية	150	50			تشغيل العيادة من وزارة الصحة
المجموع (بالأرقام)	**200**				

متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*	**عملية الإدارة والتشغيل والصيانة***
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني	**كيف؟ سيتم تشغيل العيادة من قبل طاقم من وزارة الصحة وستقوم البلدية بأعمال الصيانة الدورية**
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	**من؟ طاقم وزارة الصحة**
	العائد المادي السنوي المتوقع($)
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة	☐ نعم ☒ لا

جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	**جهات أخرى (حدد)**
قسم الهندسة والمشاريع	المجتمع المحلي

جهة التمويل المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	**جهات أخرى (حدد)**

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: بناء مقر جديد للعيادة الصحية الحكومية	**الرقم: SO – 02/1**	**البرنامج:** تحسين جودة الخدمات الصحية
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: صيانة المقرات	المجتمع المحلي	
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع : ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية : ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات / مخططات : ☒متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهات المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب(حدد):_____ دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غيرمطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع[17]		
سلبية: لا يوجد	**إيجابية:** **توفير الخدمات الطبية الصحية للمواطنين**	**تدابير التخفيف: لا يوجد**
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		**إجراءات التغلب عليها**
عدم توفر التمويل الكافي من المجتمع المحلي		اكمال التمويل من البلدية
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*		
داخل المخطط الهيكلي		

[17] * قد لا تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/المشاريع مثل: بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وكذلك الدراسات والبحث والتطوير.

9. تعيين مراقبين ومنظمين للسوق التجاري

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: تعيين مراقبين ومنظمين للسوق التجاري	**الرقم: ECO/8**	**البرنامج:** تنمية الاقتصاد المحلي
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		**مكان التنفيذ**
يعتبر السوق التجاري هو العصب الاساسي للحياة الاقتصادية في بلدة برطعة ويمتد من جنوبي البلدة الى شمالها بمحاذاة الخط الاخضر وهو مصدر الدخل الاساسي للبلدية ولا بد من تنظيمه والحفاظ عليه لذا تقوم البلدية بتعيين مراقبين ومنظمين لحركة السير فيه بشكل دوري		سوق برطعة
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
		2023
		مدة التنفيذ
		2026-2023

أهداف مكون البرنامج/المشروع	**الفئة/ات المستهدفة(مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)**	**عدد المستفيدين المتوقع**	**الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها**
الحفاظ على السوق وتنظيمه	التجار والمتسوقين	4000	تنمية الاقتصاد المحلي

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					**المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/ المشروع**
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...الخ)حسب مراحله	**التكلفة التقديرية($) حسب سنوات الخطة**				
	الأولى	**الثانية**	**الثالثة**	**الرابعة**	
تعين مراقبين ومنظمين	12	14	12	12	لا يوجد
المجموع (بالأرقام)	**50**				

متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*	**عملية الإدارة والتشغيل والصيانة***
☐ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذو بعد مكاني	**كيف؟ من خلال ادارة البلدية لطاقم الموظفين المراقبين والمنظمين**
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	**من؟ المراقبين والمنظمين**
	العائد المادي السنوي المتوقع($)
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة	☐ نعم ☒ لا

جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	**جهات أخرى (حدد)**
قسم الصحة	

جهة التمويل المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	**جهات أخرى (حدد)**

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: تعيين مراقبين ومنظمين للسوق التجاري	**الرقم: ECO/8**	**البرنامج:** تنمية الاقتصاد المحلي
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: منظم سير		
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية : ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهات المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب(حدد):_____
دراسات / مخططات : ☒متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غيرمطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع[18]		
سلبية: لا يوجد	**إيجابية: تنظيم السوق التجاري والحفاظ عليه**	**تدابير التخفيف: لا يوجد**
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		**إجراءات التغلب عليها**
عدم التجاوب معهم من التجار		تنفيذ المخالفات والغرامات
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*		
داخل المخطط الهيكلي		

[18] * قد لا تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/المشاريع مثل: بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وكذلك الدراسات والبحث والتطوير.

10. توسعة المخطط الهيكلي

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: توسعة المخطط الهيكلي	**الرقم: GOV/1**	**البرنامج:** برنامج التنظيم وبناء القدرات
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		**مكان التنفيذ**
يوجد في البلدة مخطط هيكلي جزئي تم اعداده سنة 1994 بمساحة 432 دنم ولغاية الان لم يتم المصادقة على مخطط جديد والبلدة بحاجة ماسة لإعداد مخطط جديد بمساحة لا تقل عن 3000 دنم حيث ترتب على وجوده تفعيل عملية التنظيم وترخيص المباني والمحافظة على الشوارع والارتدادات وتنظيم اماكن البناء.		بلدة برطعة
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
		2023
		مدة التنفيذ
		2024-2023

أهداف مكون البرنامج/المشروع	**الفئة/ات المستهدفة(مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)**	**عدد المستفيدين المتوقع**	**الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها**
المحافظة على الشوارع وتنظيم عملية البناء	جميع سكان البلدة	8000	القدرة على تقديم الخدمات بشكل افضل

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...الخ)حسب مراحله	**التكلفة التقديرية($) حسب سنوات الخطة**				**المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/ المشروع**
	الأولى	**الثانية**	**الثالثة**	**الرابعة**	
توسعة المخطط الهيكلي	50	20			المخطط الهيكلي الجزئي
المجموع (بالأرقام)	**70**				

متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*	**عملية الإدارة والتشغيل والصيانة***
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني	**كيف؟ من خلال طواقم البلدية سيتم تطبيق المخطط الهيكلي وتفاصيله**
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	**من؟ قسم التخطيط والتنظيم**
	العائد المادي السنوي المتوقع($)
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة	☐ نعم ☒ لا

جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	**جهات أخرى (حدد)**
قسم الهندسة	

جهة التمويل المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	**جهات أخرى (حدد)**

ملخص مكون برنامج /مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: توسعة المخطط الهيكلي	**الرقم: GOV/1**	**البرنامج:** برنامج التنظيم وبناء القدرات
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: لا يوجد	وزارة الحكم المحلي	
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع : ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية : ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات / مخططات : ☒متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهات المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب(حدد):ورشة عمل للتنظيم والترخيص دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غيرمطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع[19]		
سلبية: صعوبة تطبيق المخطط على الوضع الراهن	**إيجابية: تنظيم البلدة والمحافظة على الشوارع والارتدادات**	**تدابير التخفيف: ايجاد البدائل وتخفيف الاحكام**
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		**إجراءات التغلب عليها**
عدم المصادقة من قبل الاحتلال		تبني المخطط وتطبيقه
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*		
داخل المخطط الهيكلي		

[19] * قد لا تنطبق هذه البنود على بعض مكونات البرامج/المشاريع مثل: بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وكذلك الدراسات والبحث والتطوير.

ت. ملحقات التقرير التشخيصي

مرفق (1) تعريف عام عن البلدية

ملف تعريفي للبلدية		
اسم البلدية	بلدية برطعه الشرقية	
فاكس	042465466	
تلفون	042465467	
البريد الإلكتروني	info@bartaa.ps	
اسم رئيس البلدية:	غسان قبها	
رقم الجوال:	0599675634	
الإيميل:	hamoodigh2010@gmail.com	
جهة الإتصال والتواصل	الاسم:	غسان قبها
	المسمى الوظيفي:	رئيس البلدية
	الإيميل:	hamoodigh2010@gmail.com
	رقم تلفون:	0599675634
المحافظة	جنين	
تصنيف البلدية	الحكم المحلي: (C)	صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية: (C)++
هل البلدية جزء من مجلس خدمات مشترك/ أو مجلس تخطيط وتطوير	☒ نعم	☐ لا
إذا كانت الإجابة نعم، ماهي المجالس المحلية المشاركة:		
مجلس خدمات قرى خلف الجدار		
عدد السكان (المصدر):	5264 نسمة (البلدية)	
عدد الخدمات التي تقدمها البلدية:	26	
عدد الموظفين المسكنين:	8	
أعضاء المجلس المحلي المنتخبين:	11	

مرفق (2): التقييم المؤسسي والمجالات والتدخلات الفنية المقترحة

المحور الأول: الإدارة والموارد المالية				
مجال التركيز الفني	**ملخص التقييم المؤسسي**			**التدخلات المقترحة**
1. تحصيل رسوم الخدمات الأساسية (الكهرباء –اختياري)	أ- نسبة التحصيل للفرد بالشيكل		لا ينطبق	
	ب- نسبة الجباية من الخدمات الرئيسة			
	المياه	2022	لا ينطبق	
	مراقبة المباني ورخص البناء	2022	لا ينطبق	
	الصرف الصحي	2022	33150	
	تنظيم الأسواق العامة	2022	لا ينطبق	
	جمع النفايات	2022	576970	
	الكهرباء	2022	لا ينطبق	
2. ضريبة الأملاك (بما يشمل ضريبة المعارف)	لا ينطبق			
3. الإدارة المالية	أ- نسبة (الإيرادات ÷ النفقات) المتأتية من النشاط التشغيلي	2015	2016	
		1.63	1.46	
	ب- نسبة (الإيرادات ÷ النفقات) المتأتية من النشاط الاستثماري	-	-	

المحور الأول: الإدارة والموارد المالية					
مجال التركيز الفني	**ملخص التقييم المؤسسي**				**التدخلات المقترحة**
	ث-نسبة (الإيرادات ÷ النفقات) الكلية	1.63	1.46		
	ج-نسبة العجز أو الفائض التشغيلي	-	-*		
	ح- متأخرات فواتير الكهرباء	لا ينطبق	لا ينطبق		
	خ- متأخرات فواتير المياه	لا ينطبق	لا ينطبق		
4. الأنظمة المالية	IFMISأ -توفر نظام إدارة مالية متكامل		✓		
	IFMISاب- الجوانب التي يغطيها نظام الإدارة المالية الموحد				
	المحاسبة		✓		
	الفوترة		✓		
	التحصيلات		✓		
	إدارة المشاريع		✓		
	إدارة الأصول الثابتة		✓		
	المخازن		✓		
	الموازنات		✓		
	أخرى				
5. إعداد الموازنات	أ - الوضع المالي المتوقع للهيئة		ايرادات:3837200		

المحور الأول: الإدارة والموارد المالية				
مجال التركيز الفني	**ملخص التقييم المؤسسي**			**التدخلات المقترحة**
	المحلية حسب النشاط التشغيلي 2023		نفقات: 3486500	
	ب- الوضع المالي الفعلي للهيئة المحلية حسب النشاط التشغيلي 2022		ايرادات:3254237 نفقات: 2707456	
6. توليد الإيرادات	-			
7. التخطيط التنموي المحلي	-			

المحور الثاني: الشفافية والمساءلة		
مجال التركيز الفني	**ملخص التقييم المؤسسي**	**التدخلات المقترحة**
1. مأسسة المشاركة المجتمعية في تركيبة/هيكلة البلدية	لا يوجد في نظام البلدية اعتماد سياسات المشاركة المجتمعية ومقتصر فقط على متطلبات المانحين	اعتماد سياسات البلدية بمشاركة المجتمع المحلي بتنفيذ المشاريع وآلية اختيارها
2. زيادة المشاركة المجتمعية	المشاركة المجتمعية ضعيفة نوعا ما في البلدية وتقتصر على إعداد الخطة الاستراتيجية	إقرار اجتماعات تشاورية دورية مع المجتمع المحلي

المحور الثاني: الشفافية والمساءلة		
مجال التركيز الفني	ملخص التقييم المؤسسي	التدخلات المقترحة
3. **دعم وتحسين مشاركة فئات النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة**	قلة النشاطات الداعمة للشباب والمرأة	اعتماد برامج وتدريبات لمشاركة الشباب والنساء بالعمل المجتمعي وتأهيل مباني البلدية والمراكز العامة لدخول المعاقين إليها
4. **تعزيز المساءلة والشفافية في البلدية**	يوجد صندوق للشكاوى في البلدية ونظام لتقديم الشكاوى عند السكرتارية.	عقد اللقاءات المفتوحة مع المجتمع المحلي بشكل دوري

المحور الثالث: إدارة وتقديم الخدمات وفعالية العمليات		
مجال التركيز الفني	ملخص التقييم المؤسسي	التدخلات المقترحة
1. **التخطيط الفيزيائي (الحضري، استخدامات الأراضي، أنظمة المعلومات الجغرافية)**	يوجد تخطيط هيكلي باستمرار ولكن لا يوجد مصادقة بسبب سياسة الاحتلال.	تفعيل نظام الأبنية والترخيص في البلدة بوجود المحددات والقوانين الخاصة بوضع البلدة
2. **المشتريات**	تتم عملية المشتريات في البلدية وفق الاحتياج وبناء على الموازنات المقترحة	اعتماد نظام للشراء في البلدية وتعيين موظف خاص بالمشتريات وإجراءات عمليات الشراء
3. **رخص البناء والحرف والصناعات**	يتم إصدارها حسب الصول المتبعة من الحكم المحلي ووزارة الصحة	اعتماد نظام إلكتروني لإصدارها وأرشفتها

المحور الثالث: إدارة وتقديم الخدمات وفعالية العمليات		
مجال التركيز الفني	**ملخص التقييم المؤسسي**	**التدخلات المقترحة**
4. **التشغيل والصيانة**	تتم أعمال الصيانة وفق الاحتياج وحدوث الطوارئ	توثيق أعمال الصيانة وأرشفتها
5. **إدارة النفايات الصلبة**	تتم عملية جمع النفايات الصلبة وفق آلية معتمدة إلى نقطة الترحيل ومن ثم إلى زهرة الفنجان	إعادة دراسة تكاليف احتساب الخدمة وأتمتة عملية الجمع وتنظيمها
6. **المنافع (المياه، الكهرباء، المياه العادمة، الخ)**	تحت إدارة جمعية برطعه	تحت إدارة جمعية برطعه
7. **مراكز خدمة الجمهور**	لا يوجد في البلدية	بحاجة إلى إنشاء مركز خدمات جمهور حسب الأصول
8. **نظام إدارة الموارد البشرية**	يوجد نظام للموارد البشرية يدار م قبل السكرتارية	بحاجة إلى وضع نظام خاص بالموارد البشرية وتفعيل الحوافز والخصيمات

المحور الرابع: الإطار السياساتي والتنظيمي		
مجال التركيز الفني	**ملخص التقييم المؤسسي**	**التدخلات المقترحة**
1. **القدرات القانونية في البلدية**	البلدية متعاقدة مع مكتب قانوني استشاري للمحاماة لمتابعة قضايا البلدية	توعية العاملين في البلدية والأعضاء بقوانين الحكم المحلي والهيئات

مرفق (3) :دليل التجمع السكاني لبلدة برطعه الشرقية

دليل التجمع السكاني لبلدة برطعه الشرقية				
تاريخ التعبئة: 2023/1/10				
1. معلومات عامة				
• **الموقع**				
رمز التجمع بحسب الإحصاء المركزي	10120			
اسم التجمع	برطعه الشرقية			
• **الجغرافية**				
الموقع بالنسبة للمحافظة:	شمال غرب محافظة جنين			
البعد عن مركز المحافظة	30كم			
إحداثيات خطوط الطول والعرض	دائرة عرض 32,552 /خط طول 35,515			
الارتفاع عن سطح البحر	150-425م			
التجمعات السكانية المحيطة	شمال: عرعرة	جنوب: ظهر العبد	شرق: طوره الغربية	غرب: برطعه الغربية
معدل هطول الأمطار	400 إلى 600 ملم سنويا			
طبيعة الأراضي	☐ سهلية:	☒ جبلية:	☐ سهلية /جبلية:	
	مبنية: 3000دونم	زراعية: 3000 دونم	مراعي: 3000دونم	
	أحراش: 0	الأراضي المصادرة من الاحتلال: 500دونم		
المساحة الكلية للتجمع (دونم)	11104			
• **معلومات سكانية (السكان والموارد البشرية):**				
عدد السكان (نسمة)	5264			
نسبة الذكور	%51.5			
نسبة الإناث	%48.5			
نسبة من تقل أعمارهم عن 15 عام	%37.2			
نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عام	%2.9			

عدد الأسر	1,023
عدد الوحدات السكنية	1,407
نسبة الأمية	% 5
نسبة الحاصلين على شهادات بعد التوجيهي	%15
نسبة العاطلين عن العمل (بتعريف الإحصاء)	%13.9
نسبة العاملين في القطاع الحكومي (من مجموع العاملين الكلي)	% 7
نسبة العاملين في القطاع الخاص	% 40

المصدر الرئيسي لدخل السكان	وظائف حكومية	الزراعة	الصناعة	التجارة	داخل الخط الأخضر

- **الأيدي العاملة**

داخل التجمع								خارج التجمع	
								مناطق محيطة بالتجمع	داخل الخط الأخضر
مجال العمل	زراعة	موظف	تجارة وخدمات	صناعة وحرف	زراعة	موظف	تجارة وخدمات	صناعة وحرف	عمال في مختلف المهن
	5	40	200	100	0	30	20	10	500

2. البنية التحتية والبيئة

- **الطرق والمواصلات**
  - **المداخل الرئيسية للتجمع السكاني: (المصدر قسم الهندسة)**

أسماء المداخل الرئيسية	معبد (كم)		غير معبد
	بحالة جيدة	بحاجة إلى صيانة	
المدخل الرئيسي الجنوبي	1	2	0

- **شبكة الطرق الداخلية:**

نوع الطريق	معبد (كم)		مفتوحة (كم)	
	بحالة جيدة	بحاجة إلى صيانة	يوجد بيس كورس	لا يوجد
رئيسية	7	3	4	6
فرعية	7	4	6	4

- **النقل والمواصلات: (مسح ميداني)**

نوع الخدمة	موقعها	عددها	عدد الآليات/المركبات المتوفرة بالموقع	انتظام الخدمة (جزئي أو كلي)	كفايتها
محطة باصات مركزية	لا				
محطة باصات فرعية	نعم	1	1	جزئي	غير كافي
خط سرفيس داخلي	لا				
خط سرفيس خارجي	يوجد	1	5	جزئي	غير كافي
مكتب تاكسي	يوجد	1	4		
مجمع سفريات	لا				
مواقف السيارات الخاصة	لا				

- هل هنالك مناطق لا تصلها خطوط النقل العام؟ حدد.

اغلب مناطق البلدة لا تصلها خطوط النقل العام

- ما هو عدد الحوادث على الطرقات في المدينة/البلدة في السنة الماضية (سنة2021)؟ 200 حادث

أماكن تكرار الحوادث؟

في السوق التجاري ومفترقات البلدة

- حدد المناطق التي تشهد ازدحاما مروريًا أكثر من غيرها؟

السوق التجاري ومدخل البلدة

- **الطاقة:**

- **الكهرباء: المصدر (قسم الكهرباء)**

نسبة التغطية الجغرافية	مدة التغطية الزمنية (من أصل 24 ساعة في اليوم)	مصدر الكهرباء (قطرية/مولد /طاقة بديلة)	كمية الاستهلاك الشهري ونسبة الاستهلاك المنزلي منها (كيلوواط)	الاحتياج الفعلي الحالي	سنة الإنشاء	سعر شراء الكيلو واط من المصدر	سعر بيع الكيلو واط للمستهلك
%99	24	قطرية	350		1982	0.68	
إنارة الشوارع	نسبة تغطية الشوارع المعبدة: 99 %				نسبة الفاقد في الكهرباء: 2%		

- **الاتصالات:**

شبكة الهاتف الأرضي نسبة التغطية	80 %
شبكة الأنترنت نسبة التغطية:	80 %
شبكة الهاتف الخلوي نسبة التغطية	70 %

- المياه والصرف الصحي :

- **المياه:**

يوجد شبكة مياه داخلية	☐ لا	☒ نعم	نسبة الفاقد: 35 %

نسبة التغطية الجغرافية	مدة التغطية الزمنية (أسبوعيا أو شهريا)	المصدر (مكروت/مجلس خدمات مشترك /بئر خاص/آبار جمع مياه أمطار/غير ذلك)	كمية الاستهلاك الشهري ونسبة الاستهلاك المنزلي منها	الاحتياج الفعلي الحالي	سنة الإنشاء	سعر شراء المتر المكعب من المصدر	سعر بيع المتر المكعب للمستهلك
%90		نبع العين/ مكروت				4 شيكل	

اسم عين الماء: نبع العين	صالحة للشرب: نعم	غير صالح للشرب	معدل التدفق (م3/يوم)
			10

- **الصرف الصحي:**

طرق التخلص من مياه الصرف الصحي	☒ شبكة صرف صحي %	☒ حفر امتصاصية %	☐ الكمية المنتجة في اليوم
أماكن التخلص النهائية:	داخل الخط الأخضر		
هل يوجد محطة تنقية؟	☐ لا		☒ نعم **في الداخل الفلسطيني**

موقع المحطة	سنة التأسيس	كفاءة المحطة	وضعها/الحالة	السعة التصميمية	ملاحظات

هل يتم التخلص من مياه عادمة للمستوطنات في أراضي المدينة/البلدة؟ ☒ لا نعم: (وضح)_ _ _ _ _ _ _

- **النفايات الصلبة:**

طرق جمع النفايات الصلبة سيارات ضاغطة ترولة مع تركتور يدوي غير ذلك

طرق جمع النفايات الصلبة	☒ سيارات ضاغطة	☒ ترولة مع تركتور	☐ يدوي	☐ غير ذلك
نسبة التغطية الجغرافية	%95			
عدد مرات الجمع أسبوعيا: 2	رسوم الجمع الشهرية: 20 شيكل	عدد الحاويات وكفايتها: 1000 حاوية		
أماكن التخلص من النفايات الصلبة	☐ مكب خاص بالتجمع	☐ مكب عشوائي	☒ مكب إقليمي	
طريقة التخلص من النفايات الصلبة	☐ حرق	☐ دفن	☒ غير ذلك (حدد): زهرة الفنجان	
السعة الحالية للمكب	زهرة الفنجان			
الاحتياج الفعلي الحالي	----			
الخدمة تدار من قبل	☒ مجلس الهيئة المحلية	☐ قطاع خاص	☐ مجلس خدمات (حدد):	

3. الاقتصاد:

- **الصناعة والتجارة والخدمات المساندة:**

المنشآت	عددها	عدد العاملين فيها	موقعها

(تحدد بحسب تعريف الإحصاء)			
المنشآت الزراعية	2		
المنشآت الصناعية	100		
المنشآت السياحية	1		
المنشآت المتعلقة بالصناعات الإنشائية	10		
المنشآت الخدماتية	10		
المنشآت التجارية	1000		
البنوك	0		
• **السياحة والآثار:**			
المواقع الأثرية الرئيسية	عددها	نوعها	أسماؤها:
المواقع السياحية الرئيسية (بما يشمل ذات التميز الطبيعي كالإطلالات والأحراش وعيون المياه)	1		
عدد المكاتب السياحية	0		
عدد الفنادق	0		
مساحة المركز التاريخي ووصف لوضعه القائم	0		
• **الزراعة:**			
○ **الثروة الزراعية**			
مساحة الأراضي الزراعية/دونم[20]	3000		
مساحة الأراضي الزراعية المروية/دونم	0		
مساحة الأراضي الزراعية البعلية/دونم	3000		
مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح/دونم	1000		

[20] المصدر اللجنة الاقتصادية

مدى إيصالية الطرق الزراعية	جيد		
عدد الحيازات الزراعية حسب الإحصاء	نباتية:	حيوانية:	مختلطة:

- **الثروة الحيوانية:**

النوع	عدد المزارع	عدد الرؤوس	ملاحظات
الأبقار		147	
الأغنام		624	
دجاج لاحم		16000	
دجاج بياض		36200	
خلايا نحل		14	

- **المعاصر والمشاتل والجمعيات:**

عدد المعاصر	عدد المشاتل	عدد الجمعيات والتعاونيات الزراعية العاملة
2	0	0

- **خدمات زراعية:**

النوع	إرشاد	تسويق	تعبئة وتغليف	تصنيع	تخزين وتبريد	تمويل
المصدر	لا	لا	لا	لا	لا	لا
الكفاية						

- **خدمات بيطرية:**

المصدر	دائرة الزراعة والبيطرة	عيادة بيطرية خاصة
نسبة التغطية	% 70	% 25

- **المصادر الرئيسية للمياه المستخدمة في الزراعة:**

المصدر	النسبة (%)	عددها	الطاقة الإنتاجية	الملكية		الموقع بالنسبة للتجمع	
				خاصة	عامة	داخل التجمع	خارج التجمع
مياه أمطار	% 90						
أبار	0						

ارتوازية							
ينابيع	0						

- **الآليات الزراعية المستخدمة:**

النوع	تراكتور	بذارة	حصادة	آلات رش وتسميد	اليات أخرى	
العدد	0					
الملكية (عام، خاص، تعاوني)	0					

4. الوضع الاجتماعي:

- **الصحة:**

النوع	المستوى	عدد ساعات توفر الخدمة يوميا	التصنيف			
			عام/ حكومي	خاص	أهلي محلي	أهلي دولي
			العدد			
عيادة تشمل (طب عام + أمومة وطفولة + مختبر + صحة سنية)	1	6				
عيادة تشمل بالإضافة إلى البند الأول (أشعة + طوارئ + عيادات اختصاصات بدوام جزئي)	0					
مستوصف + تخصصات بدوام 24 ساعة	0					
مستشفيات عامة وخاصة	0					
مركز طبي خاص أشعة – عيادة تخصصية	0					
إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات	0					
إجمالي عدد الأطباء	10					
أماكن الحصول على الخدمات الصحية من خارج التجمع السكاني	جنين					

وإمكانية الوصول الهيا						

• **الثقافة والرياضة والجمعيات:**		
المجال	العدد	تقييم وضعها الحالي ومدى فعاليتها
نوادي رياضية	1	
جمعيات نسوية	0	
مراكز ثقافية	0	
مراكز أطفال	0	
مكتبة	1	
متحف	0	
حديقة عامة	1	
ملعب رياضي	1	
قاعة عامة	1	
أخرى		
• **مرافق عامة أخرى:**		
اسم المرفق	العدد	ملاحظات
مساجد	6	
كنائس	0	
مقابر	2	

5. . الإدارة والحكم الرشيد:

- **الوضع الإداري:**

تصنيف التجمع السكاني حسب هرمية الخدمات	☐ مركز إقليمي	☒ مركز شبه إقليمي	☐ مركز محلي	☐ مجاورة
نوع هيئة الحكم المحلي	بلدية			

عدد أعضاء هيئة الحكم المحلي	11
عدد موظفي هيئة الحكم المحلي الدائمين	20
هل تشترك في مجالس مشتركة (مجلس خدمات/ مجلس تخطيط وتطوير)	يرجى التحديد إذا كان الجواب نعم: مجلس خدمات قرى خلف الجدار

- **مرافق إدارية رسمية:**

المرافق	العدد	تقييم وضعها الحالي ومدى كفاءته
مكتب بريد	1	
غرفة تجارية	0	
مديرية تربية	0	
مديرية زراعة	0	
مديرية صحة	0	
مديرية شؤون اجتماعية	0	
مكتب داخلية	1	
دفاع مدني	1	
مخفر شرطة	0	
محكمة شرعية	0	
محكمة صلح	0	
مسلخ	0	
حسبة	0	

- **المخطط الهيكلي:**

هل يوجد مخطط هيكلي مصادق	☒ نعم، سنة التصديق: 1994	☐ لا

المساحة الكلية للتجمع (دونم)	11104
مساحة المخطط الهيكلي (دونم)	432
المساحة الخضراء (حدائق، أحراش، ...الخ)	50
مساحة الأراضي السكنية	2500
مساحة الأراضي الصناعية	100

مساحة الأراضي التجارية	400
مساحة الأراضي المستخدمة للطرق والمواصلات	200

الإمكانيات المادية المتاحة للهيئة المحلية (تكلفة المشاريع المنجزة لآخر أربع سنوات):

السنة	قيمة المشاريع المنجزة ($)	مساهمة الهيئة المحلية ($)	مساهمة الجهات الممولة ($)
الأولى (2018)	1200000	200000	1000000
الثانية (2019)	950000	250000	700000
الثالثة (2020)	700000	180000	520000
الرابعة (2021)	700000	190000	510000
المجموع	2470000	820000	2730000
المعدل السنوي ($)	617500	205000	682500

- **المشاريع الرئيسية (اكبر من 50000 دولار)**

المشاريع المنجزة خلال الأربع سنوات الأخيرة	الميزانية (دولار)	مصادر التمويل ونسبة كل مصدر
2018		
إنشاء خزان مياه علوي	400000	سلطة المياه الفلسطينية
تعبيد طرق داخلية	500000	الاتحاد الأوروبي
تعشيب الملعب الرياضي	100000	وزارة الشباب والرياضة
2019		
تأهيل وتعبيد طرق داخلية	500000	وزارة الحكم المحلي وبلدية برطعه
إنشاء خطوط رئيسية للصرف الصحي	60000	بلدية برطعه
إنشاء وصلات منزلية لشبكة الصرف الصحي	100000	صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
توريد جرافة انزلاقية	40000	الوكالة البلجيكية للتنمية
2020		
توريد سيارة نفايات ضاغطة	100000	الوكالة البلجيكية للتنمية
تمديد خطوط مياه ووصلات	120000	اتحاد لجان الإغاثة الزراعية
تعبيد الشارع الرئيسي	300000	وزارة الحكم المحلي
2021		

○ المشاريع الرئيسية (اكبر من 50000 دولار)		
بناء غرف صفية لمدرسة الفاروق	170000	وزارة الحكم المحلي
ترقيع الشوارع	40000	بلدية برطعه
تعبيد شارع الخربة	300000	وزارة الحكم المحلي

مرفق (4): تحليل جذور القضايا وأثرها على التنمية الشمولية للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والبيئة

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
مجال البيئة والبنية التحتية	ضعف القدرة الكهربائية وعدم مواكبة التوسع اللازم في أطوال الشبكة.	• قدم شبكة الكهرباء وحاجتها الى صيانة. • قلة مصادر الكهرباء والاعتماد على مصدر واحد. • عدم توفر مصادر بديلة للطاقة. ونظيفة. • عدم صيانة الشبكة بشكل دوري • عدم توفر المقدرة المالية لتوسعة الشبكة وتطويرها. • انتشار استخدام المكيفات صيفا وشتاء بسبب التغير المناخي والذي أدى إلى ارتفاع وانخفاض الشديد بدرجات الحرار مما أدى إلى زيادة الاحمال على الشبكة وعدم توفرها بشكل مستمر.	مرتفع	مرتفع	متوسط	متوسط	مرتفع		• يؤثر ضعف شبكة الكهرباء على جميع السكان بشكل عام، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي مما يؤدي الى توقف اعمالهم، واللجوء إلى استخدام المولدات الكهربائية والتي تؤدي إلى التأثير السلبي على البيئة والسكان اذ تطلق هذه المولدات كميات كبيرة من الانبعاثات الضارة (دخان/ الغاز) والذي يؤدي إلى زيادة نسبة الملوثات في البيئة المحيطة. • الاخطار المحتملة والناجمة عن قدم خطوط الشبكة. • انقطاع التيار الكهربائي المتكرر يتسبب في تلف الاجهزة الكهربائية وبالتالي يسبب خسارة مالية على المؤسسات والأسر. • ضعف شبكات الكهرباء يؤدي الى ضعف فرص الاستثمار وخلق مشاريع جديدة في المنطقة وبالتالي تكون فرص العمل الجديدة محدودة مما ينتج عن ذلك ارتفاع نسب البطالة
	ضعف البنية التحتية للطرق وحاجتها إلى التوسعة	• عدم وجود التمويل الكافي لدى البلدية لتحسين البنية التحتية للطرق. • عدم وجود صيانة دورية للطرق الداخلية	متوسط	مرتفع	متوسط	مرتفع	مرتفع		• التلوث البيئي بشكل عام. • الغبار الناتج عن عدم تزفيت الشوارع وأثرة على الصحة العامة للمواطنين. • تأثير انتشار الاتربة والغبار على إنتاجية المنتجات الزراعية والأشجار.

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
	والتأهيل ولتصريف مياه الأمطار.	أو الرابطة. • عدم وجود موارد مالية لتوسيع وتأهيل وتعبيد الطرق أو فتح طرق جديدة. • عدم توفر القدرة المالية لتأسيس شبكة تصريف أمطار.							• يؤثر ضعف البنية التحتية للطرق الداخلية على الأطفال حيث يؤدي الى زيادة عدد حوادث السير. • حالات تزحلق وفيضانات في فصل الشتاء بسبب عدم وجود شبكة تصريف مياه امطار. • يصعب التنقل على كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة بسبب ضعف البنية التحتية للطرق بحيث أنها لا تتناسب مع حالتهم الصحية. • شح المياه وعدم توفرها في جميع الاوقات وذلك بسبب عدم استغلال مياه الامطار. • يمكن أن يتسبب الصرف السيئ في حدوث انهيارات أرضية وتدفقات طينية قد تشكل خطرًا على الناس وممتلكاتهم. • الأثر السلبي على المناظر الجمالية للبلدة. • تتسبب الطرق السيئة الصيانة في وقوع حوادث بعدة طرق، ويرجع ذلك في الغالب إلى حقيقة أنها تشكل خطرا كبيرا على السائقين. في كثير من الحالات، قد يحاول السائق تجنب موقف معين، مثل حفرة أو تجمع المياه مما قد يتسبب في وقوع حادث خطير.
	ارتفاع نسبة التلوث وصعوبة	• عدم وجود الوعي الكافي لدى المواطنين بأهمية المحافظة على الصحة العامة والبيئة.	متوسط	متوسط	مرتفع	متوسط	متوسط		• انتشار الأمراض بين المواطنين. • تدهور البنية التحتية وجودة البيئة والحياة. • تصبح بيئة البلدة طاردة للسكان مما يكثر من عمليات الهجرة

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
	التخلص من مخلفات السوق التجاري والنفايات	• عدم مراعاة البنية التحتية في شتى المجالات لمعايير الصحة العامة والبيئة. • عدم مراعاة البنية التحتية في شتى المجالان لمعايير الصحة العامة والبيئة. • عدم اهتمام الجهات المسؤولة بنشر الوعي فيما يخص هذا المجال. • عدم وجود مكان خاص للتخلص من نفايات المحلات والسوق التجاري.							للمناطق الاخرى. • يؤثر على المناظر الجمالية للبلدة • تلوث الهواء والدخان الناتج عن حرق مخلفات المزارع وما يسببه من أمراض. • عدم الاهتمام بالبيئة يؤدي الى زيادة التلوث وبالتالي المشاركة بطريقة سلبية في زيادة مشاكل البيئة العالمية من انحباس حراري والتغير المناخي وانحسار المياه وغيرها. • انتشار للروائح الكريهة المنفرة. • تدهور جودة الحياة بشكل عام على السكان. • التأثير على المنتجات الزراعية بسبب التلوث الهوائي أو المائي، وبالتالي انعدام الامان الغذائي لدى المواطنين وحدوث خسائر اقتصادية عند المواطنين.
	عدم شمولية شبكة الصرف الصحي لكافة أحياء البلدة وتلوث المياه الجوفية نتيجة التسرب من الحفر	• عدم وجود مصادر مالية لدى البلدية من أجل انشاء شبكة للصرف الصحي. • عدم وجود نظام صرف صحي والاعتماد على الحفر الامتصاصية. • عدم وجود مصادر مالية كافية لحفر آبار أو انشاء برك تجميع للمياه. • عدم وجود مشاريع أو دراسات في مجال	مرتفع	مرتفع	مرتفع	مرتفع	مرتفع		• يؤثر عدم وجود شبكة صرف صحي على المجتمع المحلي بشكل عام وعلى جميع افراد البلدة بسبب التلوث البيئي الذي تتسبب به الحفر الامتصاصية. وهذا يتسبب بتسرب المياه العادمة الى المياه الجوفية وإلحاق اضرار بالأراضي الزراعية والتربة، لدى القاء المياه العادمة عشوائياً في الأودية بعد سحبها من الحفر الامتصاصية. **الصرف الصحي** • اختلاط المياه العادمة بالمياه الجوفية بسبب تسرب مياه الصرف غير المعالجة، مما يعرض صحة الإنسان والبيئة للخطر.

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
	الامتصاصية إلى المياه الجوفية وضعف البنية التحتية لشبكة المياه وعدم كفاية مصادر المياه.	المياه. • سياسة الاحتلال التي تصعب عملية حفر الآبار الجوفية. والتي تحد من كمية المياه التي تصل الى البلدات.							• انتشار الأمراض: قد يسبب عدم وجود شبكات الصرف الصحي انتشار الأمراض المرتبطة بجودة المياه والنظافة العامة، مثل الكوليرا والإسهال والتهاب الكبد الوبائي. • زيادة التلوث البيئي: تؤدي مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى زيادة التلوث البيئي بمواد كيميائية ومواد عضوية ومعادن ثقيلة، مما يؤثر سلبًا على النظم البيئية المائية وعلى التربة. • تدهور جودة الهواء: قد يتسبب عدم وجود شبكات الصرف الصحي في انبعاث روائح كريهة وغازات ضارة نتيجة تراكم مياه الصرف الملوثة وتفاعلاتها الكيميائية والبيولوجية. • كثرة الحشرات والقوارض نتيجة عدم وجود النظام الصحي. • تأثير سلبي على الاقتصاد: يمكن أن يؤثر عدم إنشاء شبكات الصرف الصحي سلبًا على الاقتصاد بسبب تكاليف مكافحة التلوث والأمراض والتأثير على الاقتصاد والاستثمارات. • تأثير على التنوع البيولوجي: يمكن أن يؤدي تلوث المياه الناجم عن عدم وجود شبكات الصرف الصحي إلى تدهور التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية المائية والتربة. • التأثير السلبي على البنية التحتية للشوارع والمنازل بسبب المياه العادمة. • مشاكل صحية: تلوث التربة بسبب تسرب المياه العادمة اليها. مما يتسبب في مشاكل صحية في حال استخدامها للأغراض المنزلية أو

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
									الزراعية. • تدمير الأراضي الزراعية: التخلص من المياه العادمة في الاراضي مما يتسبب تلوث الاراضي الزراعية بالمياه العادمة وبمشاكل بيئية وظهور الحشرات والحيوانات الزاحفة. • مشاكل اجتماعية: ينتج عن استخدام الحفر الامتصاصية إلى خلق مشاكل اجتماعية وعائلية بين السكان البلدة. **المياه** • عدم توفر مياه كافية للاستخدام البشري والاغراض الاخرى: يؤدي ضعف الحصاد المائي إلى تقليل إمكانية توفير المياه اللازمة للاستخدامات المتعددة مثل الزراعة والري والاستخدامات المنزلية والصناعية. • تأثير سلبي على الزراعة: قد يؤدي ضعف الحصاد المائي إلى تدهور الإنتاج الزراعي بسبب تقليل الرطوبة في التربة وزيادة معدلات تبخر المياه، مما يعرض الأمن الغذائي ومصادر الدخل للمزارعين للخطر. • تأثير على الصحة العامة: قد يؤدي ضعف الحصاد المائي إلى تزايد انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه والنظافة العامة، مثل الإسهال والتهاب الكبد الوبائي والملاريا. • النساء: قد يؤدي ضعف الحصاد المائي إلى تأثير سلبي على النساء اللائي يعتمدن على المياه في إدارة المنزل والزراعة. • الشباب: يمكن أن يؤثر ضعف الحصاد المائي على فرص عمل

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
									للشباب وإلى انخفاض مشاركة الشباب في سوق العمل وزيادة نسب البطالة. • ذوي الإعاقة: قد يؤدي ضعف الحصاد المائي إلى تدهور الظروف المعيشية لذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير المياه النظيفة والغذاء وفرص العمل.
	عدم نجاعة نظام إدارة خدمة جمع النفايات الصلبة وزيادة تكلفتها وضعف في جمع وترحيل النفايات.	• عدم وجود التمويل الكافي لإنشاء مشاريع متخصصة للتخلص من النفايات الصلبة. • عدم وجود مصانع تدوير. • قلة الوعي لدى المواطنين بأهمية فصل النفايات والحفاظ على النظافة. • عدد المكبات النموذجية في فلسطين لا يتناسب مع عدد الزيادة السكانية. • عدم توفر تمويل كافي لمعالجة النفايات الخطرة. • موقع البلدة داخل الخط الاخضر مما يشكل من صعوبات في التخلص من النفايات.	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط		• التلوث البيئي: قد يؤدي ضعف إدارة النفايات الصلبة إلى تلوث التربة والمياه الجوفية والهواء، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالبيئة والضارة بالموارد الطبيعية. • تدهور البنية التحتية وجودة البيئة والحياة: يمكن أن يسبب ضعف إدارة النفايات الصلبة مشاكل في النظافة العامة والبنية التحتية، مما يؤثر سلبًا على جودة البيئة والحياة لسكان البلدة والبلدات الفلسطينية • تأثير على التنوع البيولوجي: يمكن أن يضر ضعف إدارة النفايات الصلبة بالتنوع البيولوجي، حيث يمكن أن يؤدي التلوث الناجم عن تراكم النفايات إلى تدهور أو ضعف البيئة الطبيعية. • زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري: قد يؤدي ضعف إدارة النفايات الصلبة إلى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عمليات التحلل والحرق غير المنظم، مما يزيد من تأثير التغير المناخي. • استنزاف الموارد: يمكن أن يؤدي ضعف إدارة النفايات الصلبة إلى

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
		• السياسات الإسرائيلية وتهريب العديد من النفايات الصلبة والصهاريج السائلة من المستوطنات وضخها في الاراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني							استنزاف الموارد الطبيعية بسبب ضعف عمليات إعادة التدوير والاستفادة من المواد المستخدمة. • تأثير سلبي على التربة: تأثر التربة على المدى البعيد بسبب عدم تحلل العديد من المواد فيها (مثل البلاستيك) بالإضافة إلى تأثر المياه الجوفية وتلوث الاتربة والاراضي الزراعية مما يؤدي الى مشاكل كبيرة في المستقبل من تصحر وتصبح الأراضي غير صالحة للزراعة بسبب عدم القدرة من التخلص من النفايات فيها. • انتشار الحشرات والقوارض: انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض بسبب تراكم النفايات. • المناظر الطبيعية والبيئية والجمالية: يؤثر سلبا على المنظر البيئية والجمالي للبلدة. • نفور الزوار وضعف السياحة المحلية: نفور السياح وعدم قدومهم الى البلدة بسبب انتشار النفايات وعدم التخلص منها بالطرق السليمة. • النساء: قد تتأثر صحة النساء بشكل خاص بسبب التلوث الناجم عن إدارة ضعيفة للنفايات الصلبة، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في ظروف معيشية سيئة وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالتلوث البيئي. • الشباب: يمكن أن تؤدي إدارة ضعيفة للنفايات الصلبة إلى تدهور البيئة وتأثير سلبي على فرص التعليم والعمل للشباب في المجتمع. قد يؤثر ذلك على جودة الحياة والنمو الاقتصادي المستقبلي.

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
مجال تنمية الاقتصادي المحلي									• ذوي الإعاقة: يمكن أن يتأثر ذوي الإعاقة بشكل خاص بسبب إدارة ضعيفة للنفايات الصلبة، حيث يمكن أن تزيد من التحديات المتعلقة بالتنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل. • كبار السن: قد تتأثر صحة كبار السن بشكل أكبر بسبب التلوث الناجم عن إدارة ضعيفة للنفايات الصلبة، حيث يمكن أن يزيد ذلك من مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالبيئة.
	محدودية توفر الايدي العاملة الحرفية والمهنية وحاضنة أعمال خاصة بالفئات المهمشة (نساء وشباب واشخاص ذوي إعاقة).	• توجه الشباب للتعليم الأكاديمي بشكل أكبر بكثير من المهني أو الحرفي. • عدم وجود الدعم الكافي لذوي المهن أو الحرف. • النظرة السائدة حول أن العمل بالمجال الأكاديمي أفضل من المهني. • عدم تقديم التوعية الكافية حول أهمية المهن الحرفية والمهنية. • المردود المالي من هذه المهم غير كافي وقليل بالمقارنة بالمردود في الداخل. • الثقافة السائدة والعادات والتقاليد التي تقيد من المرأة ودورها.	مرتفع	مرتفع	مرتفع	متوسط	متوسط		• تفاقم الفقر قد يؤدي ضعف الاهتمام بالمجالات المهنية إلى تفاقم مشكلة الفقر. • عدم وجود توازن في توزيع الاعمال حيث هناك نسبة بطالة عالية في الاعمال الاكاديمية ونقص في الايدي العاملة في المجال المهني الحرفي. • تراجع الصحة النفسية والجسدية للشباب. • هجرة الشباب للعمل في الداخل بسبب ارتفاع نسبة الاجور. • الزواج المبكر لفئة النساء بسبب تهميش دورهم في المجال العملي والمهني. • تأثر ذوي الاعاقة سلبيا بسبب عدم توفير فرص عمل لهم في أي مجال.

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على					التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
		• الخجل من حالات ذوي الاعاقة وعدم دعمهم وتطويرهم.							
	ضعف الاهتمام بالزراعة وتدني مستوى الخبرات الزراعية.	• عدم تقديم الدعم اللازم للمزارعين. • عدم توفر المياه الكافية للزراعة وغلاء اسعارها. • طبيعة اراضي البلدة البلية. • صعوبة الوصول الى الاراضي الزراعية بسبب ضعف البنية التحتية للطرق وعدم فتح طرق زراعية كافية. • عدم دعم التسويق للمنتج الفلسطيني الزراعي. • عدم بناء قدرات المزارعين وتطويرها عن دورات وتدريبات واعتمادهم على الطرق التقليدية للزراعة وعلى المواسم	منخفض	منخفض	متوسط	منخفض	متوسط		• الاستدامة المحلية: عدم استدامة الاستخدام المحلي للموارد الطبيعية. • زيادة في استخدام الوقود: زيادة النقل والشحن والذي يؤدي إلى زيادة في استخدام الوقود وبالتالي إلى تلوث البيئة. • النساء: غالبًا ما يشارك النساء في العمل الزراعي ورعاية الماشية. قد يؤدي ضعف القطاع الزراعي إلى زيادة بطالة النساء وتقليل دخل الأسرة، مما يؤثر على قدرتهن على توفير تعليم ورعاية صحية لأنفسهن وأطفالهن. • الشباب: قد يؤدي ضعف القطاع الزراعي إلى انخفاض فرص العمل والتوظيف بالنسبة للشباب في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى هجرة الشباب إلى المناطق الحضرية بحثًا عن فرص عمل أفضل. • ذوي الإعاقة: يمكن أن يؤدي ضعف القطاع الزراعي إلى تقليل الخيارات المتاحة لذوي الإعاقة للعمل في المجال الزراعي، مما يؤثر على قدرتهم على الاندماج في سوق العمل والمشاركة في النشاط الاقتصادي. • لذا، يعتبر تعزيز القطاع الزراعي وتنويع الاقتصاد الوطني أمرًا بالغ الأهمية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة والمجتمعات المحلية.

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على					التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
									• كبار السن: يصعب على كبار السن الوصول الى أراضيهم الزراعية، وبالإضافة الى توقفهم عن الزراعة وذلك بسبب استعمال الطرق التقليدية واليدوية بحيث لا تتناسب مع قدراتهم الجسدية. • زيادة في نسبة الفقر: زيادة نسبة الفقر لدى الكثير من العائلات بسبب عدم القدرة على تسويق منتجاتهم الزراعية.
	قلة الاهتمام بالأماكن السياحة الداخلية والبيئية والطبيعية في البلدة.	• عدم دعم القطاع السياحي والترفيهي. • عدم الاهتمام المناطق الأثرية والسياحية في البلدة وترميمها. • عدم تسويق المناطق الأثرية والسياحية الموجودة أو نشر منشورات تثقيفية حولها داخل فلسطين أو خارجها لجذب السياح. • ضعف البنى التحتية في البلدة. • موقع البلدة داخل الخط الاخضر يشكل صعوبة على سكان الضفة القدوم اليها.	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط		• يؤثر على الشباب بسبب عدم وجود فرص عمل في هذا المجال. • ركود اقتصادي بسبب عدم الاستثمار في المجال السياحي • حالة من الجهل المجتمعي حول تاريخ وطنهم والاماكن المهمة والتاريخية الموجودة في العديد من المناطق. • يؤثر على اطفال البلدة وذلك بسبب عدم وجود أماكن ترفيهية لتفريغ طاقاتهم. • يؤثر بشكل سلبي على النساء بسبب عدم وجود مكان مناسب لقضاء أوقات الفراغ لديهم. • عدم توافد السياح من المناطق المختلفة بسبب عدم الترويج للمناطق السياحية المختلفة في البلدة وبسبب موقعها داخل الخط الاخضر مما يشكل صعوبة في دخولهم للبلدة. • نسب الاحتلال الاسرائيلي للعديد من المناطق الأثرية أنها تعود لهم بسبب عدم توثيقها فلسطينا.
	ضعف	• عدم التزام المواطنين بالقوانين والانظمة	متوسط	متوسط	متوسط	منخفض	متوسط		• المظهر العشوائي للبلدة.

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
مجال التنمية الاجتماعية	التنظيم للسوق التجاري وعشوائية المحال التجارية والصناعية.	الخاصة بالبناء. • عدم وجود رقابة. • المخطط الهيكلي بحاجة الى توسعة وتعديل. • عدم توفر المقدرة المالية لتنظيم البناء في البلدة.							• تداخل المحلات التجارية والصناعية مما يؤدي الى حدوث نزاعات. • عزوف البعض عن الذهاب لسوق البلدة واختيار اماكن اخرى للتسوق بسبب عدم التنظيم والعشوائية. • التلوث البيئي بسبب وجود المحلات التجارية والصناعية في نفس المكان.
	ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.	• عدم دعم الأسر الفقيرة والأيتام وكبار السن • محدودية المراكز التي تعنى بكبار السن • عدم التشبيك والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الأهلية والمجتمع المحلي للاهتمام بهذه الفئات بأفضل صورة. • عدم توفير مصادر دخل للأسر الفقيرة وكبار الس والأيتام.	متوسط	متوسط	متوسط	مرتفع	مرتفع		• التسرب من المدارس لبعض اطفال الاسر الفقيرة أو الايتام والتوجه للعمل في عمر صغير وبالتالي ينحرم الطفل من التعليم ومن عيش مرحلة الطفولة. • الاكتئاب الذي من الممكن أن يصيب كبار السن بسبب الوحدة والفراغ. • عدم توجه الشباب لاستكمال التعليم الجامعي والعمل للاهتمام بعائلاتهم في عمر صغير ومن الممكن ايضا ان تعمل المرأة لتعيل أسرتها وبذلك يزيد العبء عليها. • الزواج المكبر للإناث بسبب وضع العائلة الفقير.
	ضعف البنية التحتية	• ضعف البنية التحتية للتعليم بشكل عام.	متوسط	مرتفع	مرتفع	مرتفع	منخفض		• انعدام الثقة في المدارس الحكومة وفي المنظومة التعليمية بشكل عام.

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
	للتعليم وقلة المرافق المدرسية في مدارس البلدة.	• عدم توفر المصادر المالية لتطوير العديد من المدارس واعادة تأهيلها أو بناء مدارس جديدة. • الاعتماد على التمويل الخارجي او التبرعات لبناء أو تأهيل المدارس • الاضرابات الكثيرة للمعلمين • الاهتمام بالتعليم الأكاديمي على حساب المهني • بعض الجامعات أصبحت مادية أكثر من تعليمية وغلاء اسعارها بالنسبة لمستوى دخل الفرد • ضعف وركاكة المنهاج التعليمي الفلسطيني • زيادة البطالة في الوظائف الاكاديمية • الرواتب القليلة للمعلمين مما يقلل من الابداع لديهم • التعليم بالطريقة التقليدية والاهتمام							• التسرب من المدارس والتوجه للعمل خلال وقت المدرسة. • افتقار الطلبة للإتقان والابداع بسبب ضعف التعليم والاعتماد على التلقين. • التوجه للتعلم في خارج البلاد (منح)بسبب غلاء اسعار الجامعات وبسبب ضعفها • تسرب بعض الطالبات من المدرسة والتوجه نحو الزواج المبكر. • حرمان الأهل للبناتهم استكمال تعليمهم بسبب بعد المسافة للمدرسة أو الجامعة. • تدني مستويات الطلاب بالمقارنة مع الدول الاخرى. • ترك بعض الطلاب للمدرسة والتوجه للعمل في الداخل بسبب فقدان الأمل من ايجاد فرص عمل في مجالهم بالمستقبل.

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
		بالكم عوضا على النوع • قلة عدد المدارس بالمقارنة مع عدد الطلبة.							
	ضعف التجهيزات والامكانيات والبنية التحتية للمراكز الصحية ومحدودية خدماتها.	• وجود مركز صحي واحد فقط. • عدم توفر الدعم اللازم للقطاع الصحي وتطوير المركز الموجود. • عدم اهتمام الجهات المختصة بتطوير المركز الصحي في البلدة. • ارتفاع المصاريف التشغيلية. للمركز الصحي. • عدم وجود مركز طوارئ.	مرتفع	مرتفع	مرتفع	مرتفع	مرتفع		• زيادة معدلات الإصابة بالأمراض: قد تؤدي محدودية الخدمات الصحية إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، حيث يكون الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة محدودًا للأفراد. • عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية: يمكن أن تتسبب محدودية الخدمات الصحية في تفاقم التفاوتات الصحية بين الفئات المختلفة من المجتمع، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض بين الفقراء والمهمشين بشكل أكبر. • زيادة الضغط على النظام الصحي المركزي: قد يؤدي قلة الموارد والخدمات الصحية في البلدة إلى زيادة الضغط على النظام الصحي المركزي وفي المدن الكبرى، مما يجعل توفير الرعاية الصحية الجيدة أكثر صعوبة. • تأثير على الاقتصاد: قد تؤدي محدودية الخدمات الصحية إلى تدني الإنتاجية الاقتصادية بسبب زيادة الأمراض وزيادة العطل المرضية وانخفاض قدرة الأفراد على العمل.
	محدودية مشاركة النساء وضعف	• عدم وجود دعم كافي يختص بالنساء في جميع المجالات.	مرتفع	منخفض	منخفض	منخفض	منخفض		• تراجع الصحة النفسية والجسدية للمرأة. • تفاقم العنف والتمييز ضد المرأة. • تفاقم الفقر والتهميش كون المرأة جزء من الاسرة والمجتمع فهي

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على					التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
	المرافق والأنشطة المجتمعية وبناء القدرات التي تستهدف النساء.	• عدم وجود مراكز مختصة بتدريب وتطوير النساء. • الثقافة السائدة والعادات والتقاليد التي تلزم المرأة بكونها ربة منزل فقط أو تحديد عملها في وظائف محددة . • عدم مشاركة المرأة في صنع القرار أو اقتصار مشاركتها بصورة فردية فقط.							• مساهم في اقتصاده. • حرمان المجتمع من الاستفادة من قدرات المرأة ومواهبها. • تكون شعور داخلي عند المرأة بالدونية وعدم الاهمية. • الزواج المبكر عند العديد من النساء بسبب الفراغ.
	ضعف النشاطات الاجتماعية والمؤسسات الداعمة للحفاظ على الثقافة والتراث.	• عدم اهتمام المؤسسات والجهات الحكومية والاهلية بمجال الثقافة والتراث. • قلة وجود المؤسسات التي تعنى في هذا المجال. • عدم اهتمام المجتمع بشكل عام في هذا المجال والتقليد الاعمى للأجانب. • عدم الاهتمام بالمناطق الاثرية والتاريخية واهمالها وعدم ترميمها. • المحدودية المالية المخصصة لهذا	متوسط	متوسط	مرتفع	متوسط	متوسط		• حالة من عدم الثقافة منتشرة في الجيل الحالي بسبب عدم القراءة وعدم حب المعرفة والاكتشاف. • عدم تمسك المواطن بتراثه وتاريخه وعدم نقله للجيل الاصغر مما يسبب حالة من الضياع وانعدام الهوية. • نسب الاحتلال بعض التاريخ والتراث الفلسطيني له والترويج له خارجيا على هذا الاساس مما يسبب ضياع الهوية الفلسطينية وحالة انكار وتشويش من المجتمع الغربي للقضية الفلسطينية. • ضعف الانتماء للجيل الحالي للوطن بسبب عدم ربطه بالتاريخ والتراث والثقافة. • زيادة نسبة البطالة خاصة في فئة الشباب بسبب عدم استغلال هذا المجال بالتالي عدم عمل ذو الاختصاص بالتراث والتاريخ وغيرها في مجالهم.

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على					التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
		المجال.							
	ضعف المستوى الرياضي والأنشطة الشبابية في البلدة.	• عدم توفر الدعم لقطاع الشباب والرياضة. • عدم جود ميزانية كافية مخصصة لقطاع الشباب والرياضة. • عدم بناء قدرات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم بصورة احترافيه في المجالات الرياضية. • عدم وجود أماكن مختصة ومؤهلة وكافية للتدريبات الرياضية في شتى المجالات	متوسط	متوسط	مرتفع	متوسط	منخفض		• تجنب الشباب للتوجه للمجالات الرياضية بسبب عدم توفر مصدر دخل من خلاله. • محدودية الفرق التي تمثل الدولة الفلسطينية خارجيا. • حالة احباط وكبت وفقدان أمل لدى فئة الشباب بسبب عدم توفر اماكن لتفريغ طاقاتهم ومواهبهم. • عدم استغلال مواهب الاطفال الرياضية وانماءها والعمل على تطويرها. • حالة من الكبت والاحباط لدى النساء بسبب محدودية مشاركتهن في المجال الرياضي.
	ضعف الاهتمام بقطاع الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي.	• محدودية مساحة التوسع في البلدة. • عدم التزام المواطنين بقوانين البناء ووجود اعتداءات من قبل بعض الأبنية. • عدم وجود قوانين رادعة ونظام رقابة • عدم الوعي الكافي لدى المواطنين بأهمية تنظيم البناء.	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط		• تناقص المساحات الزراعية. • الاكتظاظ السكاني: يمكن أن يتسبب ضيق المناطق المخصصة للتوسع العمراني في اكتظاظ سكاني وتزايد الضغوط على البنية التحتية المحلية والخدمات العامة. • عدم القدرة على تصنيف المناطق (سكني، تجاري، صناعي، زراعي، الخ) • تأثير على البيئة: يمكن أن يؤدي الزحف العمراني على الأراضي

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على					التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
مجال الإدارة والحكم الرشيد		• عدم وجود الدعم الكافي لقطاع السكن. • عدم توجه المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع في البلدة. • غلاء مواد البناء واسعار الاراضي.							• الزراعية إلى تلوث التربة والمياه والهواء، مما ينعكس سلباً على صحة ورفاهية المواطنين، بما في ذلك النساء والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن. • زيادة معدلات البطالة وذلك لعدم الاستثمار والعمل في قطاع السكن. • تأثر جودة الحياة: يمكن أن يؤدي تزايد الضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة إلى تدهور جودة الحياة بالنسبة للسكان، وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن
	محدودية المخطط الهيكلي وعشوائية تنظيم البناء في البلدة.	• عدم التزام المواطنين بقوانين البناء ووجود اعتداءات من قبل بعض الأبنية. • عدم وجو ميزانية لتوسعة المخطط الهيكلي واعادة تنظيمه. • موقع البلدة داخل الخط الاخضر يحد من امكانية التوسع فيها.	مرتفع	مرتفع	مرتفع	مرتفع	مرتفع		• التأثير على مساحة الطرق واتساعها بسبب التجاوزات في الأبنية. • عدم وجود اماكن مخصصة للسوق او مناطق صناعية وتجارية مما يؤثر سلبا على جميع السكان من ناحية ضوضاء التلوث السمعي والبصري. • التعدي على الأراضي الزراعية والبناء فيها. • عشوائية البناء في البلدة. • الاكتظاظ السكاني في بعض المناطق على حساب مناطق اخرى مما يسبب العديد من الضغوطات الاجتماعية والنزاعات.
	محدودية	• عدم وجود المصادر المالية لتوفير	مرتفع	مرتفع	مرتفع	مرتفع	مرتفع		• ضعف الاستجابة في حالات الطوارئ: قد يؤدي ضعف المعدات

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
	المعدات والتجهيزات والكوادر للكوارث والطوارئ.	المعدات اللازمة لمواجهة الكوارث. • عدم توفر خطط للاستجابة الطارئة للأزمات والكوارث • عدم اعطاء التدريبات الكافية للمواطنين للتعامل مع الكوارث. • عدم ملائمة العديد من المباني لمواجهة الكوارث. • عدم وجود الكادر المدرب بشكل جيد لمواجهة الكوارث.							والتجهيزات إلى تأخير أو قصور في استجابة البلدية للأزمات والكوارث، مما يزيد من تعرض الفئات الأكثر هشاشة للأضرار. • تأثير على الصحة والسلامة: قد يعرض ضعف المعدات والتجهيزات صحة وسلامة النساء والشباب وذوي الإعاقة للخطر، بسبب عدم توفر الإمكانات الكافية لحمايتهم ودعمهم في حالات الأزمات والكوارث. • زيادة الفجوة الاجتماعية: قد يتسبب ضعف المعدات والتجهيزات في تفاقم الفجوة بين الفئات المهمشة والأكثر قوة وثراء في المجتمع، حيث يمكن أن يكون لديهم موارد أفضل للتعامل مع الأزمات والكوارث. • الانعكاسات الاقتصادية: قد يتأثر النشاط الاقتصادي وفرص العمل للنساء والشباب وذوي الإعاقة بسبب ضعف المعدات والتجهيزات، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة. • تأثير على النزوح والهجرة: قد يؤدي ضعف المعدات والتجهيزات في مواجهة الأزمات والكوارث إلى تزايد حالات النزوح والهجرة بين المواطنين، بحثًا عن أماكن أكثر أمانًا واستقرارًا.
	ضعف القدرة على توفير كامل الخدمات	• ضعف الموارد المالية للبلدية. • عدم وجود التمويل الكافي لتطوير البنية التحتية للبلدية	متوسط	متوسط	متوسط	منخفض	متوسط		• يؤثر على المستوى الادائي والانتاجي للبلدية: قد يؤدي الى تأخير تقديم الخدمات للمواطنين او تقديمها دون المستوى مما يسبب عدم ثقة بين المواطن والبلدية.

المجال	القضية التنموية	جذور (أسباب/مسببات القضية)	تؤثر على						التأثير السلبي
			المرأة	ذوي الإعاقة	الشباب	الأطفال	كبار السن	أخرى (حدد)	
	للمواطنين بسبب قلة الامكانيات وعدم توفر مقر مناسب للبلدية وضعف المساءلة المجتمعية ومشاركة المواطن في صنع القرار في العمل البلدي.	• عدم وجود العدد الكافي من الموظفين في البلدية. • عدم تقديم التدريبات الكافية للكادر الموجود في البلدية. • محدودية الثقة بين المواطنين والمسؤولين. • الثقافة السائدة وعدم وجود وعي مجتمعي كافي. • عدم عمل اجتماعات بشكل دوري مع المجتمع المحلي. • عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تساعد في دمج المجتمع المحلي مع البلدية.							• يؤثر على مستوى الامان ودقة البيانات: وذلك بسبب الاعتماد على الطريقة التقليدية في جمع المعلومات وحفظها. • صعوبة وصول ذوي الاعاقة وكبار السن لمبنى البلدية وذلك بسبب عدم ملائمته ومناسبته لهم. • ضعف العدالة الاجتماعية والمساواة: قد يؤدي ضعف المساءلة المجتمعية إلى استمرار التمييز والفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع. • ضعف الشفافية والنزاهة: قد ينتج عن ضعف المساءلة المجتمعية تراجع مستويات الشفافية والنزاهة في العمل البلدي، مما يؤدي إلى انتشار الفساد وضعف الثقة بين والمجلس البلدي. • عدم تلبية لاحتياجات الفئات المهمشة: قد يؤدي ضعف مشاركة المواطن في صنع القرار إلى عدم التركيز على حاجات الفئات الضعيفة والمهمشة وتجاهل مصالحهم. • ضعف الاستجابة للمشاكل المجتمعية: يمكن أن يؤدي عدم مشاركة المواطنين في صنع القرار إلى قلة الاستجابة للمشاكل والتحديات التي يواجها المجتمع. • التأثير السلبي على المشاركة السياسية: قد يعزز ضعف المساءلة المجتمعية ومشاركة المواطن في صنع القرار شعور الفرد بالعزلة والاستبعاد من الحياة السياسية والاجتماعية.

اللجان التي شاركت بإعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها

لجنة التخطيط التنموي المحلي

اسم العضو /ة	دوره/ا في اللجنة (مقرر أو عضو)	مجال التخصص
محمد عمارنة	مقرر	مهندس
أحمد شريف قبها	عضو	بنية تحتية
جواد عبد القادر قبها	عضو	معلم
أحمد صبحي قبها	عضو	الإدارة
سامي توفيق قبها	عضو	تاجر
نور علي قبها	عضو	تاجر
عائدة رجا قبها	عضو	معلمة

فريق التخطيط الأساسي

الرقم	اسم العضو/ة	دوره/ا في الفريق (منسق/ عضو)	المؤسسة التي يـ /تعمل بها	مجال الاهتمام	المسمى الوظيفي في المؤسسة	الجنس		العمر	
						ذكر	أنثى	29-16	فوق 29
.1	محمد عمارنة	منسق	بلدية برطعه الشرقية	مهندس	رئيس قسم الهندسة	✓			✓
.2	جواد قبها	عضو	بلدية برطعه الشرقية	البنية التحتية	عضو بلدية	✓			✓
.3	وائل جميل مصطفى قبها	عضو	عيادة	علاج طبيعي	طبيب	✓			✓
.4	جهاد عثمان محمد قبها	عضو	محل تجاري	التجارة	تاجر	✓			✓
.5	عبد الرحمن منيب عباس قبها	عضو	جمعية برطعه التعاونية	هندسة الكهرباء	مهندس كهرباء	✓			✓
.6	رائدة زيد قبها	عضو	التربية والتعليم	التعليم	مديرة مدرسة		✓		✓

7.	أحمد صبحي قبها	عضو	بلدية برطعه الشرقية	الصحة	عضو بلدية	✓		✓
8.	رشاد رائد صبحي قبها	عضو	قطاع خاص	البناء	عامل	✓	✓	
9.	عبد الفتاح يوسف قبها	عضو	معهد تقني	مهندس	مدرس جامعي	✓		✓
10.	عبد السلام محمد حسن قبها	عضو	محل تجاري	التجارة	تاجر	✓		✓

اللجان التنموية

اسم اللجنة: لجنة البيئة والبنى التحتية **(منسق اللجنة من داخل البلدية) المنسق : محمد عمارنة**

الرقم	الاسم	المؤسسة	المسمى الوظيفي/الاعتبارية	رقم الاتصال	البريد الإلكتروني
1)	عبد الرحمن منيب قبها	جمعية برطعه التعاونية	مهندس كهرباء	0552908414	
2)	مها عناد قبها	-	-	0558867895	
3)	عميد أمجد هرشة	بلدية برطعه	مهندس مدني	0568637922	
4)	محمد عمارنة	بلدية برطعه	مهندس مدني	0569227448	
5)	نائل إبراهيم قبها	جمعية برطعه التعاونية	مدير الجمعية	0523703284	
6)	عبد الفتاح قبها	مدرس جامعي	مهندس	0505497080	
7)	نجد محمود قبها	-	-	0552417304	
8)	الاء قبها	مدرسة بنات برطعه الأساسية	معلمة	0568444251	
9)	أحمد شريف قبها	بلدية برطعه	مدير البلدية	0569048767	
10)	جواد قبها	بلدية برطعه	عضو البلدية	0523102107	
11)	رانيا طلال قبها	حكم محلي	علاقات عامة	0503177295	
12)	معروف أسعد	-	-	0525455558	
13)	سفيان قبها	بلدية برطعه	مسؤول الصحة	0569347700	

الرقم	الاسم	المؤسسة	المسمى الوظيفي/الاعتبارية	رقم الاتصال	البريد الإلكتروني
14)	أحمد صبحي قبها	بلدية برطعه	عضو بلدية	0594309191	
15)	فتحية خطيب	-	ربة منزل	0507402380	

اسم اللجنة: لجنة التنمية الاجتماعية **المنسق:** أمل عبداللطيف قبها

الرقم	الاسم	المؤسسة	المسمى الوظيفي/الاعتبارية	رقم الاتصال	البريد الإلكتروني
.1	وائل جميل قبها	-	علاج طبيعي	0506089980	
.2	رشاد رائد قبها	-	-	054872049	
.3	هناء يوسف قبها	التربية والتعليم	معلمة	0526218676	
.4	أمل عبداللطيف قبها	التربية والتعليم	معلم	0568360550	
.5	رائدة زيد	التربية والتعليم	مديرة	0505492446	
.6	غادة إبراهيم قبها	التربية والتعليم	مديرة	0584465105	
.7	أريج عبدالله قبها	مختبر	تحاليل طبية	0539306604	
.8	محمد جهاد قبها	الصحة	دكتور	0569453435	
.9	محمود قبها	جمعية برطعه التعاونية	فني	0569295037	
.10	فتحية عزت قبها	-	ربة منزل	0522629801	
.11	شادي أحمد قبها	التربية والتعليم	سكرتير	0569426665	
.12	زياد محمد داوود	ملتقى أبناء برطعه الثقافي	مدير الملتقى	0532342256	
.13	سماح حسام قبها	وزارة الداخلية	موظفة	0509847361	
.14	عمر جمال قبها	التربية والتعليم	معلم	0525317906	
.15	جواد قبها	بلدية برطعه	عضو بلدية	0523102107	

الرقم	الاسم	المؤسسة	المسمى الوظيفي/الاعتبارية	رقم الاتصال	البريد الإلكتروني
.16	هيثم إبراهيم قبها	نادي برطعه الرياضي	رئيس النادي	0502740091	
.17	إيناس محمود أحمد قبها	مدرسة البنات	معلمة	0507402380	
.18	شمس يحيى قبها	جامعة	طالبة	0522744244	
.19	أحمد صبحي قبها	بلدية برطعه	عضو بلدية	0594309191	

اسم اللجنة: لجنة تنمية الاقتصادي المحلي **المنسق: جهاد عثمان قبها**

الرقم	الاسم	المؤسسة	المسمى الوظيفي/الاعتبارية	رقم الاتصال	البريد الإلكتروني
.1	سامي قبها	بلدية برطعه	عضو بلدية	0568525057	
.2	أحمد شريف قبها	بلدية برطعه	مدير بلدية	0569048767	
.3	روضة قبها	-	-	0529508706	
.4	عايدة رجا قبها	بلدية برطعه	عضو بلدية	0545352262	
.5	وصفي مصطفى قبها	مكتبة	تاجر	0529085275	
.6	عبدالسلام محمد قبها	-	تاجر	0569949250	
.7	خلود عبد القادر	-	-	0529085275	
.8	عبد الرحمن منيب قبها	جمعية برطعه التعاونية	مهندس	0552908414	
.9	محمود قبها	جمعية برطعه التعاونية	فني	0569295037	
.10	زينب خطيب	بلدية برطعه	علاقات عامة	0569227470	

اسم اللجنة: لجنة الإدارة والحكم الرشيد **المنسق:**

الرقم	الاسم	المؤسسة	المسمى الوظيفي/الاعتبارية	رقم الاتصال	البريد الإلكتروني
.1	أحمد شريف قبها	بلدية برطعه	مدير البلدية	0569048767	
.2	أحمد صبحي قبها	بلدية برطعه	عضو البلدية	0594309191	
.3	أحكام صالح قبها	-	ربة منزل	0523454877	
.4	جهاد عثمان قبها	-	تاجر	0532463390	
.5	عبد الرحمن منيب قبها	جمعية برطعه التعاونية	مهندس	0552908414	
.6	أسماء فتحي محمد	-	ربة منزل	0506089982	
.7	رائدة زيد	التربية والتعليم	مديرة	0505492446	
.8	غادة إبراهيم قبها	التربية والتعليم	مديرة	0584465105	
.9	عمر جمال قبها	التربية والتعليم	معلم	0525317906	
